



AFYONKARAHİSAR

www.ilbank.gov.tr



İLBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

ESKİŐEHİR

BÖLGE MÜDÜRLÜĐÜ





ILBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ, AFYONKARAHİSAR İLİ DAHİLİNDE

9 Adet İçmesuyu

4 Adet İçmesuyu ve Kanalizasyon

11 Adet Kanalizasyon

6 Adet Üstyapı

15 Adet Proje

14 Adet Altyapı

3 Adet Güneş Enerji Santrali

8 Adet Harita ve İmar Planı

Olmak üzere toplam 70 adet proje ile
Belediyelerimize hizmette bulunmaktadır.

www.ilbank.gov.tr

2017 Yılı Projelerimizin;

Toplam Tutarı	: 146.072.743,84 TL
2017 Yılı Ödenek Tutarı	: 168.572.423,10 TL
Gelen Harcama Yetkisi	: 168.572.423,10 TL
Dönem Sonu Harcama	: 27.215.153,96 TL
Nakit Gerçekleşme Oranı	: % 16
Fiziki Gerçekleşme Oranı	: % 70



ILBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

İÇMESUYU SEKTÖRÜNDE;

Bankamızca SUKAP kapsamında ihale edilen
Kocaöz İçmesuyu İnşaatı:

İhale Bedeli	: 1.686.932,13-TL
Sözleşme Tarihi	: 05.01.2015
Yer Teslim Tarihi	: 20.01.2015
İş Bitim Tarihi	: 26.04.2016
2017 Yılı Yapılan Harcama	: - TL
Nakdi Gerçekleşme	: -
Fiziki Gerçekleşme	: % 100
*03.07.2017 Tarihinde Kesin Kabulü Yapıldı.	

www.ilbank.gov.tr



ILBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

KOCAÖZ İÇMESUYU İNŞAATI



www.ilbank.gov.tr



ILBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

İÇMESUYU SEKTÖRÜNDE;

Bankamızca SUKAP kapsamında ihale edilen
Davulga İçmesuyu İnşaatı:

İhale Bedeli	: 3.113.757,00-TL
Sözleşme Tarihi	: 25.12.2014
Yer Teslim Tarihi	: 19.01.2015
İş Bitim Tarihi	: 22.02.2016
2017 Yılı Yapılan Harcama	: - TL
Nakdi Gerçekleşme	: -
Fiziki Gerçekleşme	: % 100
*31.03.2017 Tarihinde Kesin Kabulü Yapıldı.	



ILBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

DAVULGA İÇMESUYU İNŞAATI





ILBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

DAVULGA İÇMESUYU İNŞAATI



www.ilbank.gov.tr



ILBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

İÇMESUYU SEKTÖRÜNDE;

**Bankamızca SUKAP kapsamında ihale edilen
Hocalar İçmesuyu İnşaatı:**

İhale Bedeli	: 2.518.000,00-TL
Sözleşme Tarihi	: 24.05.2017
Yer Teslim Tarihi	: 03.05.2017
İş Bitim Tarihi	: 06.06.2018
2017 Yılı Yapılan Harcama	: - TL
Nakdi Gerçekleşme	: -
Fiziki Gerçekleşme	: -



ILBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

İÇMESUYU SEKTÖRÜNDE;

**Bankamızca SUKAP kapsamında ihale edilen
Tınaztepe İçmesuyu İnşaatı:**

İhale Bedeli	: 2.599.000,00-TL
Sözleşme Tarihi	: 12.04.2017
Yer Teslim Tarihi	: 20.04.2017
İş Bitim Tarihi	: 20.12.2017
2017 Yılı Yapılan Harcama	: - TL
Nakdi Gerçekleşme	: -
Fiziki Gerçekleşme	: -



ILBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

TINAZTEPE İÇMESUYU İNŞAATI



www.ilbank.gov.tr



ILBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

TINAZTEPE İÇMESUYU İNŞAATI



www.ilbank.gov.tr



ILBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

İÇMESUYU SEKTÖRÜNDE;

**Bankamızca SUKAP kapsamında ihale edilen
Gebeceler İçmesuyu İnşaatı:**

İhale Bedeli	: 1.648.000,00-TL
Sözleşme Tarihi	: 03.04.2017
Yer Teslim Tarihi	: 12.04.2017
İş Bitim Tarihi	: 09.12.2017
2017 Yılı Yapılan Harcama	: 418.744,85- TL
Nakdi Gerçekleşme	: %21
Fiziki Gerçekleşme	: %21



ILBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

İÇMESUYU SEKTÖRÜNDE;

Bankamızca SUKAP kapsamında ihale edilen
Özburun İçmesuyu İnşaatı:

İhale Bedeli	: 2.228.879,40-TL
Sözleşme Tarihi	: 10.11.2015
Yer Teslim Tarihi	: 25.11.2015
İş Bitim Tarihi	: 06.05.2017
2017 Yılı Yapılan Harcama	: 1.232.172,69- TL
Nakdi Gerçekleşme	: 100%
Fiziki Gerçekleşme	: 100%

*%20 iş artışı kapsamında işlerin yapımı devam ediyor.

www.ilbank.gov.tr



ILBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

ÖZBURUN İÇMESUYU İNŞAATI



www.ilbank.gov.tr



ILBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

İÇMESUYU ve KANALİZASYON SEKTÖRÜNDE;

**Bankamızca SUKAP kapsamında ihale edilen
Döğer İçmesuyu ve Kanalizasyon İnşaatı:**

İhale Bedeli	: 9.153.000,00-TL
Sözleşme Tarihi	: 24.05.2017
Yer Teslim Tarihi	: 07.06.2017
İş Bitim Tarihi	: 07.05.2019
2017 Yılı Yapılan Harcama	: - TL
Nakdi Gerçekleşme	: -
Fiziki Gerçekleşme	: -



ILBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

KANALİZASYON SEKTÖRÜNDE;

**Bankamızca SUKAP kapsamında ihale edilen
Çobanlar-Kocaöz-Işıklar-Sülümenli Grup Atıksu
Arıtma Tesisi İkmal İnşaatı:**

İhale Bedeli	: 4.944.000,00-TL
Sözleşme Tarihi	: 07.12.2016
Yer Teslim Tarihi	: 21.12.2016
İş Bitim Tarihi	: 28.08.2017
2017 Yılı Yapılan Harcama	: 2.619.915,04- TL
Nakdi Gerçekleşme	: % 41
Fiziki Gerçekleşme	: % 41



ILBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

KANALİZASYON SEKTÖRÜNDE;

Bankamızca SUKAP kapsamında ihale edilen
Dazkırı Kanalizasyon İnşaatı:

İhale Bedeli	: 6.758.490,00-TL
Sözleşme Tarihi	: 04.11.2015
Yer Teslim Tarihi	: 18.11.2015
İş Bitim Tarihi	: 08.05.2017
2017 Yılı Yapılan Harcama	: 2.406.303,84- TL
Nakdi Gerçekleşme	: % 93
Fiziki Gerçekleşme	: % 93
*06.07.2017 tarihinde geçici kabulü yapıldı.	

www.ilbank.gov.tr



ILBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

DAZKIRI KANALİZASYON İNŞAATI



www.ilbank.gov.tr



ILBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

DAZKIRI KANALİZASYON İNŞAATI



www.ilbank.gov.tr



ILBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

KANALİZASYON SEKTÖRÜNDE;

**Bankamızca SUKAP kapsamında ihale edilen
Gebeceler Kanalizasyon İnşaatı:**

İhale Bedeli	: 4.296.384,00-TL
Sözleşme Tarihi	: 18.08.2015
Yer Teslim Tarihi	: 01.09.2015
İş Bitim Tarihi	: 25.08.2016
2017 Yılı Yapılan Harcama	:- TL
Nakdi Gerçekleşme	: % 88
Fiziki Gerçekleşme	: % 100

***27.10.2016 Tarihinde Geçici Kabulü Yapıldı.**

www.ilbank.gov.tr



ILBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

GEBECELER KANALİZASYON İNŞAATI



www.ilbank.gov.tr



ILBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

GEBECELER KANALİZASYON İNŞAATI



www.ilbank.gov.tr



ILBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

KANALİZASYON SEKTÖRÜNDE;

**Bankamızca SUKAP kapsamında ihale edilen
Akören Kanalizasyon İnşaatı:**

İhale Bedeli	: 3.052.935,00-TL
Sözleşme Tarihi	: 01.12.2015
Yer Teslim Tarihi	: 14.12.2015
İş Bitim Tarihi	: 11.07.2016
2017 Yılı Yapılan Harcama	: - TL
Nakdi Gerçekleşme	: %90
Fiziki Gerçekleşme	: %95


***25.11.2016 Tarihinde Geçici Kabulü Yapıldı.**

www.ilbank.gov.tr



ILBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

AKÖREN KANALİZASYON İNŞAATI

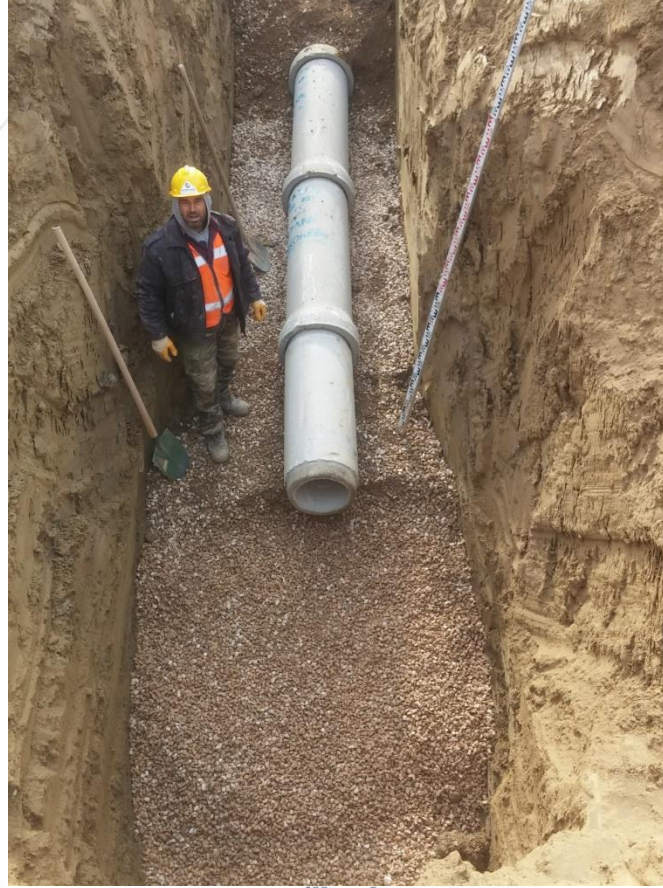

www.ilbank.gov.tr



ILBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

AKÖREN KANALİZASYON İNŞAATI



www.ilbank.gov.tr



ILBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

KANALİZASYON SEKTÖRÜNDE;

**Bankamızca SUKAP kapsamında ihale edilen
Haydarlı Kanalizasyon İnşaatı:**

İhale Bedeli	: 4.452.612,58-TL
Sözleşme Tarihi	: 03.12.2015
Yer Teslim Tarihi	: 16.12.2015
İş Bitim Tarihi	: 13.05.2017
2017 Yılı Yapılan Harcama	: 549.464,37- TL
Nakdi Gerçekleşme	: %90
Fiziki Gerçekleşme	: %98
*12.05.2017 Tarihinde Geçici Kabulü Yapıldı.	

www.ilbank.gov.tr



ILBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

HAYDARLI KANALİZASYON İNŞAATI



www.ilbank.gov.tr



ILBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

HAYDARLI KANALİZASYON İNŞAATI



www.ilbank.gov.tr



ILBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

KANALİZASYON SEKTÖRÜNDE;

**Bankamızca SUKAP kapsamında ihale edilen
Serban Kanalizasyon İnşaatı:**

İhale Bedeli	: 2.321.940,00-TL
Sözleşme Tarihi	: 02.08.2016
Yer Teslim Tarihi	: 02.08.2016
İş Bitim Tarihi	: 29.04.2017
2017 Yılı Yapılan Harcama	: 813.104,67- TL
Nakdi Gerçekleşme	: %76
Fiziki Gerçekleşme	: %89


***05.07.2017 Tarihinde Geçici Kabulü Yapıldı.**

www.ilbank.gov.tr



ILBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

SERBAN KANALİZASYON İNŞAATI

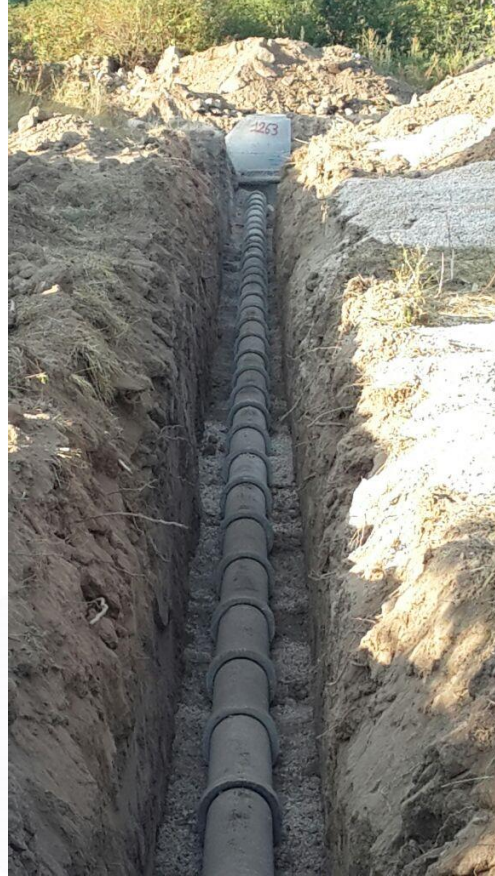

www.ilbank.gov.tr



ILBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

KANALİZASYON SEKTÖRÜNDE;

**Bankamızca SUKAP kapsamında ihale edilen
Fethibey Kanalizasyon İnşaatı:**

İhale Bedeli	: 4.157.789,46-TL
Sözleşme Tarihi	: 26.10.2016
Yer Teslim Tarihi	: 09.11.2016
İş Bitim Tarihi	: 03.11.2017
2017 Yılı Yapılan Harcama	: 3.079.290,53 TL
Nakdi Gerçekleşme	: %45
Fiziki Gerçekleşme	: %55



ILBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

FETHİBEY KANALİZASYON İNŞAATI



www.ilbank.gov.tr



ILBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

KANALİZASYON SEKTÖRÜNDE;

Bankamızca SUKAP kapsamında ihale edilen
Bayat Kanalizasyon İnşaatı:

İhale Bedeli	: 7.323.292,35-TL
Sözleşme Tarihi	: 09.11.2016
Yer Teslim Tarihi	: 23.11.2016
İş Bitim Tarihi	: 23.10.2018
2017 Yılı Yapılan Harcama	: 2.718.971,41-TL
Nakdi Gerçekleşme	: %23
Fiziki Gerçekleşme	: %27



ILBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

BAYAT KANALİZASYON İNŞAATI





ILBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

BAYAT KANALİZASYON İNŞAATI



www.ilbank.gov.tr



ILBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

ALTYAPI SEKTÖRÜNDE;

Çayırbağ Kilitliparke Taşı ile Yol Düzenleme İnşaatı:(Banka Kredisi)

İhale Bedeli	: 1.539.500,00-TL
Sözleşme Tarihi	: 03.02.2016
Yer Teslim Tarihi	: 03.02.2016
İş Bitim Tarihi	: 01.08.2016
2017 Yılı Yapılan Harcama	: 343.327,47- TL
Nakdi Gerçekleşme	: % 34
Fiziki Gerçekleşme	: % 70



ILBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

ÇAYIRBAĞ KİLİTLİPARKE TAŞI İLE YOL DÜZENLEME İNŞAATI:



www.ilbank.gov.tr



ILBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

ALTYAPI SEKTÖRÜNDE;

Sultandağı Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Beton Parke Taşı ve Bordür Yapım İşi:(Banka Kredisi)

İhale Bedeli	: 4.177.760,00-TL
Sözleşme Tarihi	: 08.05.2017
Yer Teslim Tarihi	: 12.05.2017
İş Bitim Tarihi	: 23.09.2017
2017 Yılı Yapılan Harcama	: 1.446.041,15- TL
Nakdi Gerçekleşme	: % 28
Fiziki Gerçekleşme	: % 32



ILBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

SULTANDAĞI MUHTELİF CADDE VE SOKAKLARDA BETON PARKE TAŞI VE BORDÜR YAPIM İŞİ





ILBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

ALTYAPI SEKTÖRÜNDE;

Gözü Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Yol Düzenleme Yapım İşı:(Banka Kredisi)

İhale Bedeli	: 731.000,00-TL
Sözleşme Tarihi	: 31.03.2017
Yer Teslim Tarihi	: 05.04.2017
İş Bitim Tarihi	: 01.09.2017
2017 Yılı Yapılan Harcama	: 760.847,77- TL
Nakdi Gerçekleşme	: % 99
Fiziki Gerçekleşme	: % 99



ILBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

GÖMÜ MUHTELİF CADDE VE SOKAKLARDA YOL DÜZENLEME YAPIM İŞİ



www.ilbank.gov.tr



ILBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

ALTYAPI SEKTÖRÜNDE;

Başmakçı Yol ve/veya Kaldırım İnşaatı

İhale Bedeli	: 1.565.000,00-TL
Sözleşme Tarihi	: 28.03.2017
Yer Teslim Tarihi	: 28.03.2017
İş Bitim Tarihi	: 25.08.2017
2017 Yılı Yapılan Harcama	: 532.665,72- TL
Nakdi Gerçekleşme	: % 29
Fiziki Gerçekleşme	: % 31



ILBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

ALTYAPI SEKTÖRÜNDE;


Özburun Yol ve/veya Kaldırım İnşaatı

İhale Bedeli	: 1.257.500,00-TL
Sözleşme Tarihi	: 18.04.2017
Yer Teslim Tarihi	: 24.04.2017
İş Bitim Tarihi	: 22.08.2017
2017 Yılı Yapılan Harcama	: 1.140.832,56- TL
Nakdi Gerçekleşme	: % 73
Fiziki Gerçekleşme	: % 81



ILBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

ÖZBURUN YOL VE/VEYA KALDIRIM İNŞAATI

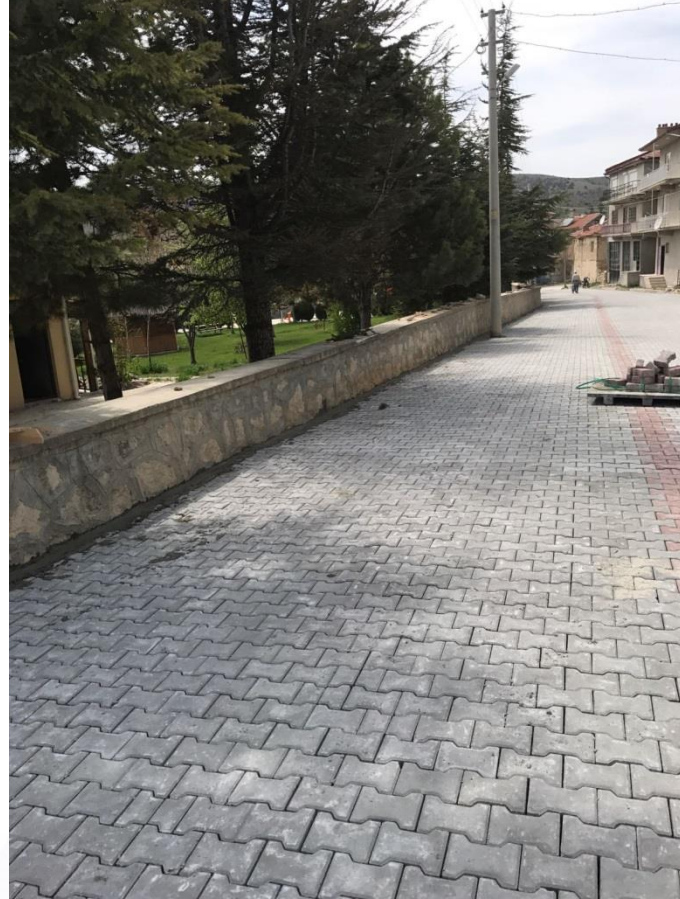

www.ilbank.gov.tr



ILBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

ALTYAPI SEKTÖRÜNDE;

İşıklar Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Beton Parke Taşı ve Bordür Yapım İşi:

İhale Bedeli	: 2.652.000,00-TL
Sözleşme Tarihi	: 10.04.2017
Yer Teslim Tarihi	: 14.04.2017
İş Bitim Tarihi	: 23.06.2017
2017 Yılı Yapılan Harcama	: 2.306.138,04- TL
Nakdi Gerçekleşme	: % 70
Fiziki Gerçekleşme	: % 79



ILBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

İŞIKLAR MUHTELİF CADDE VE SOKAKLARDA BETON PARKE TAŞI VE BORDÜR YAPIM İŞİ



www.ilbank.gov.tr



ILBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

ALTYAPI SEKTÖRÜNDE;

İscehisar Jeotermal Akışkan Temini Amaçlı
Sondaj Kuyusu Açılması ve Kuyu Bitirme Testleri
Yapılması İş:(Banka Kredisi)

İhale Bedeli	: 751.500-TL
Sözleşme Tarihi	: 26.09.2016
Yer Teslim Tarihi	: 27.09.2016
İş Bitim Tarihi	: 25.01.2017
2017 Yılı Yapılan Harcama	: 359.517,17- TL
Nakdi Gerçekleşme	: % 90
Fiziki Gerçekleşme	: % 100

*Geçici Kabulü yapıldı.

www.ilbank.gov.tr



ILBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

ÜSTYAPI SEKTÖRÜNDE;

Sandıklı Kent Meydanı ve Çok Katlı Otopark Yapım İşi:

İhale Bedeli	: 9.549.500,00-TL
Sözleşme Tarihi	: 05.02.2016
Yer Teslim Tarihi	: 11.02.2016
İş Bitim Tarihi	: 21.07.2017
2017 Yılı Yapılan Harcama	: 2.212.665,69- TL
Nakdi Gerçekleşme	: % 96
Fiziki Gerçekleşme	: % 100

*Belediyesince tasfiye edildi. İkmal inşaatına ait sözleşme 20.03.2017 tarihinde imzalandı. Yapımı devam ediyor.

www.ilbank.gov.tr



ILBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

SANDIKLI KENT MEYDANI VE ÇOK KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ:



www.ilbank.gov.tr



ILBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

SANDIKLI KENT MEYDANI VE ÇOK KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ:



www.ilbank.gov.tr



ILBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

ÜSTYAPI SEKTÖRÜNDE;

Akören (Afyonkarahisar) Çok Amaçlı Bina İnşaatı:

İhale Bedeli	: 798.000,00-TL
Sözleşme Tarihi	: 25.05.2016
Yer Teslim Tarihi	: 27.05.2016
İş Bitim Tarihi	: 23.11.2016
2017 Yılı Yapılan Harcama	:17.281,91- TL
Nakdi Gerçekleşme	: %93
Fiziki Gerçekleşme	: % 100

*İlk 4 hakediş belediyesince ödenmiştir. Geçici kabulü yapılacak.



ILBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

AKÖREN ÇOK AMAÇLI BİNA İNŞAATI



www.ilbank.gov.tr



ILBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

ÜSTYAPI SEKTÖRÜNDE;

Taşoluk (Afyonkarahisar) Kültür Merkezi İnşaatı:

İhale Bedeli	: 1.140.000,00-TL
Sözleşme Tarihi	: 09.02.2017
Yer Teslim Tarihi	: 06.03.2017
İş Bitim Tarihi	: 19.07.2017
2017 Yılı Yapılan Harcama	: 502.870,88- TL
Nakdi Gerçekleşme	: %38
Fiziki Gerçekleşme	: % 40



ILBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

TAŞOLUK (AFYONKARAHİSAR) KÜLTÜR MERKEZİ İNŞAATI



www.ilbank.gov.tr



ILBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

TAŞOLUK (AFYONKARAHİSAR) KÜLTÜR MERKEZİ İNŞAATI



www.ilbank.gov.tr



ILBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

ÜSTYAPI SEKTÖRÜNDE;

Bolvadin (Afyonkarahisar) Belediye Öğrenci
Yurdu Yapım İşi:

İhale Bedeli	: 13.140.000,00-TL
Sözleşme Tarihi	: 16.03.2017
Yer Teslim Tarihi	: 20.03.2017
İş Bitim Tarihi	: 26.09.2017
2017 Yılı Yapılan Harcama	: 3.394.767,80- TL
Nakdi Gerçekleşme	: %21
Fiziki Gerçekleşme	: % 23



ILBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

BOLVADİN (AFYONKARAHİSAR) BELEDİYE ÖĞRENCİ YURDU YAPIM İŞİ



www.ilbank.gov.tr



ILBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

BOLVADİN (AFYONKARAHİSAR) BELEDİYE ÖĞRENCİ YURDU YAPIM İŞİ



www.ilbank.gov.tr



ILBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

PROJE İŞLERİMİZ

Bankamızca ihale edilen(Kredi-Hibe);

- Sülün İçmesuyu Kesin Projesi 03.01.2017 tarihinde onaylandı.
- Susuz İçmesuyu Kesin Projesi 04.01.2017 tarihinde onaylandı.
- Sinanpaşa İçmesuyu Kesin Projesi 08.02.2017 tarihinde onaylandı.
- Karaadilli İçmesuyu Kesin Projesi 15.02.2017 tarihinde onaylandı.

PROJE İŞLERİMİZ

Bankamızca ihale edilen(Kredi-Hibe);

- Dazkırı İçmesuyu Kesin Projesi 18.05.2017 tarihinde onaylandı.
- Evciler İçmesuyu Kesin Projesi 24.05.2017 tarihinde onaylandı.

PROJE İŞLERİMİZ

Bankamızca ihale edilen(Kredi-Hibe);

- Davulga Atıksu Arıtma Tesisi Kesin Projesi Etap B çalışmaları devam etmektedir.
- Dazkırı Atıksu Arıtma Tesisi Kesin Projesi 05.06.2017 tarihinde onaylandı.
- Akharım Atıksu Arıtma Tesisi Kesin Projesi Etap B çalışmaları devam etmektedir.
- Bayat Atıksu Arıtma Tesisi Kesin Projesi Etap D çalışmaları devam etmektedir.

PROJE İŞLERİMİZ

Bankamızca ihale edilen(Kredi-Hibe);

- Sülün Kanalizasyon Kesin Projesi 24.05.2017 tarihinde onaylandı.
- Kırka-Kılıçaslan Kanalizasyon Kesin Projesi 24.05.2017 tarihinde onaylandı.
- Serban Paket Atıksu Arıtma Tesisi Projesi Etap A çalışmaları devam etmektedir.

PROJE İŞLERİMİZ

Bankamızca ihale edilen(Kredi-Hibe);

- Yaylabağı Belediyesi Kültür ve Sanat Evi Projesi Etap A çalışmaları devam etmektedir.
- Yaylabağı Belediyesi Çok Amaçlı Salon Projesi Etap A çalışmaları devam etmektedir.



ILBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

PROJE İŞLERİMİZ

Finansman temin çalışmaları devam etmekte olup, finansman temininden sonra ihale edilecek olan onaylanmış projelerimiz (07.07.2017 tarihi itibarıyla);

- Dazkırı Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi
- Susuz İçmesuyu Yapım İşi
- Dazkırı İçmesuyu Yapım İşi
- Evciler İçmesuyu Yapım İşi
- Kırka-Kılıçaslan Kanalizasyon Yapım İşi
- Sülün Kanalizasyon Yapım İşi
- Sinanpaşa İçmesuyu Yapım İşi



ILBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

İHALE AŞAMASINDAKİ İŞLERİMİZ

Finansmanı temin edilmiş olup ihale aşamasında olan işlerimiz (07.07.2017 tarihi itibariyle);

- Dereçine İçmesuyu Yapım İşi (İhale tarihi: 02.06.2017)
- Tınaztepe (Afyonkarahisar) Kanalizasyon Yapım İşi (İhale tarihi: 31.05.2017)
- Gazlıgöl-Yaylabağı-Kayıhan Kanalizasyon Yapım İşi(İhale tarihi: 30.05.2017)
- Akharım İçmesuyu ve Kanalizasyon Yapım İşi (İhale tarihi: 19.07.2017)



ILBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

İHALE AŞAMASINDAKİ İŞLERİMİZ

Finansmanı temin edilmiş olup ihale aşamasında olan işlerimiz (07.07.2017 tarihi itibariyle);

- Taşoluk Kanalizasyon İnşaatı
- Sülün İçmesuyu İnşaatı
- Erkmene İlave İçmesuyu ve Kanalizasyon Şebeke İnşaatı
- Fethibey İçmesuyu Yapım İşi
- Seydiler İçmesuyu ve Kanalizasyon Yapım İşi



ILBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

İHALE AŞAMASINDAKİ İŞLERİMİZ

Finansmanı Bankamızca temin edilmiş olup Belediyelerince ihale edilecek işlerimiz (07.07.2017 tarihi itibariyle);

- Salar Belediyesi Hamam (Sağlık Yaşam ve Spor Merkezi) Yapım İşi
- Dereçine Düğün Salonu Yapım İşi
- İhsaniye Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Kilitli Parke Taşı ile Yol Yapım İşi
- Çıkrık (Afyonkarahisar) Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Kilitli Parke Taş ve Bordür Döşenmesi Yapım İşi



ILBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

İHALE AŞAMASINDAKİ İŞLERİMİZ

Finansmanı Bankamızca temin edilmiş olup Belediyelerince ihale edilecek işlerimiz (07.07.2017 tarihi itibariyle);

- Salar (Afyonkarahisar) Yol Düzenleme Yapım İşİ
- Gebeceler (Afyonkarahisar) Muhtelif Cadde ve Sokak Yollarının Asfalt, Beton Parke ve Bordür Yapım İşİ
- Dişli (Afyonkarahisar) Kilitli Parke Taş ve Beton Bordür Yapım İşİ
- Sülümenli (Afyonkarahisar) Muhtelif Cadde ve Sokakların Beton Parke ve Bordür Döşenmesi Yapım İşİ



ILBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

HARİTA İŞLERİMİZ

Bankamızca ihale edilen(Kredi-Hibe);

- Tatarlı İmar Planı İlave+ Revizyon ve İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Rapor
- Haydarlı İlave Halihazır Harita, İmar Planına Esas Jeolojik Etüt ve İmar Planı Yapımı
- Susuz Halihazır Harita ve İmar Planına Esas Jeolojik Çalışma
- Seydiler İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Rapor
- Bayat İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Rapor



ILBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

HARİTA İŞLERİMİZ

Bankamızca ihale edilen(Kredi-Hibe);

- Dinar İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Rapor
- Taşoluk İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Rapor
- Tatarlı İmar Planı İlave Revizyon ve İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Rapor
- Davulga İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Rapor

GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ (GES) **İŞLERİMİZ**

Bankamızca ihale edilen(Kredi-Hibe);

- Kayıhan GES Yapım İşi
- İhsaniye GES Yapım İşi
- Bolvadin GES Yapım İşi

YAPIM VE MALZEME, ARAÇ ALIMI KREDİ TALEPLERİ

BELEDİYE	KREDİ TÜRÜ	MİKTAR	AÇIKLAMA
SULTANDAĞI	Yapım (Parke Yol)	4.983.000,00-TL	03.01.2017 tarih ve E.10659 sayılı Makam Oluru ile tahsis edildi.
İHSANİYE	Yapım (Güneş Enerji Santrali)	2.000.000,00-TL	16.01.2017 tarih ve E.147 sayılı yazı ile Yatırım Değerlendirme Dairesi Başkanlığına gönderildi.
BAŞMAKÇI	Yapım (Parke Yol)	1.500.000,00-TL	01.02.2017 tarih ve E.5976 sayılı Makam Oluru ile tahsis edildi.
SALAR	Yapım (Sağlıklı Yaşam ve Spor Merkezi)	500.000,00-TL	08.02.2017 tarih ve E.10911 sayılı Makam Oluru ile tahsis edildi.
BOLVADİN	Yapım (Öğrenci Yurdu)	13.500.000,00-TL	15.02.2017 tarih ve 8/135 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile tahsis edildi.
İŞIKLAR	Yapım (Parke Yol)	2.950.000,00-TL	21.02.2017 tarih ve E.9315 sayılı Makam Oluru ile tahsis edildi.
GEBECELER	Yapım (Asfalt ve Parke Yol)	2.500.000,00-TL	28.02.2017 tarih ve E.569 sayılı yazı ile Yatırım Değerlendirme Dairesi Başkanlığına gönderildi.
GÖMÜ	Yapım (Yol)	767.000,00-TL	01.03.2017 tarih ve E.10862 sayılı Makam Oluru ile tahsis edildi.

YAPIM VE MALZEME, ARAÇ ALIMI KREDİ TALEPLERİ

BELEDİYE	KREDİ TÜRÜ	MİKTAR	AÇIKLAMA
SÜLÜMENLİ	Yapım (Parke Yol)	1.500.000,00-TL	21.03.2017 tarih ve E.14257 sayılı Makam Oluru ile tahsis edildi.
ÇIKRIK	Yapım (Parke Yol)	450.000,00-TL	24.03.2017 tarih ve E.861 sayılı yazı ile Yatırım Değerlendirme Dairesi Başkanlığına gönderildi.
DEREÇİNE	Yapım (Düğün Salonu)	1.418.554,00-TL	27.03.2017 tarih ve E.14811 sayılı Makam Oluru ile tahsis edildi.
AKHARIM	Yapım (Kültür Merkezi)	1.318.896,00-TL	28.03.2017 tarih ve E.15503 sayılı Makam Oluru ile tahsis edildi.
DAVULGA	Malzeme Alımı (Parke Taşı)	944.000,00-TL	28.03.2017 tarih ve E.15471 sayılı Makam Oluru ile tahsis edildi.
DİŞLİ	Yapım (Parke Yol)	1.580.000,00-TL	28.03.2017 tarih ve E.15515 sayılı Makam Oluru ile tahsis edildi.
ÖZBURUN	Yapım (Parke Yol)	1.500.000,00-TL	28.03.2017 tarih ve E.15481 sayılı Makam Oluru ile tahsis edildi.
