

**İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ  
ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ  
2018 YILI 2. DÖNEM  
İL KOORDİNASYON TOPLANTISI  
AFYONKARAHİSAR**



[www.ilbank.gov.tr](http://www.ilbank.gov.tr)



**İLBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

# ESKİŐEHİR

## BÖLGE MÜDÜRLÜĐÜ





**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ, AFYONKARAHİSAR İLİ DAHİLİNDE

6 Adet İçmesuyu

4 Adet İçmesuyu ve Kanalizasyon

6 Adet Kanalizasyon

2 Adet Üstyapı

5 Adet Proje

3 Adet Altyapı

6 Adet Güneş Enerji Santrali

1 Adet Harita ve İmar Planı

Olmak üzere toplam 33 adet proje ile  
Belediyelerimize hizmette bulunmaktadır.

[www.ilbank.gov.tr](http://www.ilbank.gov.tr)

## 2018 Yılı Projelerimizin;

Toplam Tutarı	: 155.413.412,84 TL
2018 Yılı Ödenek Tutarı	: 110.665.462,11 TL
Gelen Harcama Yetkisi	: 110.665.462,11 TL
Dönem Sonu Harcama	: 16.718.558,80 TL
Nakit Gerçekleşme Oranı	: % 15
Fiziki Gerçekleşme Oranı	: % 66



**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## İÇMESUYU SEKTÖRÜNDE;


Bankamızca SUKAP kapsamında ihale edilen  
Dereçine İçmesuyu İnşaatı:

İhale Bedeli	: 1.777.777,00-TL
Sözleşme Tarihi	: 04.07.2017
Yer Teslim Tarihi	: 19.07.2017
İş Bitim Tarihi	: 20.08.2018
2018 Yılı Yapılan Harcama	: -TL
Nakdi Gerçekleşme	: %65
Fiziki Gerçekleşme	: %67



**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## DEREÇİNE İÇMESUYU İNŞAATI

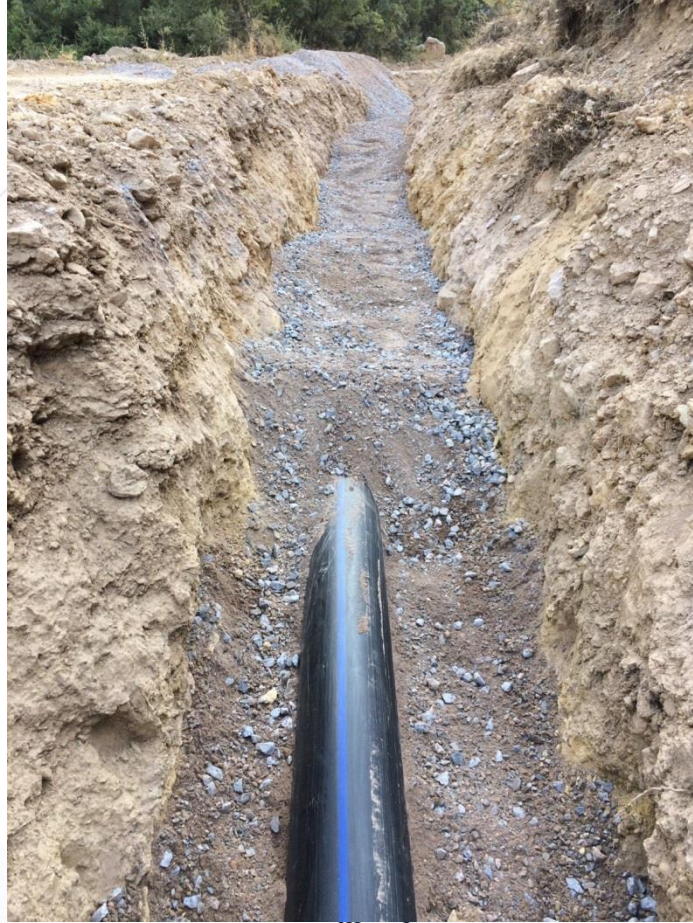

[www.ilbank.gov.tr](http://www.ilbank.gov.tr)



**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## **İÇMESUYU SEKTÖRÜNDE;**

**Bankamızca SUKAP kapsamında ihale edilen  
Hocalar İçmesuyu İnşaatı:**

<b>İhale Bedeli</b>	<b>: 2.518.000,00-TL</b>
<b>Sözleşme Tarihi</b>	<b>: 24.05.2017</b>
<b>Yer Teslim Tarihi</b>	<b>: 03.05.2017</b>
<b>İş Bitim Tarihi</b>	<b>: 06.06.2018</b>
<b>2018 Yılı Yapılan Harcama</b>	<b>: 641.284,63- TL</b>
<b>Nakdi Gerçekleşme</b>	<b>: %65</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>: %68</b>



**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## HOCALAR İÇMESUYU İNŞAATI



[www.ilbank.gov.tr](http://www.ilbank.gov.tr)





**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## İÇMESUYU SEKTÖRÜNDE;

Bankamızca SUKAP kapsamında ihale edilen  
Tınaztepe İçmesuyu İnşaatı:

İhale Bedeli	: 2.599.000,00-TL
Sözleşme Tarihi	: 12.04.2017
Yer Teslim Tarihi	: 20.04.2017
İş Bitim Tarihi	: 29.12.2017
2018 Yılı Yapılan Harcama	: - TL
Nakdi Gerçekleşme	: % 85
Fiziki Gerçekleşme	: % 100



**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## TINAZTEPE İÇMESUYU İNŞAATI



[www.ilbank.gov.tr](http://www.ilbank.gov.tr)



**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## TINAZTEPE İÇMESUYU İNŞAATI



[www.ilbank.gov.tr](http://www.ilbank.gov.tr)



**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## İÇMESUYU SEKTÖRÜNDE;

Bankamızca SUKAP kapsamında ihale edilen  
Gebeceler İçmesuyu İnşaatı:

İhale Bedeli	: 1.648.000,00-TL
Sözleşme Tarihi	: 03.04.2017
Yer Teslim Tarihi	: 12.04.2017
İş Bitim Tarihi	: 09.12.2017
2018 Yılı Yapılan Harcama	: - TL
Nakdi Gerçekleşme	: %95
Fiziki Gerçekleşme	: %97



**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## GEBECELER İÇMESUYU İNŞAATI



[www.ilbank.gov.tr](http://www.ilbank.gov.tr)



**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## **İÇMESUYU SEKTÖRÜNDE;**

**Bankamızca SUKAP kapsamında ihale edilen  
Fethibey İçmesuyu İnşaatı:**

<b>İhale Bedeli</b>	<b>: 1.988.878,00-TL</b>
<b>Sözleşme Tarihi</b>	<b>: 10.11.2017</b>
<b>Yer Teslim Tarihi</b>	<b>: 23.11.2017</b>
<b>İş Bitim Tarihi</b>	<b>: 18.11.2018</b>
<b>2018 Yılı Yapılan Harcama</b>	<b>: 355.498,59- TL</b>
<b>Nakdi Gerçekleşme</b>	<b>: % 14</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>: % 14</b>



**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## **İÇMESUYU ve KANALİZASYON SEKTÖRÜNDE;**

**Bankamızca SUKAP kapsamında ihale edilen  
Seydiler İçmesuyu ve Kanalizasyon İnşaatı:**

<b>İhale Bedeli</b>	<b>: 6.705.553,53-TL</b>
<b>Sözleşme Tarihi</b>	<b>: 03.11.2017</b>
<b>Yer Teslim Tarihi</b>	<b>: 17.11.2017</b>
<b>İş Bitim Tarihi</b>	<b>: 20.05.2019</b>
<b>2018 Yılı Yapılan Harcama</b>	<b>: -TL</b>
<b>Nakdi Gerçekleşme</b>	<b>: %0</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>: %0</b>



**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## **İÇMESUYU ve KANALİZASYON SEKTÖRÜNDE;**

**Bankamızca SUKAP kapsamında ihale edilen  
Döğer İçmesuyu ve Kanalizasyon İnşaatı:**

<b>İhale Bedeli</b>	<b>: 9.153.000,00-TL</b>
<b>Sözleşme Tarihi</b>	<b>: 24.05.2017</b>
<b>Yer Teslim Tarihi</b>	<b>: 07.06.2017</b>
<b>İş Bitim Tarihi</b>	<b>: 07.05.2019</b>
<b>2018 Yılı Yapılan Harcama</b>	<b>: 1.295.442,35-TL</b>
<b>Nakdi Gerçekleşme</b>	<b>: % 15</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>: % 25</b>





**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## DÖĞER İÇMESUYU VE KANALİZASYON İNŞAATI



[www.ilbank.gov.tr](http://www.ilbank.gov.tr)



**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## **İÇMESUYU ve KANALİZASYON SEKTÖRÜNDE;**


**Bankamızca SUKAP kapsamında ihale edilen  
Akharım İçmesuyu ve Kanalizasyon İnşaatı:**

<b>İhale Bedeli</b>	<b>: 6.705.137,00-TL</b>
<b>Sözleşme Tarihi</b>	<b>: 21.08.2017</b>
<b>Yer Teslim Tarihi</b>	<b>: 06.09.2017</b>
<b>İş Bitim Tarihi</b>	<b>: 23.02.2019</b>
<b>2018 Yılı Yapılan Harcama</b>	<b>: 113.016,31- TL</b>
<b>Nakdi Gerçekleşme</b>	<b>: %18</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>: %29</b>



**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## AKHARIM İÇMESUYU VE KANALİZASYON İNŞAATI

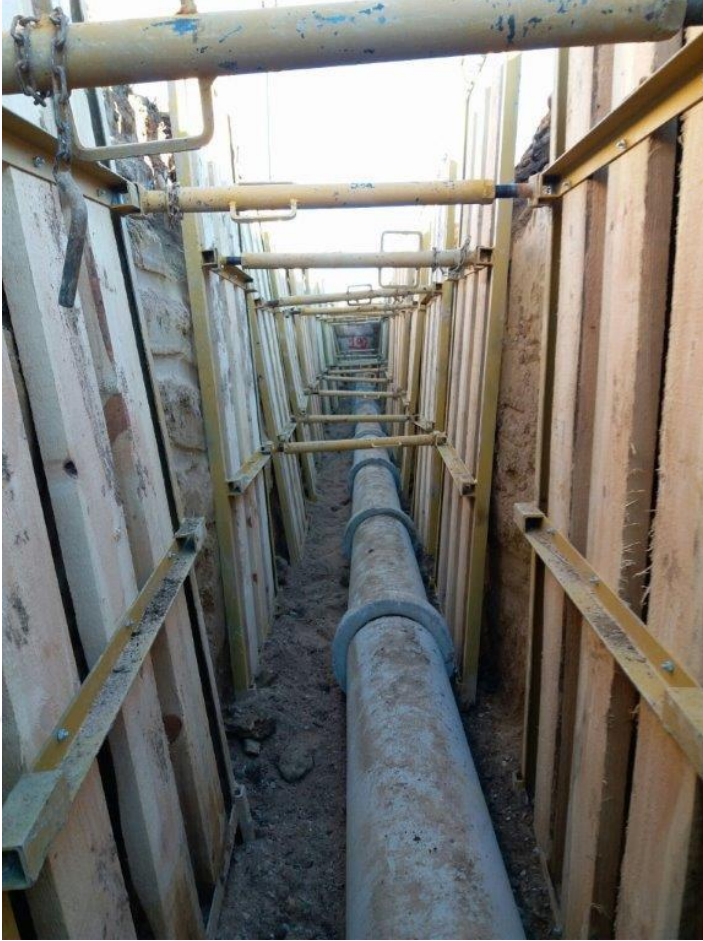

[www.ilbank.gov.tr](http://www.ilbank.gov.tr)



**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## **KANALİZASYON SEKTÖRÜNDE;**

Bankamızca SUKAP kapsamında ihale edilen  
Çobanlar-Kocaöz-Işıklar-Sülümenli Grup Atıksu  
Arıtma Tesisi İkmal İnşaatı:

İhale Bedeli	: 4.944.000,00-TL
Sözleşme Tarihi	: 07.12.2016
Yer Teslim Tarihi	: 21.12.2016
İş Bitim Tarihi	: 28.08.2017
2018 Yılı Yapılan Harcama	: - TL
Nakdi Gerçekleşme	: % 80
Fiziki Gerçekleşme	: % 80



**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## ÇOBANLAR-KOCAÖZ-IŞIKLAR-SÜLÜMENLİ GRUP ATIKSU ARITMA TESİSİ İKMAL İNŞAATI



[www.ilbank.gov.tr](http://www.ilbank.gov.tr)



**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## **KANALİZASYON SEKTÖRÜNDE;**

**Bankamızca SUKAP kapsamında ihale edilen  
Fethibey Kanalizasyon İnşaatı:**

<b>İhale Bedeli</b>	<b>: 4.971.506,84-TL</b>
<b>Sözleşme Tarihi</b>	<b>: 26.10.2016</b>
<b>Yer Teslim Tarihi</b>	<b>: 09.11.2016</b>
<b>İş Bitim Tarihi</b>	<b>: 03.11.2017</b>
<b>2018 Yılı Yapılan Harcama</b>	<b>: 787.311,60- TL</b>
<b>Nakdi Gerçekleşme</b>	<b>: %98</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>: %100</b>

\*%20 iş artışı kapsamında iş devam etmektedir.

[www.ilbank.gov.tr](http://www.ilbank.gov.tr)



**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## FETHİBEY KANALİZASYON İNŞAATI



[www.ilbank.gov.tr](http://www.ilbank.gov.tr)



**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## **KANALİZASYON SEKTÖRÜNDE;**

Bankamızca SUKAP kapsamında ihale edilen  
Bayat Kanalizasyon İnşaatı:

İhale Bedeli	: 7.323.292,35-TL
Sözleşme Tarihi	: 09.11.2016
Yer Teslim Tarihi	: 23.11.2016
İş Bitim Tarihi	: 23.10.2018
2018 Yılı Yapılan Harcama	: -TL
Nakdi Gerçekleşme	: %40
Fiziki Gerçekleşme	: %46





**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## BAYAT KANALİZASYON İNŞAATI



[www.ilbank.gov.tr](http://www.ilbank.gov.tr)



**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## BAYAT KANALİZASYON İNŞAATI



[www.ilbank.gov.tr](http://www.ilbank.gov.tr)



**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## **KANALİZASYON SEKTÖRÜNDE;**


Bankamızca SUKAP kapsamında ihale edilen  
Tınaztepe Kanalizasyon İnşaatı:

İhale Bedeli	: 7.128.000,00-TL
Sözleşme Tarihi	: 12.09.2017
Yer Teslim Tarihi	: 26.09.2017
İş Bitim Tarihi	: 18.12.2019
2018 Yılı Yapılan Harcama	: -TL
Nakdi Gerçekleşme	: %25
Fiziki Gerçekleşme	: %27



**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## TINAZTEPE KANALİZASYON İNŞAATI

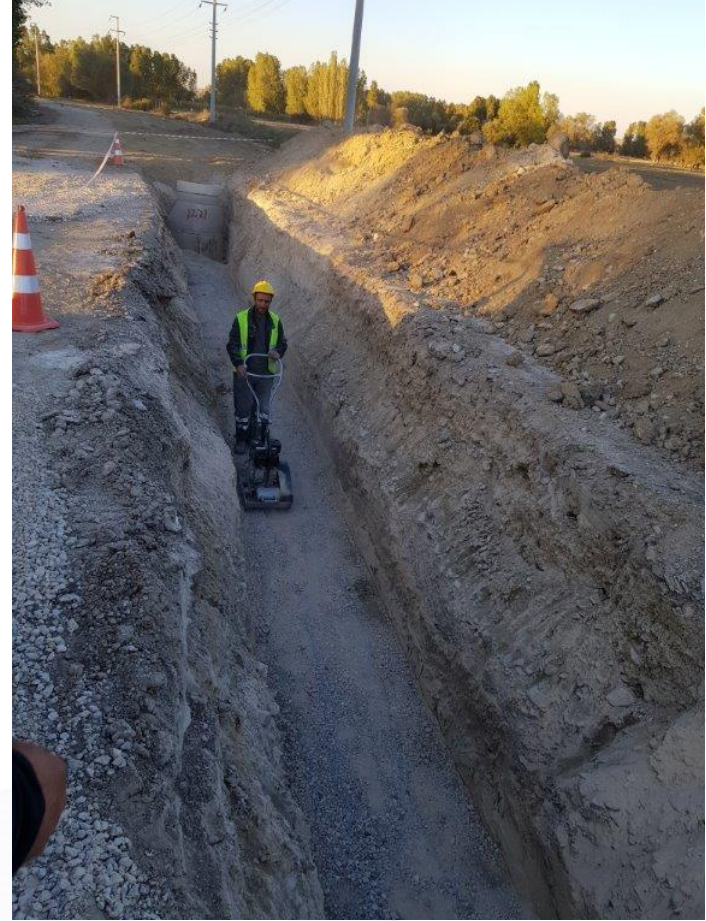

[www.ilbank.gov.tr](http://www.ilbank.gov.tr)



**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## **KANALİZASYON SEKTÖRÜNDE;**

**Bankamızca SUKAP kapsamında ihale edilen  
Taşoluk Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı:**

İhale Bedeli	: 5.733.170,00-TL
Sözleşme Tarihi	: 21.11.2017
Yer Teslim Tarihi	: 12.04.2017
İş Bitim Tarihi	: 28.12.2018
2018 Yılı Yapılan Harcama	: -TL
Nakdi Gerçekleşme	: -
Fiziki Gerçekleşme	: -



**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## **KANALİZASYON SEKTÖRÜNDE;**

**Bankamızca SUKAP kapsamında ihale edilen  
Gazlıgöl-Yaylabağı-Kayıhan(Afyonkarahisar)  
Kanalizasyon Yapım İşi:**

<b>İhale Bedeli</b>	<b>: 16.377.000,00-TL</b>
<b>Sözleşme Tarihi</b>	<b>: 02.03.2018</b>
<b>Yer Teslim Tarihi</b>	<b>: 16.03.2018</b>
<b>İş Bitim Tarihi</b>	<b>: 18.05.2020</b>
<b>2018 Yılı Yapılan Harcama</b>	<b>: -TL</b>
<b>Nakdi Gerçekleşme</b>	<b>: -</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>: -</b>



**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## **KANALİZASYON SEKTÖRÜNDE;**

Bankamızca SUKAP kapsamında ihale edilen  
Erkmen (Afyonkarahisar) İçmesuyu ve  
Kanalizasyon İnşaatı:

İhale Bedeli	: 2.432.000,00-TL
Sözleşme Tarihi	: 06.03.2018
Yer Teslim Tarihi	: 20.03.2018
İş Bitim Tarihi	: 24.11.2018
2018 Yılı Yapılan Harcama	: -TL
Nakdi Gerçekleşme	: -
Fiziki Gerçekleşme	: -



**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## **ALTYAPI SEKTÖRÜNDE;**

### Sultandağı Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Beton Parke Taşı ve Bordür Yapım İşi:(Banka Kredisi)

İhale Bedeli	: 4.177.760,00-TL
Sözleşme Tarihi	: 08.05.2017
Yer Teslim Tarihi	: 12.05.2017
İş Bitim Tarihi	: 23.09.2017
2018 Yılı Yapılan Harcama	: - TL
Nakdi Gerçekleşme	: % 98
Fiziki Gerçekleşme	: % 100

\*%20 iş artışı kapsamında yapımı devam ediyor.

[www.ilbank.gov.tr](http://www.ilbank.gov.tr)





**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## SULTANDAĞI MUHTELİF CADDE VE SOKAKLARDA BETON PARKE TAŞI VE BORDÜR YAPIM İŞİ





**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## **ALTYAPI SEKTÖRÜNDE;**

Gebeceler (Afyonkarahisar) Muhtelif Cadde ve Sokak Yollarının Asfalt,Beton Parke ve Bordür Yapım İşi:(Banka Kredisi)

İhale Bedeli	: 1.523.000,00-TL
Sözleşme Tarihi	: 10.07.2017
Yer Teslim Tarihi	: 14.07.2017
İş Bitim Tarihi	: 12.10.2017
2018 Yılı Yapılan Harcama	: 290.169,32- TL
Nakdi Gerçekleşme	: % 95
Fiziki Gerçekleşme	: % 95



**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## **ALTYAPI SEKTÖRÜNDE;**

Sandıklı (Afyonkarahisar) Parke Taş,Bordur  
Yağmur Oluğu ile Yol ve Kaldırım  
Düzenlenmesi:(Banka Kredisi)

İhale Bedeli	: 3.425.700,00-TL
Sözleşme Tarihi	: 12.04.2017
Yer Teslim Tarihi	: 17.04.2017
İş Bitim Tarihi	: 23.12.2017
2018 Yılı Yapılan Harcama	: 868.944,56-TL
Nakdi Gerçekleşme	: % 80
Fiziki Gerçekleşme	: % 83



**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## ÜSTYAPI SEKTÖRÜNDE;

Dereçine (Afyonkarahisar) Düğün Salonu Yapım  
İşi:

İhale Bedeli	: 1.575.000,00-TL
Sözleşme Tarihi	: 27.07.2017
Yer Teslim Tarihi	: 31.07.2017
İş Bitim Tarihi	: 26.06.2018
2018 Yılı Yapılan Harcama	: 583.917,29- TL
Nakdi Gerçekleşme	: % 80
Fiziki Gerçekleşme	: % 81



**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## DEREÇİNE (AFYONKARAHİSAR) DÜĞÜN SALONU YAPIM İŞİ



[www.ilbank.gov.tr](http://www.ilbank.gov.tr)



**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## **ENERJİ SEKTÖRÜNDE;**

Kayıhan (Afyonkarahisar) 180KWE Şebeke  
Bağlantılı Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santrali  
Yapım İşi:

İhale Bedeli	: 972.000,00-TL
Sözleşme Tarihi	: 12.06.2017
Yer Teslim Tarihi	: 14.06.2017
İş Bitim Tarihi	: 12.10.2017
2018 Yılı Yapılan Harcama	: - TL
Nakdi Gerçekleşme	: % 85
Fiziki Gerçekleşme	: % 100

\*Geçici kabulü yapıldı.

[www.ilbank.gov.tr](http://www.ilbank.gov.tr)



**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## KAYIHAN (AFYONKARAHİSAR) 180KWE GES YAPIM İŞİ



[www.ilbank.gov.tr](http://www.ilbank.gov.tr)



**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## **ENERJİ SEKTÖRÜNDE;**

İhsaniye (Afyonkarahisar) 500KW Gücünde  
Güneş Enerjisi Santrali Yapım İşi:

İhale Bedeli	: 2.058.000,00-TL
Sözleşme Tarihi	: 04.08.2017
Yer Teslim Tarihi	: 17.08.2017
İş Bitim Tarihi	: 15.12.2017
2018 Yılı Yapılan Harcama	: - TL
Nakdi Gerçekleşme	: % 80
Fiziki Gerçekleşme	: % 90





**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## İHSANİYE (AFYONKARAHİSAR) 500KW GES YAPIM İŞİ



[www.ilbank.gov.tr](http://www.ilbank.gov.tr)



**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## **ENERJİ SEKTÖRÜNDE;**

Gazlıgöl (Afyonkarahisar) 986kW Gücünde  
Güneş Enerjisi Santrali Yapım İşi:

İhale Bedeli	: 5.200.000,00-TL
Sözleşme Tarihi	: 21.09.2017
Yer Teslim Tarihi	: 26.09.2017
İş Bitim Tarihi	: 03.01.2018
2018 Yılı Yapılan Harcama	: 5.226.777,14- TL
Nakdi Gerçekleşme	: %90
Fiziki Gerçekleşme	: % 100



**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## GAZLIGÖL (AFYONKARAHİSAR) 986kW GES YAPIM İŞİ



[www.ilbank.gov.tr](http://www.ilbank.gov.tr)



**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## **ENERJİ SEKTÖRÜNDE;**

### Çobanlar (Afyonkarahisar) 1000kWe Gücünde Güneş Enerjisi Santrali Yapım İşi:

İhale Bedeli	: 4.278.000,00-TL
Sözleşme Tarihi	: 11.10.2017
Yer Teslim Tarihi	: 17.10.2017
İş Bitim Tarihi	: 29.12.2017
2018 Yılı Yapılan Harcama	: 2.160.854,80- TL
Nakdi Gerçekleşme	: % 45
Fiziki Gerçekleşme	: % 90



**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## ÇOBANLAR (AFYONKARAHİSAR) 1000kWe GES YAPIM İŞİ



[www.ilbank.gov.tr](http://www.ilbank.gov.tr)



**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## **ENERJİ SEKTÖRÜNDE;**

Bolvadin (Afyonkarahisar) 980kWe Gücünde  
Şebeke Bağlantılı Fotovoltaik Güneş Enerjisi  
Santrali Yapım İşi:

İhale Bedeli	: 3.969.000,00-TL
Sözleşme Tarihi	: 20.10.2017
Yer Teslim Tarihi	: 23.10.2017
İş Bitim Tarihi	: 09.02.2018
2018 Yılı Yapılan Harcama	: 4.395.342,21 TL
Nakdi Gerçekleşme	: % 100
Fiziki Gerçekleşme	: % 100



**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## BOLVADİN (AFYONKARAHİSAR) 980KWE GES YAPIM İŞİ



[www.ilbank.gov.tr](http://www.ilbank.gov.tr)

## **PROJE İŞLERİMİZ**

Bankamızca ihale edilen(Kredi-Hibe);

- Yaylabağı (Afyonkarahisar) İçmesuyu Kesin Projesi Etap B çalışmaları devam ediyor.
- Değirmenayvalı (Afyonkarahisar) İçmesuyu Kesin Projesi Etap A çalışmaları devam ediyor.
- Düzağaç (Afyonkarahisar) İçmesuyu Kesin Projesi Etap B çalışmaları devam ediyor.
- Büyükkalecik (Afyonkarahisar) İçmesuyu Kesin Projesi Etap A çalışmaları devam ediyor.





**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## **PROJE İŞLERİMİZ**

Bankamızca ihale edilen(Kredi-Hibe);

- Davulga Atıksu Arıtma Tesisi Kesin Projesi Etap C çalışmaları devam etmektedir.



**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## **PROJE İŞLERİMİZ**

Finansman temin çalışmaları devam etmekte olup, finansman temininden sonra ihale edilecek olan onaylanmış projelerimiz (26.03.2018 tarihi itibariyle);

- Dazkırı Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi
- Bayat Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi
- Susuz İçmesuyu Yapım İşi
- Dazkırı İçmesuyu Yapım İşi
- Sülün İçmesuyu Yapım İşi
- Evciler İçmesuyu Yapım İşi
- Kırka-Kılıçaslan Kanalizasyon Yapım İşi
- Karaadilli İçmesuyu Yapım İşi
- Sülün Kanalizasyon Yapım İşi
- Sinanpaşa İçmesuyu Yapım İşi



**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## **İHALE AŞAMASINDAKİ İŞLERİMİZ**

Finansmanı Bankamızca temin edilmiş olup Belediyelerince ihale edilecek işlerimiz (26.03.2018 tarihi itibariyle);

- Çıkrık (Afyonkarahisar) Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Kilitli Parke Taş ve Bordür Döşenmesi Yapım İşi



**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## **HARİTA İŞLERİMİZ**

Bankamızca ihale edilen(Kredi-Hibe);

- Haydarlı İlave Halihazır Harita, İmar Planına Esas Jeolojik Etüt ve İmar Planı Yapımı



**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## **GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ (GES)** **İŞLERİMİZ**

Bankamızca ihale edilecek sözleşme aşamasındaki işlerimiz;

- Taşoluk GES Yapım İşi



**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

# Arz Ederim...

**Murat KARAÇAM**  
Bölge Müdürü

[www.ilbank.gov.tr](http://www.ilbank.gov.tr)
