

**İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ  
ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ  
2018 YILI 1. DÖNEM  
İL KOORDİNASYON TOPLANTISI  
AFYONKARAHİSAR**



[www.ilbank.gov.tr](http://www.ilbank.gov.tr)



**İLBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

ESKİŐEHİR  
BÖLGE MÜDÜRLÜĐÜ





**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ, AFYONKARAHİSAR İLİ DAHİLİNDE

6 Adet İçmesuyu

4 Adet İçmesuyu ve Kanalizasyon

6 Adet Kanalizasyon

5 Adet Üstyapı

19 Adet Proje

8 Adet Altyapı

6 Adet Güneş Enerji Santrali

4 Adet Harita ve İmar Planı

Olmak üzere toplam 58 adet proje ile  
Belediyelerimize hizmette bulunmaktadır.

[www.ilbank.gov.tr](http://www.ilbank.gov.tr)

## 2017 Yılı Projelerimizin;

Toplam Tutarı	: 191.834.040,33 TL
2017 Yılı Ödenek Tutarı	: 155.637.660,75 TL
Gelen Harcama Yetkisi	: 155.637.660,75 TL
Dönem Sonu Harcama	: 63.003.302,07 TL
Nakit Gerçekleşme Oranı	: % 40
Fiziki Gerçekleşme Oranı	: % 66



**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## **İÇMESUYU SEKTÖRÜNDE;**

**Bankamızca SUKAP kapsamında ihale edilen  
Dereçine İçmesuyu İnşaatı:**


<b>İhale Bedeli</b>	<b>: 1.777.777,00-TL</b>
<b>Sözleşme Tarihi</b>	<b>: 04.07.2017</b>
<b>Yer Teslim Tarihi</b>	<b>: 19.07.2017</b>
<b>İş Bitim Tarihi</b>	<b>: 20.08.2018</b>
<b>2017 Yılı Yapılan Harcama</b>	<b>: 1.497.008,00 TL</b>
<b>Nakdi Gerçekleşme</b>	<b>: %65</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>: %67</b>





**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## DEREÇİNE İÇMESUYU İNŞAATI

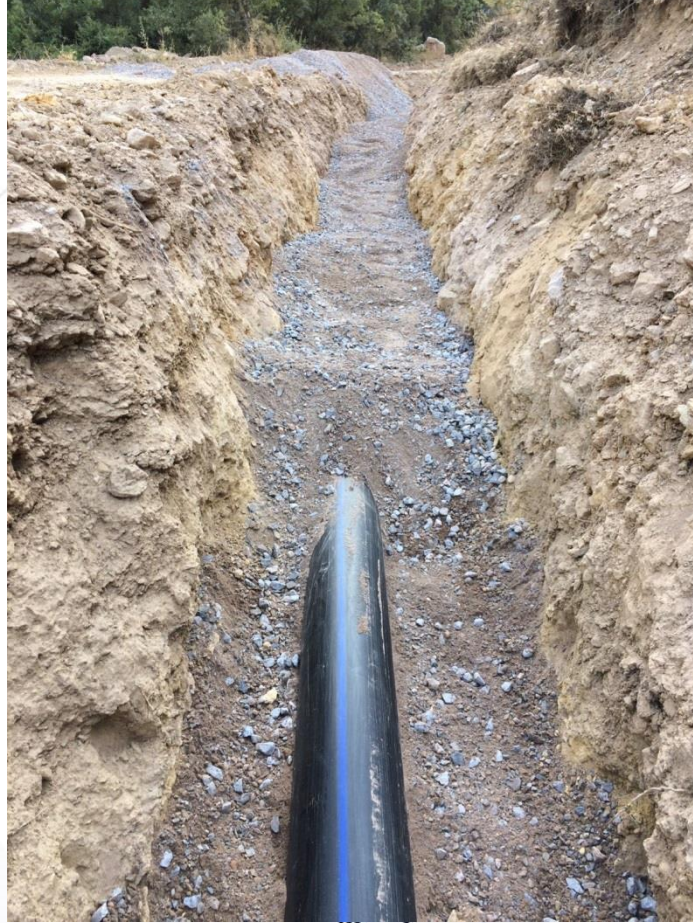

[www.ilbank.gov.tr](http://www.ilbank.gov.tr)



**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## DEREÇİNE İÇMESUYU İNŞAATI



[www.ilbank.gov.tr](http://www.ilbank.gov.tr)





**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## **İÇMESUYU SEKTÖRÜNDE;**

**Bankamızca SUKAP kapsamında ihale edilen  
Hocalar İçmesuyu İnşaatı:**

<b>İhale Bedeli</b>	<b>: 2.518.000,00-TL</b>
<b>Sözleşme Tarihi</b>	<b>: 24.05.2017</b>
<b>Yer Teslim Tarihi</b>	<b>: 03.05.2017</b>
<b>İş Bitim Tarihi</b>	<b>: 06.06.2018</b>
<b>2017 Yılı Yapılan Harcama</b>	<b>: 1.419.758.63- TL</b>
<b>Nakdi Gerçekleşme</b>	<b>: %45</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>: %48</b>





**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## HOCALAR İÇMESUYU İNŞAATI



[www.ilbank.gov.tr](http://www.ilbank.gov.tr)



**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## İÇMESUYU SEKTÖRÜNDE;

Bankamızca SUKAP kapsamında ihale edilen  
Tınaztepe İçmesuyu İnşaatı:

İhale Bedeli	: 2.599.000,00-TL
Sözleşme Tarihi	: 12.04.2017
Yer Teslim Tarihi	: 20.04.2017
İş Bitim Tarihi	: 29.12.2017
2017 Yılı Yapılan Harcama	: 2.801.581,70- TL
Nakdi Gerçekleşme	: % 85
Fiziki Gerçekleşme	: % 89





**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## TINAZTEPE İÇMESUYU İNŞAATI



[www.ilbank.gov.tr](http://www.ilbank.gov.tr)





**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## TINAZTEPE İÇMESUYU İNŞAATI



[www.ilbank.gov.tr](http://www.ilbank.gov.tr)





**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## İÇMESUYU SEKTÖRÜNDE;

Bankamızca SUKAP kapsamında ihale edilen  
Gebeceler İçmesuyu İnşaatı:

İhale Bedeli	: 1.648.000,00-TL
Sözleşme Tarihi	: 03.04.2017
Yer Teslim Tarihi	: 12.04.2017
İş Bitim Tarihi	: 09.12.2017
2017 Yılı Yapılan Harcama	: 1.928.453,37- TL
Nakdi Gerçekleşme	: %95
Fiziki Gerçekleşme	: %97



**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## GEBECELER İÇMESUYU İNŞAATI



[www.ilbank.gov.tr](http://www.ilbank.gov.tr)



**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## İÇMESUYU SEKTÖRÜNDE;

Bankamızca SUKAP kapsamında ihale edilen  
Fethibey İçmesuyu İnşaatı:

İhale Bedeli	: 1.988.878,00-TL
Sözleşme Tarihi	: 10.11.2017
Yer Teslim Tarihi	: 23.11.2017
İş Bitim Tarihi	: 18.11.2018
2017 Yılı Yapılan Harcama	: - TL
Nakdi Gerçekleşme	: %0
Fiziki Gerçekleşme	: %0



**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## **İÇMESUYU ve KANALİZASYON SEKTÖRÜNDE;**

**Bankamızca SUKAP kapsamında ihale edilen  
Seydiler İçmesuyu ve Kanalizasyon İnşaatı:**

<b>İhale Bedeli</b>	<b>: 6.705.553,53-TL</b>
<b>Sözleşme Tarihi</b>	<b>: 03.11.2017</b>
<b>Yer Teslim Tarihi</b>	<b>: 17.11.2017</b>
<b>İş Bitim Tarihi</b>	<b>: 20.05.2019</b>
<b>2017 Yılı Yapılan Harcama</b>	<b>: -TL</b>
<b>Nakdi Gerçekleşme</b>	<b>: %0</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>: %0</b>





**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## **İÇMESUYU ve KANALİZASYON SEKTÖRÜNDE;**

**Bankamızca SUKAP kapsamında ihale edilen  
Döğer İçmesuyu ve Kanalizasyon İnşaatı:**

<b>İhale Bedeli</b>	<b>: 9.153.000,00-TL</b>
<b>Sözleşme Tarihi</b>	<b>: 24.05.2017</b>
<b>Yer Teslim Tarihi</b>	<b>: 07.06.2017</b>
<b>İş Bitim Tarihi</b>	<b>: 07.05.2019</b>
<b>2017 Yılı Yapılan Harcama</b>	<b>: 1.653.282,45-TL</b>
<b>Nakdi Gerçekleşme</b>	<b>: % 10</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>: % 14</b>



**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## DÖĞER İÇMESUYU VE KANALİZASYON İNŞAATI



[www.ilbank.gov.tr](http://www.ilbank.gov.tr)



**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## **İÇMESUYU ve KANALİZASYON SEKTÖRÜNDE;**

**Bankamızca SUKAP kapsamında ihale edilen  
Akharım İçmesuyu ve Kanalizasyon İnşaatı:**


<b>İhale Bedeli</b>	<b>: 6.705.137,00-TL</b>
<b>Sözleşme Tarihi</b>	<b>: 21.08.2017</b>
<b>Yer Teslim Tarihi</b>	<b>: 06.09.2017</b>
<b>İş Bitim Tarihi</b>	<b>: 23.02.2019</b>
<b>2017 Yılı Yapılan Harcama</b>	<b>: 1.258.112,51- TL</b>
<b>Nakdi Gerçekleşme</b>	<b>: % 15</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>: % 15</b>





**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## AKHARIM İÇMESUYU VE KANALİZASYON İNŞAATI

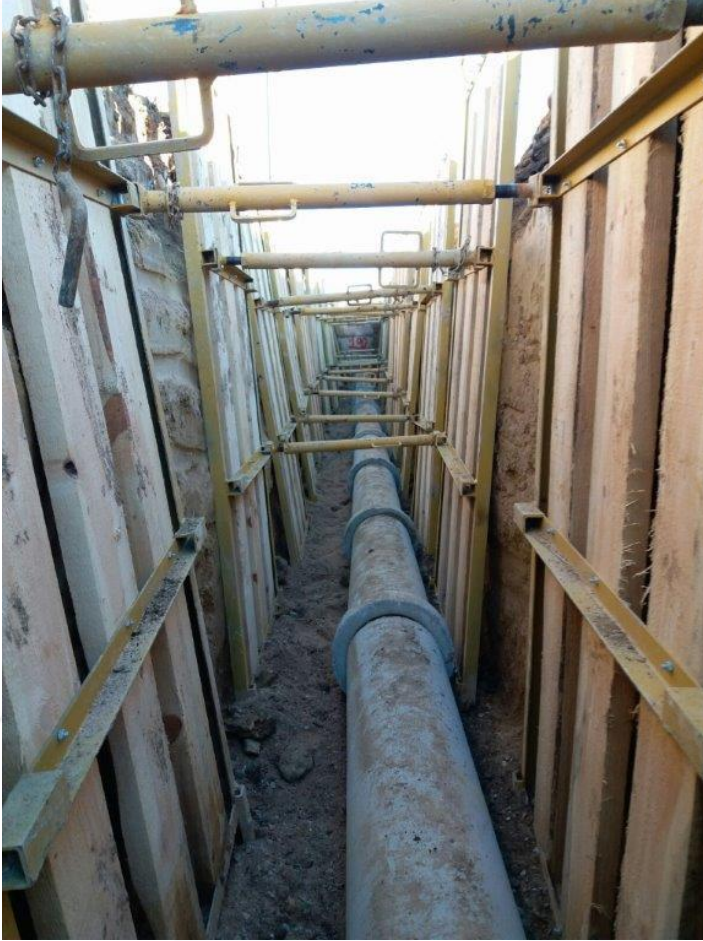

[www.ilbank.gov.tr](http://www.ilbank.gov.tr)





**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## **KANALİZASYON SEKTÖRÜNDE;**

**Bankamızca SUKAP kapsamında ihale edilen  
Çobanlar-Kocaöz-Işıklar-Sülümenli Grup Atıksu  
Arıtma Tesisi İkmal İnşaatı:**

<b>İhale Bedeli</b>	<b>: 4.944.000,00-TL</b>
<b>Sözleşme Tarihi</b>	<b>: 07.12.2016</b>
<b>Yer Teslim Tarihi</b>	<b>: 21.12.2016</b>
<b>İş Bitim Tarihi</b>	<b>: 28.08.2017</b>
<b>2017 Yılı Yapılan Harcama</b>	<b>: 5.143.447,41- TL</b>
<b>Nakdi Gerçekleşme</b>	<b>: % 80</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>: % 80</b>



**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## ÇOBANLAR-KOCAÖZ-IŞIKLAR-SÜLÜMENLİ GRUP ATIKSU ARITMA TESİSİ İKMAL İNŞAATI





**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## **KANALİZASYON SEKTÖRÜNDE;**

**Bankamızca SUKAP kapsamında ihale edilen  
Fethibey Kanalizasyon İnşaatı:**

<b>İhale Bedeli</b>	<b>: 4.971.506,84-TL</b>
<b>Sözleşme Tarihi</b>	<b>: 26.10.2016</b>
<b>Yer Teslim Tarihi</b>	<b>: 09.11.2016</b>
<b>İş Bitim Tarihi</b>	<b>: 03.11.2017</b>
<b>2017 Yılı Yapılan Harcama</b>	<b>: 5.601.158,06- TL</b>
<b>Nakdi Gerçekleşme</b>	<b>: %95</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>: %100</b>

\*%20 iş artışı kapsamında iş devam etmektedir.

[www.ilbank.gov.tr](http://www.ilbank.gov.tr)



**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## FETHİBEY KANALİZASYON İNŞAATI



[www.ilbank.gov.tr](http://www.ilbank.gov.tr)





**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## **KANALİZASYON SEKTÖRÜNDE;**

Bankamızca SUKAP kapsamında ihale edilen  
Bayat Kanalizasyon İnşaatı:

İhale Bedeli	: 7.323.292,35-TL
Sözleşme Tarihi	: 09.11.2016
Yer Teslim Tarihi	: 23.11.2016
İş Bitim Tarihi	: 23.10.2018
2017 Yılı Yapılan Harcama	: 5.079.274,38-TL
Nakdi Gerçekleşme	: %40
Fiziki Gerçekleşme	: %46



**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## BAYAT KANALİZASYON İNŞAATI



[www.ilbank.gov.tr](http://www.ilbank.gov.tr)



**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## BAYAT KANALİZASYON İNŞAATI



[www.ilbank.gov.tr](http://www.ilbank.gov.tr)





**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## **KANALİZASYON SEKTÖRÜNDE;**

**Bankamızca SUKAP kapsamında ihale edilen  
Tınaztepe Kanalizasyon İnşaatı:**


<b>İhale Bedeli</b>	<b>: 7.128.000,00-TL</b>
<b>Sözleşme Tarihi</b>	<b>: 12.09.2017</b>
<b>Yer Teslim Tarihi</b>	<b>: 26.09.2017</b>
<b>İş Bitim Tarihi</b>	<b>: 18.12.2019</b>
<b>2017 Yılı Yapılan Harcama</b>	<b>: 2.485.902,03TL</b>
<b>Nakdi Gerçekleşme</b>	<b>: %25</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>: %27</b>





**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## TINAZTEPE KANALİZASYON İNŞAATI

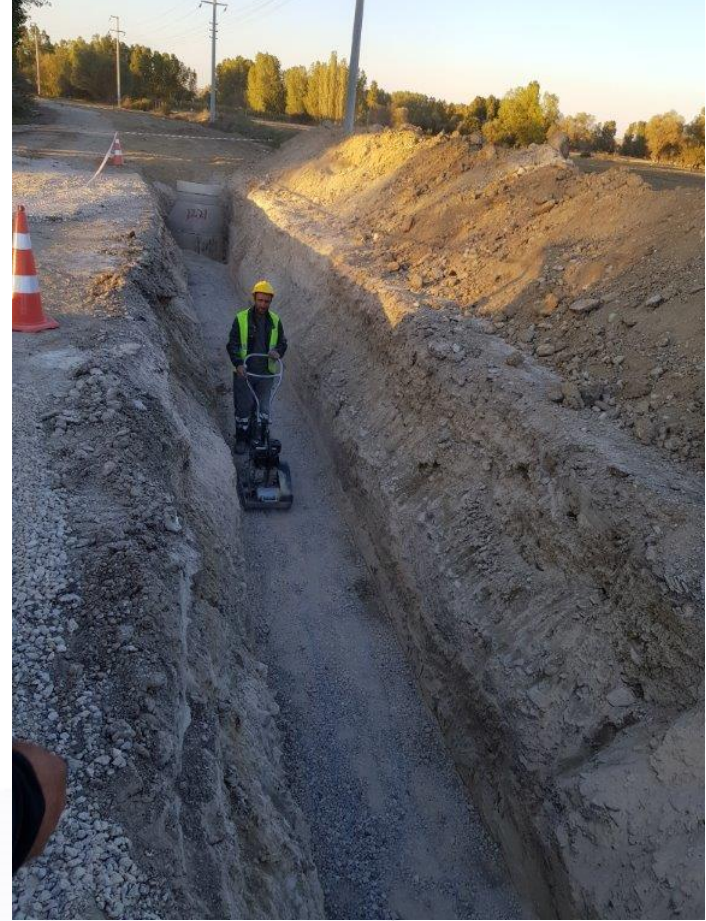

[www.ilbank.gov.tr](http://www.ilbank.gov.tr)



**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## **KANALİZASYON SEKTÖRÜNDE;**

**Bankamızca SUKAP kapsamında ihale edilen  
Taşoluk Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı:**

<b>İhale Bedeli</b>	<b>: 5.733.170,00-TL</b>
<b>Sözleşme Tarihi</b>	<b>: 21.11.2017</b>
<b>Yer Teslim Tarihi</b>	<b>: 12.04.2017</b>
<b>İş Bitim Tarihi</b>	<b>: 28.12.2018</b>
<b>2017 Yılı Yapılan Harcama</b>	<b>: -TL</b>
<b>Nakdi Gerçekleşme</b>	<b>: -</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>: -</b>



**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## **ALTYAPI SEKTÖRÜNDE;**

### Çayırbağ Kilitliparke Taşı ile Yol Düzenleme İnşaatı:(Banka Kredisi)

İhale Bedeli	: 1.539.500,00-TL
Sözleşme Tarihi	: 03.02.2016
Yer Teslim Tarihi	: 03.02.2016
İş Bitim Tarihi	: 01.08.2016
2017 Yılı Yapılan Harcama	: 926.673,40- TL
Nakdi Gerçekleşme	: % 90
Fiziki Gerçekleşme	: % 100

\*Belediyesince 29.09.2017 tarihinde geçici kabulü yapıldı.





**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## ÇAYIRBAĞ KİLİTLİPARKE TAŞI İLE YOL DÜZENLEME İNŞAATI:



[www.ilbank.gov.tr](http://www.ilbank.gov.tr)





**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## **ALTYAPI SEKTÖRÜNDE;**

### Sultandağı Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Beton Parke Taşı ve Bordür Yapım İşi:(Banka Kredisi)

İhale Bedeli	: 4.177.760,00-TL
Sözleşme Tarihi	: 08.05.2017
Yer Teslim Tarihi	: 12.05.2017
İş Bitim Tarihi	: 23.09.2017
2017 Yılı Yapılan Harcama	: 4.825.231,25- TL
Nakdi Gerçekleşme	: % 98
Fiziki Gerçekleşme	: % 100

\*%20 iş artışı kapsamında yapımı devam ediyor.

[www.ilbank.gov.tr](http://www.ilbank.gov.tr)



**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## SULTANDAĞI MUHTELİF CADDE VE SOKAKLARDA BETON PARKE TAŞI VE BORDÜR YAPIM İŞİ





**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## **ALTYAPI SEKTÖRÜNDE;**

### Başmakçı Yol ve/veya Kaldırım İnşaatı

İhale Bedeli	: 1.565.000,00-TL
Sözleşme Tarihi	: 28.03.2017
Yer Teslim Tarihi	: 28.03.2017
İş Bitim Tarihi	: 25.08.2017
2017 Yılı Yapılan Harcama	: 1.522.994,02- TL
Nakdi Gerçekleşme	: % 95
Fiziki Gerçekleşme	: % 100





**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## BAŞMAKÇI YOL VE/VEYA KALDIRIM İNŞAATI



[www.ilbank.gov.tr](http://www.ilbank.gov.tr)





**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## **ALTYAPI SEKTÖRÜNDE;**

### Özburun Yol ve/veya Kaldırım İnşaatı


İhale Bedeli	: 2.766.500,00-TL
Sözleşme Tarihi	: 18.04.2017
Yer Teslim Tarihi	: 24.04.2017
İş Bitim Tarihi	: 22.08.2017
2017 Yılı Yapılan Harcama	: 1.747.238.39- TL
Nakdi Gerçekleşme	: % 90
Fiziki Gerçekleşme	: % 100

\*Belediyesince 27.10.2017 tarihinde geçici kabulü yapıldı.



**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## ÖZBURUN YOL VE/VEYA KALDIRIM İNŞAATI

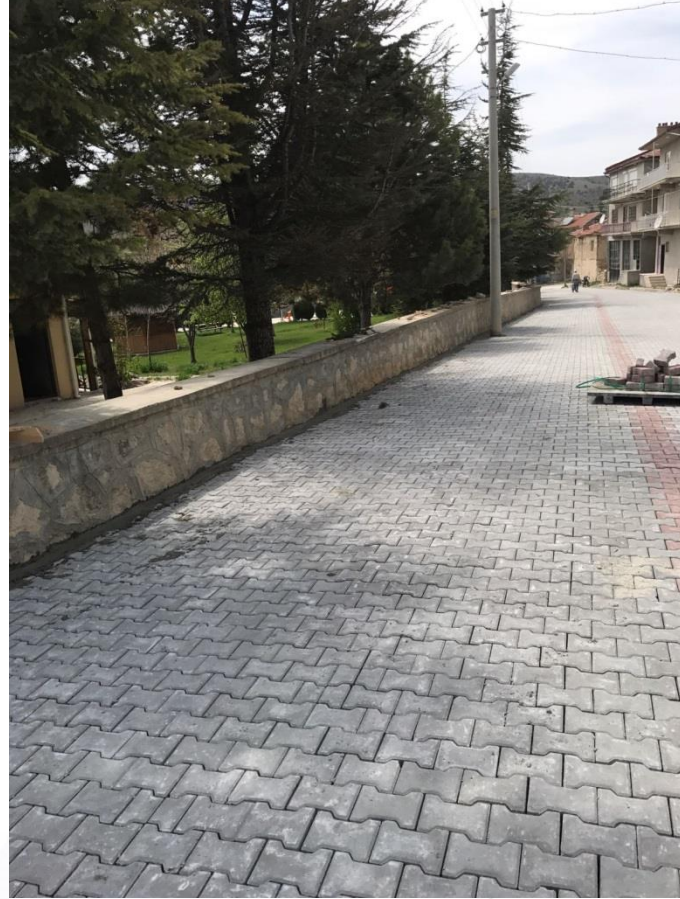

[www.ilbank.gov.tr](http://www.ilbank.gov.tr)



**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## **ALTYAPI SEKTÖRÜNDE;**

### Dişli Kilitli Parke Taşı ve Beton Bordür Yol Yapım İşi:

İhale Bedeli	: 1.237.500,00-TL
Sözleşme Tarihi	: 30.05.2017
Yer Teslim Tarihi	: 31.05.2017
İş Bitim Tarihi	: 28.09.2017
2017 Yılı Yapılan Harcama	: 1.556.030,76- TL
Nakdi Gerçekleşme	: % 100
Fiziki Gerçekleşme	: % 100

\*Belediyesince 27.11.2017 tarihinde geçici kabulü yapıldı.





**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## DİŞLİ KİLİTLİ PARKE TAŞI VE BETON BORDÜR YOL YAPIM İŞİ



[www.ilbank.gov.tr](http://www.ilbank.gov.tr)



**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## **ALTYAPI SEKTÖRÜNDE;**

### Sülümenli Muhtelif Cadde ve Sokakların Beton Parke ve Bordür Döşenmesi Yapım İşi:

İhale Bedeli	: 1.248.000,00-TL
Sözleşme Tarihi	: 25.05.2017
Yer Teslim Tarihi	: 29.05.2017
İş Bitim Tarihi	: 26.10.2017
2017 Yılı Yapılan Harcama	: 1.499.507,84- TL
Nakdi Gerçekleşme	: % 100
Fiziki Gerçekleşme	: % 100

\*Belediyesince 24.11.2017 tarihinde geçici kabulü yapıldı.



**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## ÜSTYAPI SEKTÖRÜNDE;

### Sandıklı Kent Meydanı ve Çok Katlı Otopark Yapım İşi:

İhale Bedeli	: 9.549.500,00-TL
Sözleşme Tarihi	: 05.02.2016
Yer Teslim Tarihi	: 11.02.2016
İş Bitim Tarihi	: 21.07.2017
2017 Yılı Yapılan Harcama	: 2.212.665,69- TL
Nakdi Gerçekleşme	: % 96
Fiziki Gerçekleşme	: % 100

\*Geçici Kabulü 27.09.2017 tarihinde Belediyesince yapılmıştır.





**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## SANDIKLI KENT MEYDANI VE ÇOK KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ:



[www.ilbank.gov.tr](http://www.ilbank.gov.tr)



**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## SANDIKLI KENT MEYDANI VE ÇOK KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ:



[www.ilbank.gov.tr](http://www.ilbank.gov.tr)



**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## ÜSTYAPI SEKTÖRÜNDE;

### Taşoluk (Afyonkarahisar) Kültür Merkezi İnşaatı:

İhale Bedeli	: 1.140.000,00-TL
Sözleşme Tarihi	: 09.02.2017
Yer Teslim Tarihi	: 06.03.2017
İş Bitim Tarihi	: 19.07.2017
2017 Yılı Yapılan Harcama	1.318.296,00TL
Nakdi Gerçekleşme	: % 100
Fiziki Gerçekleşme	: % 100

\*Geçici Kabulü 24.10.2017 tarihinde Belediyesince yapılmıştır.





**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## TAŞOLUK (AFYONKARAHİSAR) KÜLTÜR MERKEZİ İNŞAATI



[www.ilbank.gov.tr](http://www.ilbank.gov.tr)



**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## TAŞOLUK (AFYONKARAHİSAR) KÜLTÜR MERKEZİ İNŞAATI



[www.ilbank.gov.tr](http://www.ilbank.gov.tr)



**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## ÜSTYAPI SEKTÖRÜNDE;

Bolvadin (Afyonkarahisar) Belediye Öğrenci  
Yurdu Yapım İşi:

İhale Bedeli	: 13.140.000,00-TL
Sözleşme Tarihi	: 16.03.2017
Yer Teslim Tarihi	: 20.03.2017
İş Bitim Tarihi	: 26.09.2017
2017 Yılı Yapılan Harcama	: 13.500.000,00- TL
Nakdi Gerçekleşme	: % 100
Fiziki Gerçekleşme	: % 100

\*Geçici Kabulü 26.09.2017 tarihinde Belediyesince yapılmıştır.





**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## BOLVADİN (AFYONKARAHİSAR) BELEDİYE ÖĞRENCİ YURDU YAPIM İŞİ



[www.ilbank.gov.tr](http://www.ilbank.gov.tr)



**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## BOLVADİN (AFYONKARAHİSAR) BELEDİYE ÖĞRENCİ YURDU YAPIM İŞİ



[www.ilbank.gov.tr](http://www.ilbank.gov.tr)



**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## ÜSTYAPI SEKTÖRÜNDE;

### Dereçine (Afyonkarahisar) Düğün Salonu Yapım İşi:

İhale Bedeli	: 1.575.000,00-TL
Sözleşme Tarihi	: 27.07.2017
Yer Teslim Tarihi	: 31.07.2017
İş Bitim Tarihi	: 26.06.2018
2017 Yılı Yapılan Harcama	: 801.266,93- TL
Nakdi Gerçekleşme	: % 43
Fiziki Gerçekleşme	: % 47





**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## DEREÇİNE (AFYONKARAHİSAR) DÜĞÜN SALONU YAPIM İŞİ



[www.ilbank.gov.tr](http://www.ilbank.gov.tr)



**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## DEREÇİNE (AFYONKARAHİSAR) DÜĞÜN SALONU YAPIM İŞİ



[www.ilbank.gov.tr](http://www.ilbank.gov.tr)



**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## **ENERJİ SEKTÖRÜNDE;**

Kayıhan (Afyonkarahisar) 180KWE Şebeke  
Bağlantılı Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santrali  
Yapım İşi:

İhale Bedeli	: 972.000,00-TL
Sözleşme Tarihi	: 12.06.2017
Yer Teslim Tarihi	: 14.06.2017
İş Bitim Tarihi	: 12.10.2017
2017 Yılı Yapılan Harcama	: 835.500,29- TL
Nakdi Gerçekleşme	: % 85
Fiziki Gerçekleşme	: % 100

\*Geçici kabul aşamasında

[www.ilbank.gov.tr](http://www.ilbank.gov.tr)





**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## KAYIHAN (AFYONKARAHİSAR) 180KWE GES YAPIM İŞİ



[www.ilbank.gov.tr](http://www.ilbank.gov.tr)



**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## **ENERJİ SEKTÖRÜNDE;**

İhsaniye (Afyonkarahisar) 500KW Gücünde  
Güneş Enerjisi Santrali Yapım İşi:

İhale Bedeli	: 2.058.000,00-TL
Sözleşme Tarihi	: 04.08.2017
Yer Teslim Tarihi	: 17.08.2017
İş Bitim Tarihi	: 15.12.2017
2017 Yılı Yapılan Harcama	: 1.643.653,00- TL
Nakdi Gerçekleşme	: % 80
Fiziki Gerçekleşme	: % 90



**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## İHSANİYE (AFYONKARAHİSAR) 500KW GES YAPIM İŞİ



[www.ilbank.gov.tr](http://www.ilbank.gov.tr)





**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## **ENERJİ SEKTÖRÜNDE;**

Gazlıgöl (Afyonkarahisar) 986kW Gücünde  
Güneş Enerjisi Santrali Yapım İşi:

İhale Bedeli	: 5.200.000,00-TL
Sözleşme Tarihi	: 21.09.2017
Yer Teslim Tarihi	: 26.09.2017
İş Bitim Tarihi	: 03.01.2018
2017 Yılı Yapılan Harcama	: - TL
Nakdi Gerçekleşme	: -
Fiziki Gerçekleşme	: % 95



**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## GAZLIGÖL (AFYONKARAHİSAR) 986kW GES YAPIM İŞİ



[www.ilbank.gov.tr](http://www.ilbank.gov.tr)



**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## **ENERJİ SEKTÖRÜNDE;**

### Çobanlar (Afyonkarahisar) 1000kWe Gücünde Güneş Enerjisi Santrali Yapım İşi:

İhale Bedeli	: 4.278.000,00-TL
Sözleşme Tarihi	: 11.10.2017
Yer Teslim Tarihi	: 17.10.2017
İş Bitim Tarihi	: 29.12.2017
2017 Yılı Yapılan Harcama	: - TL
Nakdi Gerçekleşme	: -
Fiziki Gerçekleşme	: % 90





**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## ÇOBANLAR (AFYONKARAHİSAR) 1000kWe GES YAPIM İŞİ



[www.ilbank.gov.tr](http://www.ilbank.gov.tr)



**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## **ENERJİ SEKTÖRÜNDE;**

Bolvadin (Afyonkarahisar) 980kWe Gücünde  
Şebeke Bağlantılı Fotovoltaik Güneş Enerjisi  
Santrali Yapım İşi:

İhale Bedeli	: 3.969.000,00-TL
Sözleşme Tarihi	: 20.10.2017
Yer Teslim Tarihi	: 23.10.2017
İş Bitim Tarihi	: 09.02.2018
2017 Yılı Yapılan Harcama	: - TL
Nakdi Gerçekleşme	: -
Fiziki Gerçekleşme	: % 95



**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## BOLVADİN (AFYONKARAHİSAR) 980KWE GES YAPIM İŞİ



[www.ilbank.gov.tr](http://www.ilbank.gov.tr)





**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## **PROJE İŞLERİMİZ**

Bankamızca ihale edilen(Kredi-Hibe);

- Sülün İçmesuyu Kesin Projesi 03.01.2017 tarihinde onaylandı.
- Susuz İçmesuyu Kesin Projesi 04.01.2017 tarihinde onaylandı.
- Sinanpaşa İçmesuyu Kesin Projesi 08.02.2017 tarihinde onaylandı.
- Karaadilli İçmesuyu Kesin Projesi 15.02.2017 tarihinde onaylandı.

## **PROJE İŞLERİMİZ**

Bankamızca ihale edilen(Kredi-Hibe);

- Dazkırı İçmesuyu Kesin Projesi 18.05.2017 tarihinde onaylandı.
- Evciler İçmesuyu Kesin Projesi 24.05.2017 tarihinde onaylandı.

## **PROJE İŞLERİMİZ**

Bankamızca ihale edilen(Kredi-Hibe);

- Yaylabağı (Afyonkarahisar) İçmesuyu Kesin Projesi Etap B çalışmaları devam ediyor.
- Değirmenayvalı (Afyonkarahisar) İçmesuyu Kesin Projesi Etap A çalışmaları devam ediyor.
- Düzağaç (Afyonkarahisar) İçmesuyu Kesin Projesi Etap B çalışmaları devam ediyor.
- Büyükkalecik (Afyonkarahisar) İçmesuyu Kesin Projesi Etap A çalışmaları devam ediyor.



## **PROJE İŞLERİMİZ**

Bankamızca ihale edilen(Kredi-Hibe);

- Davulga Atıksu Arıtma Tesisi Kesin Projesi Etap C çalışmaları devam etmektedir.
- Dazkırı Atıksu Arıtma Tesisi Kesin Projesi 05.06.2017 tarihinde onaylandı.
- Akharım Atıksu Arıtma Tesisi Kesin Projesi 16.11.2017 tarihide onaylandı.
- Bayat Atıksu Arıtma Tesisi Kesin Projesi 09.08.2017 tarihinde onaylandı.

## **PROJE İŞLERİMİZ**

Bankamızca ihale edilen(Kredi-Hibe);

- Sülün Kanalizasyon Kesin Projesi 24.05.2017 tarihinde onaylandı.
- Kırka-Kılıçaslan Kanalizasyon Kesin Projesi 24.05.2017 tarihinde onaylandı.
- Serban Paket Atıksu Arıtma Tesisi Projesi 17.11.2017 tarihinde onaylandı.

## **PROJE İŞLERİMİZ**

Bankamızca ihale edilen(Kredi-Hibe);

- Yaylabağı Belediyesi Kültür ve Sanat Evi Projesi 29.11.2017 tarihinde onaylandı.
- Yaylabağı Belediyesi Çok Amaçlı Salon Projesi 01.12.2017 tarihinde onaylandı.





**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## **PROJE İŞLERİMİZ**

Finansman temin çalışmaları devam etmekte olup, finansman temininden sonra ihale edilecek olan onaylanmış projelerimiz (02.01.2018 tarihi itibariyle);

- Dazkırı Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi
- Bayat Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi
- Susuz İçmesuyu Yapım İşi
- Dazkırı İçmesuyu Yapım İşi
- Sülün İçmesuyu Yapım İşi
- Evciler İçmesuyu Yapım İşi
- Kırka-Kılıçaslan Kanalizasyon Yapım İşi
- Karaadilli İçmesuyu Yapım İşi
- Sülün Kanalizasyon Yapım İşi
- Sinanpaşa İçmesuyu Yapım İşi



**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## **İHALE AŞAMASINDAKİ İŞLERİMİZ**

Finansmanı temin edilmiş olup ihale aşamasında olan işlerimiz (02.01.2018 tarihi itibariyle);

- Sülün İçmesuyu İnşaatı (İhale tarihi: 25.10.2017)
- Erkmek İlave İçmesuyu ve Kanalizasyon Şebeke İnşaatı(İhale tarihi: 20.09.2017)
- Gazlıgöl-Yaylabağı-Kayıhan Kanalizasyon Yapım İşİ(İhale tarihi: 30.05.2017)



**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## **İHALE AŞAMASINDAKİ İŞLERİMİZ**

Finansmanı Bankamızca temin edilmiş olup Belediyelerince ihale edilecek işlerimiz (02.01.2018 tarihi itibariyle);

- Salar Belediyesi Hamam (Sağlık Yaşam ve Spor Merkezi) Yapım İşi
- Çıkrık (Afyonkarahisar) Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Kilitli Parke Taş ve Bordür Döşenmesi Yapım İşi





**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

## **HARİTA İŞLERİMİZ**

Bankamızca ihale edilen(Kredi-Hibe);

- Tatarlı İmar Planı İlave+ Revizyon ve İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Rapor
- Haydarlı İlave Halihazır Harita, İmar Planına Esas Jeolojik Etüt ve İmar Planı Yapımı
- Susuz Halihazır Harita ve İmar Planına Esas Jeolojik Çalışma
- Dinar İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Çalışma

## **GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ (GES)** **İŞLERİMİZ**

Belediyesince ihale edilecek sözleşme aşamasındaki işlerimiz;

- Kızılören GES Yapım İşi

Bankamızca ihale edilecek sözleşme aşamasındaki işlerimiz;

- Taşoluk GES Yapım İşi

## YAPIM VE MALZEME, ARAÇ ALIMI KREDİ TALEPLERİ

BELEDİYE	KREDİ TÜRÜ	MİKTAR	AÇIKLAMA
SULTANDAĞI	Yapım (Parke Yol)	4.983.000,00-TL	03.01.2017 tarih ve E.10659 sayılı Makam Oluru ile tahsis edildi.
İHSANİYE	Yapım (Güneş Enerji Santrali)	2.000.000,00-TL	16.01.2017 tarih ve E.147 sayılı yazı ile Yatırım Değerlendirme Dairesi Başkanlığına gönderildi.
BAŞMAKÇI	Yapım (Parke Yol)	1.500.000,00-TL	01.02.2017 tarih ve E.5976 sayılı Makam Oluru ile tahsis edildi.
SALAR	Yapım (Sağlıklı Yaşam ve Spor Merkezi)	500.000,00-TL	08.02.2017 tarih ve E.10911 sayılı Makam Oluru ile tahsis edildi.
BOLVADİN	Yapım (Öğrenci Yurdu)	13.500.000,00-TL	15.02.2017 tarih ve 8/135 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile tahsis edildi.
İŞIKLAR	Yapım (Parke Yol)	2.950.000,00-TL	21.02.2017 tarih ve E.9315 sayılı Makam Oluru ile tahsis edildi.
GEBECELER	Yapım (Asfalt ve Parke Yol)	2.500.000,00-TL	28.02.2017 tarih ve E.569 sayılı yazı ile Yatırım Değerlendirme Dairesi Başkanlığına gönderildi.
GÖMÜ	Yapım (Yol)	767.000,00-TL	01.03.2017 tarih ve E.10862 sayılı Makam Oluru ile tahsis edildi.

## YAPIM VE MALZEME, ARAÇ ALIMI KREDİ TALEPLERİ

BELEDİYE	KREDİ TÜRÜ	MİKTAR	AÇIKLAMA
SÜLÜMENLİ	Yapım (Parke Yol)	1.500.000,00-TL	21.03.2017 tarih ve E.14257 sayılı Makam Oluru ile tahsis edildi.
ÇIKRIK	Yapım (Parke Yol)	450.000,00-TL	24.03.2017 tarih ve E.861 sayılı yazı ile Yatırım Değerlendirme Dairesi Başkanlığına gönderildi.
DEREÇİNE	Yapım (Düğün Salonu)	1.418.554,00-TL	27.03.2017 tarih ve E.14811 sayılı Makam Oluru ile tahsis edildi.
AKHARIM	Yapım (Kültür Merkezi)	1.318.896,00-TL	28.03.2017 tarih ve E.15503 sayılı Makam Oluru ile tahsis edildi.
DAVULGA	Malzeme Alımı (Parke Taşı)	944.000,00-TL	28.03.2017 tarih ve E.15471 sayılı Makam Oluru ile tahsis edildi.
DİŞLİ	Yapım (Parke Yol)	1.580.000,00-TL	28.03.2017 tarih ve E.15515 sayılı Makam Oluru ile tahsis edildi.
ÖZBURUN	Yapım (Parke Yol)	1.500.000,00-TL	28.03.2017 tarih ve E.15481 sayılı Makam Oluru ile tahsis edildi.





**ILBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

# Arz Ederim...

**Murat KARAÇAM**  
Bölge Müdürü

[www.ilbank.gov.tr](http://www.ilbank.gov.tr)
