



2022-2023 YILLARI İLÇE KAMU YATIRIM KARŞILAŞTIRMALARI

İl Yatırım Takip Sistemi (İLYAS)

Doç. Dr. Kübra GÜRAN YİĞİTBAŞI
Vali

2024

İÇİNDEKİLER

| | |
|------------|----|
| Başmakçı | 2 |
| Bayat | 4 |
| Bolvadin | 6 |
| Çay | 9 |
| Çobanlar | 13 |
| Dazkırı | 15 |
| Dinar | 17 |
| Emirdağ | 21 |
| Evciler | 25 |
| Hocalar | 27 |
| İhsaniye | 29 |
| İscehisar | 32 |
| Kızılören | 35 |
| Merkez | 37 |
| Sandıklı | 47 |
| Sinanpaşa | 51 |
| Sultandağı | 55 |
| Şuhut | 57 |

BAŞMAKÇI

2022


Proje Sayısı
15

Proje Tutarı
136.901.369 TL


Yılı Ödeneği
48.309.890 TL

Yılı Harcaması
43.648.397 TL

Fiziki Gerçekleşme

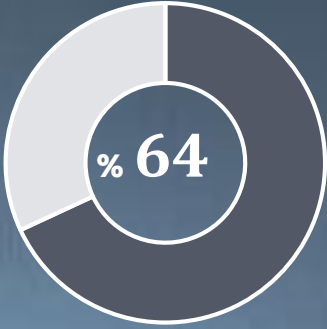

Yılı Harcama Oranı

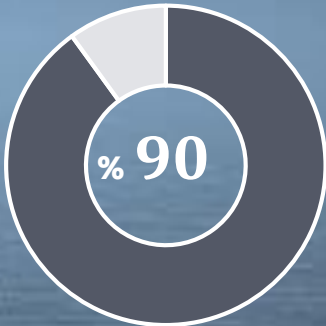

2023


Proje Sayısı
20

Proje Tutarı
212.522.424 TL


Yılı Ödeneği
44.567.132 TL

Yılı Harcaması
34.534.898 TL

Fiziki Gerçekleşme

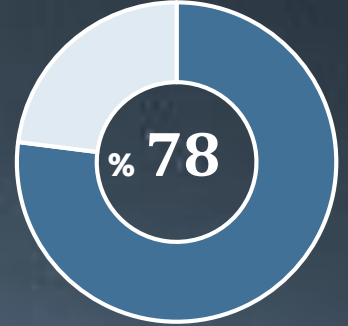

Yılı Harcama Oranı

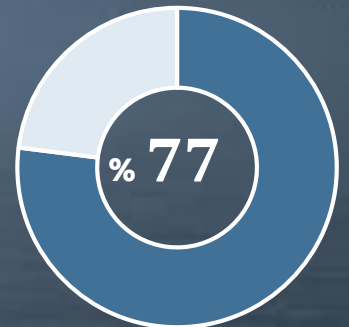

KAMU
YATIRIMLARI



BAŞMAKÇI

2023 YILI KAMU YATIRIMLARI

| Sıra No | Projenin Adı | Kurumu | Projenin Durumu |
|---------|---|---|--------------------|
| 1 | Kapalı Çelik Konstrüksiyonlu Yarı Olimpik Yüzme Havuzu | Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü | Devam Ediyor (%60) |
| 2 | Çöp Toplama Aracı (Başmakçı Belediyesi) | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü | Bitti |
| 3 | Afyonkarahisar-Başmakçı Yaka Göleti Rezervuar Kaplaması | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | Devam Ediyor (%9) |
| 4 | Çığrı Göleti Sulaması | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | Devam Ediyor (%82) |
| 5 | Akkeçili Ortaokulu (Yık-Yap) | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | İhale Aşamasında |
| 6 | Atatürk Ortaokulu (Yık-Yap) | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | İhale Aşamasında |
| 7 | Şehit Öğretmen Birol İrfan Aşkar İlkokulu (Yık-Yap) (TOKİ) (8 Derslik) | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Bitti |
| 8 | 10 Yataklı İlçe Entegre Hastanesi | İl Sağlık Müdürlüğü | Devam Ediyor (% 0) |
| 9 | Çığrı Köyü Stabilize Parke Taşı Yol Yapımı (900 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 10 | Yaka Köyü İçerisinde Stabilize Parke Taşı Yol Yapımı (900 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 11 | Hırka Köyü İçerisinde Stabilize Parke Taşı Yol Yapımı (900 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 12 | Ekinlik Köyü İçerisinde Stabilize Parke Taşı Yol Yapımı (900 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 13 | Ovacık Köyü İçerisinde Stabilize Parke Taşı Yol Yapımı (900 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 14 | Aşağı Beltarla Köyü Stabilize Parke Taşı Dönüşümü (500 Metrekare) | KHGB | Bitti |
| 15 | Küllüce Köyü İçerisinde Stabilize Parke Taşı Yol Yapımı (900 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 16 | Sarıköy Köyü Kollektör Çıkış Hattı Yapımı | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 17 | Aşağı Beltarla Köyü Terfi Binası Yapımı | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 18 | Ovacık Köyü İçme Suyu Sondaj+ENH+Motopop ve Terfi Hattı Yapımı | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 19 | Ekinlik-Akpınar 1.ve2.Kat Asfalt Yapımı (10 km) | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 20 | Mahalle Tipi Gençlik Merkezi | Başmakçı Belediyesi | Bitti |

BAYAT

2022


Proje Sayısı
24

Proje Tutarı
234.432.421 TL


Yılı Ödeneği
35.974.885 TL

Yılı Harcaması
11.638.279 TL

Fiziki Gerçekleşme

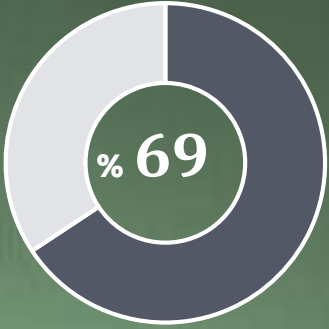

Yılı Harcama Oranı

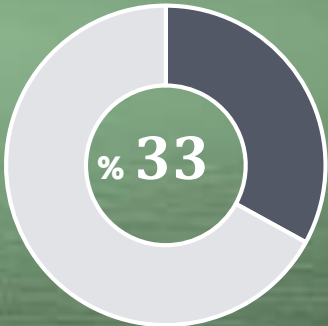

2023


Proje Sayısı
16

Proje Tutarı
298.724.622 TL

Yılı Ödeneği
235.385.434 TL

Yılı Harcaması
237.113.849 TL

Fiziki Gerçekleşme

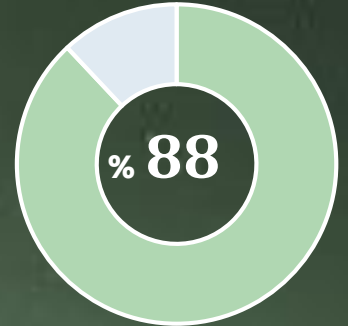

Yılı Harcama Oranı



KAMU
YATIRIMLARI



BAYAT

2023 YILI KAMU YATIRIMLARI

| Sıra No | Projenin Adı | Kurumu | Projenin Durumu |
|---------|--|-------------------------|--------------------|
| 1 | Derbent Köy İçi Yol Yapımı (3.037 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 2 | Eskigözü Köy Yolu Yapımı (1004 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 3 | Çukurkuyu Köy İçi Yol Yapımı (720 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 4 | Aşağı Çaybelen Köy İçi Yol Yapımı (1.246 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 5 | İmrallı Köyü İçme Suyu Depo Bakım Onarımı | KHGB | Bitti |
| 6 | Akpınar Köyü Terfi Binası Onarımı | KHGB | Bitti |
| 7 | Asarcık Topplulaştırma Yolu ve Sanat Yapıları | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | Devam Ediyor (% 0) |
| 8 | Asarcık Göleti Sulaması Yenilemesi Malzeme Temini (HDPE) | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | Bitti |
| 9 | Asarcık Göleti Sulaması Yenilemesi Malzeme Temini (Çelik Boru) | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | Bitti |
| 10 | Asarcık Göleti Sulaması Yenilemesi | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | Devam Ediyor (%92) |
| 11 | Derbent Köyü Kanalizasyon Kısmi Yenileme ve İnpınar Köyü Su Hattı Yerinin Değiştirilmesi (Püermanet) | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 12 | Muratkoru Köyü Hat Yenilemesi | İl Özel İdaresi | Devam Ediyor (% 0) |
| 13 | Çukurkuyu Yeni Sondaj Kuyusu Açılması | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 14 | Yukarı Çaybelen Köyü İlave Şebeke+Memba Bakımı (Püermanet) | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 15 | Derbent Grup Yolu BSK Asfalt Yapımı (10 km) | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 16 | Gençlik ve Spor Merkezi | Bayat Belediyesi | Bitti |

BOLVADİN

2022

Proje Sayısı
60

Proje Tutarı
325.435.507 TL

Yılı Ödeneği
148.354.862 TL

Yılı Harcaması
71.068.876 TL

KAMU
YATIRIMLARI



2023


Proje Sayısı
41

Proje Tutarı
1.046.331.631 TL


Yılı Ödeneği
483.958.360 TL

Yılı Harcaması
402.629.247 TL


Fiziki Gerçekleşme

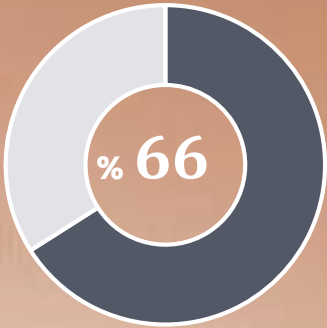


Fiziki Gerçekleşme

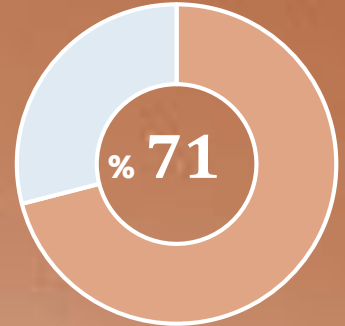

Yılı Harcama Oranı

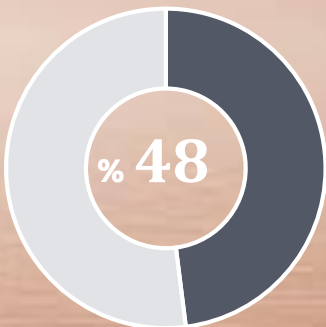

Yılı Harcama Oranı

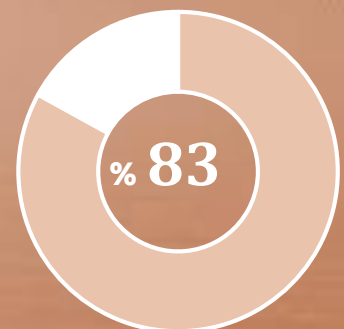

BOLVADİN

2023 YILI KAMU YATIRIMLARI

| Sıra No | Projenin Adı | Kurumu | Projenin Durumu |
|---------|---|--|----------------------|
| 1 | Kentsel Yenileme Sınırları İçerisinde 1919 Ada 2 Parselde İnşaat Yapımı | İller Bankası Eskişehir Bölge Md. | Devam Ediyor (% 100) |
| 2 | Kentsel Yenileme Sınırları İçerisinde 927 Ada 3 Parselde İnşaat Yapımı | İller Bankası Eskişehir Bölge Md. | Devam Ediyor (% 41) |
| 3 | Özburun Tekstil Fabrikası Ek Bina Malzeme Alımı | İller Bankası Eskişehir Bölge Md. | Bitti |
| 4 | Güneş Enerji Santrali Yapımı | İller Bankası Eskişehir Bölge Md. | Bitti |
| 5 | Kemerkaya Köy İç Kilitli Parke Taşı Döşemesi (2.549 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 6 | Büyükkarabağ Köy İç Kilitli Parke Taşı Döşemesi (1.511 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 7 | Derekarabağ Köy İç Kilitli Parke Taşı Döşemesi (1.808 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 8 | Karayokuş Köy İç Kilitli Parke Taşı Döşemesi (1.112 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 9 | Kurucuova Köy İç Kilitli Parke Taşı Döşemesi (1.077 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 10 | Nusratlı Köy İç Kilitli Parke Taşı Döşeme Yapımı (409 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 11 | Yörükkaracaören Köyü Kilitli Parke Taşı Döşeme (404 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 12 | Taşlıdere Nusratlı Köyü Kilitli Parke Taşı Döşemesi (437 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 13 | Hamidiye Köyü Kilitli Parke Taşı Döşemesi (610 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 14 | Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santrali | Bolvadin Belediyesi | Bitti |
| 15 | Horan Bilim ve Uzay Gözlem Evi İçin Ekipman Alımı | Bolvadin Belediyesi | Devam Ediyor (% 18) |
| 16 | Horan Bilim ve Uzay Gözlem Evi | Bolvadin Belediyesi | Devam Ediyor (% 0) |
| 17 | Gençlik Merkezi | Bolvadin Belediyesi | Devam Ediyor (%86) |
| 18 | Özel Poje Alanı-1 Uygulama Projelerinin Hazırlanması | Bolvadin Belediyesi | Bitti |
| 19 | İçme Suyu Altyapısı Kesin Projelerinin Hazırlanması | Bolvadin Belediyesi | Bitti |
| 20 | Bolvadin Trafo Merkezi | TEİAŞ 7. Bölge Müdürlüğü | Devam Ediyor |
| 21 | Yeşil Enerji Tesis Kurulumu | Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü | Devam Ediyor (% 0) |

BOLVADİN

2023 YILI KAMU YATIRIMLARI

| Sıra No | Projenin Adı | Kurumu | Projenin Durumu |
|---------|---|------------------------------------|----------------------|
| 22 | Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı | Alkaloidleri Fabrikası İşletme Md. | Devam Ediyor (% 96) |
| 23 | AAF Rehabilitasyonu | Alkaloidleri Fabrikası İşletme Md. | Bitti |
| 24 | Su Soğutma Kulesi Yenileme | Alkaloidleri Fabrikası İşletme Md. | Bitti |
| 25 | Haşhaş Tohumluğu Eleme Renk Ayırma Ünitesi | Alkaloidleri Fabrikası İşletme Md. | Bitti |
| 26 | Jeneratör Alımı (2 adet 1250 KVA) | Alkaloidleri Fabrikası İşletme Md. | Bitti |
| 27 | Güneş Enerji Santral Kurulumu | Alkaloidleri Fabrikası İşletme Md. | Bitti |
| 28 | Gazi Spor Salonu (Çok Amaçlı Salon) | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Devam Ediyor (% 80) |
| 29 | Ethem Kelekçi Anaokulu Yapımı | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Devam Ediyor (% 60) |
| 30 | YAS Sulamaları GES Kurulumu (Hibe) | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | Devam Ediyor (% 0) |
| 31 | Kocadere Deresi'nin Dere Yatağının ve Sanat Yapılarının Düzenlenmesi (İRAP) | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | Projeye Başlanmadı |
| 32 | Kocadere Deresi'nin Yakup Şevki Paşa Mahallesi Dere Yatağı ve Sanat Yapıları Düzenlemesi (İRAP) | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | Projeye Başlanmadı |
| 33 | Karayokuş Köyü Taşkın Koruması | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | İhale Aşamasında |
| 34 | İlçe Merkezi 1. Kısım Taşkın Koruması | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | İhale Aşamasında |
| 35 | Dipevler Köyü Taşkın Koruması | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | Devam Ediyor (% 100) |
| 36 | Afyonkarahisar-Akarçay Havzası Bolvadin Dişli-Özburun Atıksu Arıtma Tesisi | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | İhale Aşamasında |
| 37 | Yörükkaracaören Köyü Camii Restorasyonu Proje Temini | Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü | Bitti |
| 38 | 75 Yataklı Devlet Hastanesi | İl Sağlık Müdürlüğü | Devam Ediyor (% 0) |
| 39 | Güney Köyü İçmesuyu Deposu Tamirâtı ve Terfi Hattı Yapımı (Püremant) | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 40 | 1.Etap Çay Barajı İsale Hattından İçme Suyu Bağlantısı Yapılması | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 41 | Kurucaova-Ortakarabağ-Büyükkarabağ-Derekarabağ Köyü BSK Yol Yapımı | İl Özel İdaresi | Bitti |

ÇAY

2022


Proje Sayısı
67

Proje Tutarı
568.112.557 TL


Yılı Ödeneği
118.909.923 TL

Yılı Harcaması
67.869.038 TL

Fiziki Gerçekleşme

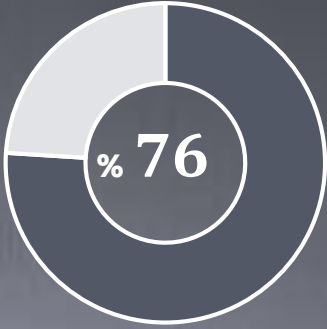

Yılı Harcama Oranı

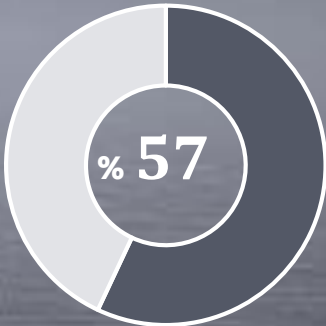

2023


Proje Sayısı
58

Proje Tutarı
879.258.287 TL


Yılı Ödeneği
328.016.260 TL

Yılı Harcaması
449.071.116 TL

Fiziki Gerçekleşme

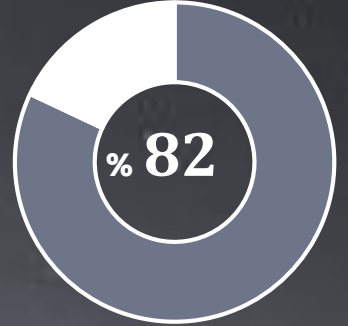

Yılı Harcama Oranı

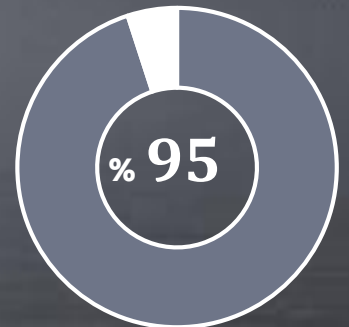

KAMU
YATIRIMLARI



ÇAY

2023 YILI KAMU YATIRIMLARI

| Sıra No | Projenin Adı | Kurumu | Projenin Durumu |
|---------|--|-----------------------------------|---------------------|
| 1 | Hacer Deresi'nin İlçe Merkezi'nden Geçen Kısımlarında Dere Yatağı ve Sanat Yapılarının Düzenlenmesi (İRAP) | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | Projeye Başlanmadı |
| 2 | Karamık Göleti ve Sulaması İkmali | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | Bitti |
| 3 | Karamık Göleti Su Kaçaklarının Önlenmesi | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | İhale Aşamasında |
| 4 | Çay İçmesuyu Deposu | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | Bitti |
| 5 | Selevir Sulaması Yenileme 3. Kısım | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | İhale Aşamasında |
| 6 | Selevir Sulaması Yenileme 2. Kısım | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | Bitti |
| 7 | Selevir Sulaması Yenileme | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | Bitti |
| 8 | Çay (Seka) Trafo Merkezi Tevsiyat Şalt ve Kumanda Binası Yenileme | TEİAŞ 7. Bölge Müdürlüğü | İhale Aşamasında |
| 9 | Karamıkkaracaören Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebeke Kesin Projesi Yapımı | İller Bankası Eskişehir Bölge Md. | Bitti |
| 10 | Kilitli Parke Taşı ve Muhtelif Yol Yapım Malzemesi Alımı | İller Bankası Eskişehir Bölge Md. | Bitti |
| 11 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | İhale Aşamasında |
| 12 | Çay Anaokulu (TOBB) (Hayırsever) | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | İhale Aşamasında |
| 13 | Şehit Ahmet Şahin MTAL | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Devam Ediyor (% 80) |
| 14 | Koçbeyli İlkokulu (Yık-Yap) | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Bitti |
| 15 | Pazarağaç İlkokulu (Yık-Yap (TOKİ) (8 Derslik) | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Bitti |
| 16 | Çağlayan İlkokulu (Yık-Yap) (TOKİ) (12 Derslik) | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Bitti |
| 17 | Karamık Ortaokulu (4 Derslik) (Yık-Yap) | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Bitti |
| 18 | İnli İlkokulu (4 Derslik) (Yık Yap) | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Bitti |
| 19 | Çay Taş Camii Restorasyonu | Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü | Bitti |
| 20 | Toprak Muhafaza Tesis | Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü | Bitti |
| 21 | Hacer Deresi Afyon-Konya Yolu Kesişim Yol Geçişinin Düzenlenmesi (İRAP) | Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü | Devam Ediyor (% 50) |

ÇAY

2023 YILI KAMU YATIRIMLARI

| Sıra No | Projenin Adı | Kurumu | Projenin Durumu |
|---------|--|----------------------|------------------|
| 22 | Yeşilyurt Köy İçi Stabilize Parke Taşı Yol Yapımı (525 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 23 | Pınarkaya Köy İçi Stabilize Parke Taşı Yol Yapımı (525 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 24 | Orhaniye Köy İçi Stabilize Parke Taşı Yol Yapımı (525 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 25 | Maltepe Köy İçi Stabilize Parke Taşı Yol Yapımı (525 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 26 | Koçbeyli Köy İçi Stabilize Parke Taşı Yol Yapımı (525 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 27 | Kılıçkaya Köy İçi Stabilize Parke Taşı Yol Yapımı (525 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 28 | Karamık Köy İçi Stabilize Parke Taşı Yol Yapımı (525 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 29 | Kadıköy Köy İçi Stabilize Parke Taşı Yol Yapımı (525 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 30 | İnli Köy İçi Stabilize Parke Taşı Yol Yapımı (525 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 31 | Göçen Köy İçi Stabilize Parke Taşı Yol Yapımı (525 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 32 | Eber Köy İçi Stabilize Parke Taşı Yol Yapımı (525 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 33 | Devederesi Köy İçi Stabilize Parke Taşı Yol Yapımı (525 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 34 | Deresinek Köy İçi Stabilize Parke Taşı Yol Yapımı (525 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 35 | Çayıryazı Köy İçi Stabilize Parke Taşı Yol Yapımı (525 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 36 | Çayırpınar Köy İçi Stabilize Parke Taşı Yol Yapımı (525 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 37 | Cumhuriyet Köy İçi Stabilize Parke Taşı Yol Yapımı (525 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 38 | Bulanık Köy İçi Stabilize Parke Taşı Yol Yapımı (525 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 39 | Aydoğmuş Köy İçi Stabilize Parke Taşı Yol Yapımı (525 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 40 | Armutlu Köy İçi Stabilize Parke Taşı Yol Yapımı (525 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 41 | Akkonak Köyü Stabilize Parke Taşı Dönüşümü (525 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 42 | Kaymakam Lojmanı İkmal İnşaatı | KHGB | Bitti |
| 43 | Çay İlçe Emniyet Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası | İl Emniyet Müdürlüğü | İhale Aşamasında |

ÇAY

2023 YILI KAMU YATIRIMLARI

| Sıra No | Projenin Adı | Kurumu | Projenin Durumu |
|---------|--|-----------------------------|--------------------------|
| 44 | Koçbeyli Kanalizasyon İlave Şebeke Yapımı | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 45 | Eber Köyü Kanalizasyon Kısmi Yenileme Yapımı (Püermanet) | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 46 | Akkonak Köyü Kanalizasyon İlave Şebeke Yapımı | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 47 | Çay Barajı İsale Hattından İçme Suyu Bağlantısı Yapılması | İl Özel İdaresi | Devam Ediyor (% 0) |
| 48 | Karacaören-İnli Grup Yolu ve Çayırağası BSK Asfalt Yapımı (14km) | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 49 | Karamık Köyü Kanalizasyon Kısmi Yenileme ve Yeşilyurt Kanalizasyon Şebekesi Bakımı (Püermanet) | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 50 | Armutlu Köyü Yörük Grubu İçme Suyu Hattı Bağlantısı Yapımı | İl Özel İdaresi | Devam Ediyor (% 40) |
| 51 | Adliye Binası Çatı Onarımı | Çay Cumhuriyet Başsavcılığı | Bitti |
| 52 | Düğün Salonu Yapımı | Çay Belediyesi | Devam Ediyor (% 50) |
| 53 | Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) | Çay Belediyesi | Bitti |
| 54 | 500 Seyirci Kapasiteli Spor Salonu | Çay Belediyesi | Devam Ediyor (%73) |
| 55 | Millet Parkı Yapımı (Belediye Kaynaklı) | Çay Belediyesi | Devam Ediyor (% 94) |
| 56 | Yol ve Trevatuar Yapımı | Çay Belediyesi | Bitti |
| 57 | İçmesuyu Hattı Yapımı | Çay Belediyesi | Bitti |
| 58 | Kanalizasyon Hattı Yapımı | Çay Belediyesi | Bitti |

ÇOBANLAR

2022

Proje Sayısı
23

Proje Tutarı
210.998.644 TL

Yılı Ödeneği
88.710.780 TL

Yılı Harcaması
76.608.206 TL

KAMU
YATIRIMLARI



2023


Proje Sayısı
20

Proje Tutarı
255.045.535 TL


Yılı Ödeneği
121.703.566 TL

Yılı Harcaması
102.809.321 TL


Fiziki Gerçekleşme

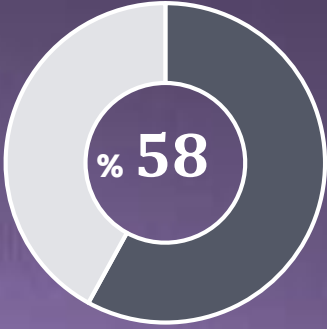


Fiziki Gerçekleşme

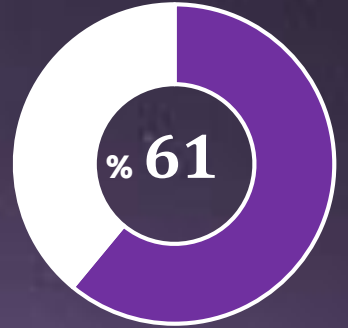

Yılı Harcama Oranı

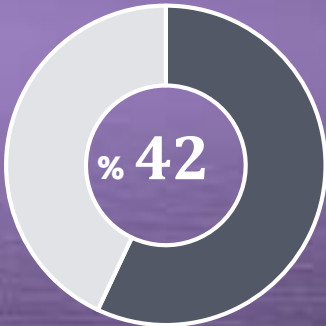

Yılı Harcama Oranı

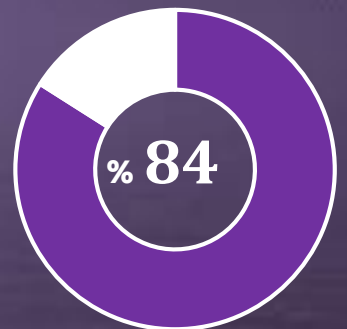

ÇOBANLAR

2023 YILI KAMU YATIRIMLARI

| Sıra No | Projenin Adı | Kurumu | Projenin Durumu |
|---------|--|-----------------------------------|---------------------|
| 1 | Basketbol-Voleybol Sahası | Çobanlar Belediyesi | İhale Aşamasında |
| 2 | Kapalı Sentetik Çim Yüzeyle Futbol Sahası | Çobanlar Belediyesi | İhale Aşamasında |
| 3 | Mahalle Tipi Gençlik Merkezi | Çobanlar Belediyesi | Bitti |
| 4 | Seyitler Sulaması Yenileme | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | Bitti |
| 5 | Seyitler Sulaması Yenileme 2. Kısım | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | Bitti |
| 6 | Kapalı Çelik Konstrüksiyonlu Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (Çobanlar) | Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü | Devam Ediyor (% 70) |
| 7 | Altyapı ve Yol Yapımı | İller Bankası Eskişehir Bölge Md. | Bitti |
| 8 | Kocaöz Beton Parke Taş İle Yol Yapımı | İller Bankası Eskişehir Bölge Md. | Bitti |
| 9 | Meydan Tadilatı ve Tamiratı Yapımı | İller Bankası Eskişehir Bölge Md. | Devam Ediyor |
| 10 | Akkoyunlu Köyü Anaokulu | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | İhale Aşamasında |
| 11 | Çobanlar Ortaokulu Deprem Güçlendirmesi | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Projeye Başlanmadı |
| 12 | Kocaöz İlkokulu (8 Derslik) | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Devam Ediyor (% 50) |
| 13 | Zafer İlkokulu (Yık-Yap) | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Devam Ediyor (%60) |
| 14 | Göynük Köyü İlave Kanalizasyon Yapımı | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Bitti |
| 15 | Çobanlar 10 Yataklı Entegre İlçe Hastanesi + İlçe Sağlık Müdürlüğü + 112 Aile Sağlığı Hizmetleri | İl Sağlık Müdürlüğü | Devam Ediyor |
| 16 | Akkoyunlu Köyü Kilitli Beton Parke Yapımı (300 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 17 | Göynük Köyü Kilitli Beton Parke Yapımı (600 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 18 | Kale Köyü Kilitli Beton Parke Yapımı (600 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 19 | Kale Köyü İlave Kanalizasyon Yapımı | KHGB | Bitti |
| 20 | Göynük Köyü İçmesuyu İlave Şebeke Yapımı | KHGB | Bitti |

DAZKIRI

2022

Proje Sayısı
25

Proje Tutarı
204.261.467 TL

Yılı Ödeneği
35.759.869 TL

Yılı Harcaması
32.925.245 TL

KAMU
YATIRIMLARI



2023


Proje Sayısı
21

Proje Tutarı
464.626.728 TL


Yılı Ödeneği
121.121.581 TL

Yılı Harcaması
121.121.574 TL


Fiziki Gerçekleşme

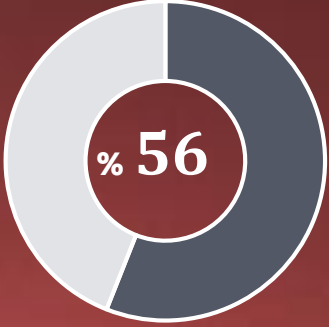

Fiziki Gerçekleşme

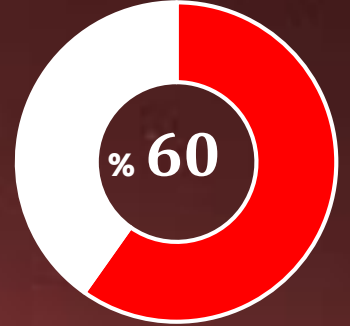

Yılı Harcama Oranı

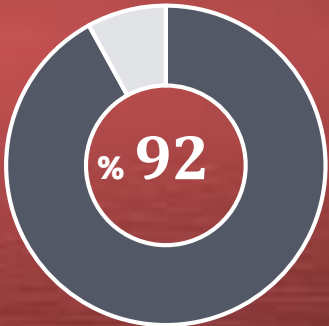

Yılı Harcama Oranı



DAZKIRI

2023 YILI KAMU YATIRIMLARI

| Sıra No | Projenin Adı | Kurumu | Projenin Durumu |
|---------|--|-----------------------------------|--------------------|
| 1 | İçmesuyu Altyapı İnşaatı | İller Bankası Eskişehir Bölge Md. | Bitti |
| 2 | Hisaralan Köyü İçme Suyu Tesisleri Güneş Enerji Sistemi | KHGB | Bitti |
| 3 | İdris Köyü İçme Suyu Tesisleri Güneş Enerji Sistemi | KHGB | Bitti |
| 4 | Dazkırı Dokuma ve Konfeksiyon OSB Altyapı Çalışmaları | Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü | Devam Ediyor |
| 5 | Sathi ve Sıcak Asfalt Kaplama | Dazkırı Belediyesi | Bitti |
| 6 | Öğrenci Konuk Evi | Dazkırı Belediyesi | Bitti |
| 7 | Dazkırı Çeşme Deresi'nin Vehbi Koç Sanayi Bölgesi Kısımlarında Dere Yatağı ve Sanat Yapılarının Düzenlenmesi (İRAP) | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | Projeye Başlanmadı |
| 8 | Dazkırı Yelibelen Deresi'nin Barbaros Mahallesi'nden Geçen Kısımlarında Dere Yatağı ve Sanat Yapıları Düzenlemesi (İRAP) | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | Projeye Başlanmadı |
| 9 | Hisaralan Göleti | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | Devam Ediyor |
| 10 | Hasandede Göleti Rezervuar Kaplaması | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | İhale Aşamasında |
| 11 | Çiftlik Göleti | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | Bitti |
| 12 | Çiftlik Göleti Sulaması | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | Bitti |
| 13 | Bozan 1. Kısım YAS Sulama Şebekesi | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | İhale Aşamasında |
| 14 | Dazkırı (Bozkurt-Dinar) Enerji İletim Hattı | TEİAŞ 7. Bölge Müdürlüğü | Devam Ediyor |
| 15 | Dazkırı Trafo Merkezi | TEİAŞ 7. Bölge Müdürlüğü | Devam Ediyor |
| 16 | Dazkırı Gar ve Hangar Binası Güçlendirme Yapımı | TCDD 7. Bölge Müdürlüğü | Bitti |
| 17 | Darıcalar Köyü Foseptik Yapımı | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 18 | A.Yenice Köyü Kısmi Kanalizasyon Yenileme Yapımı (Püremanet) | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 19 | Karaağaç Kuyusu Köyü Depo İnş Hattı Yapımı | İl Özel İdaresi | Devam Ediyor |
| 20 | Yayla (Grup) Köyü Yeni Sondaj Kuyusu Açılması | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 21 | Yukarıyenice-İdris-Yayla Grup Yolu 1.ve 2.Kat Asfalt Yapımı (11km) | İl Özel İdaresi | Bitti |

DİNAR

2022


Proje Sayısı
89

Proje Tutarı
508.181.311 TL


Yılı Ödeneği
125.714.400 TL

Yılı Harcaması
66.624.771 TL

Fiziki Gerçekleşme

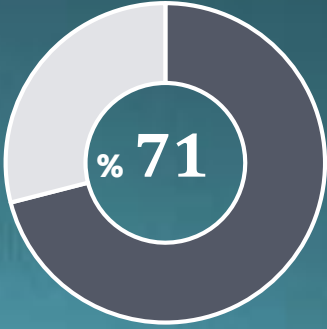

Yılı Harcama Oranı

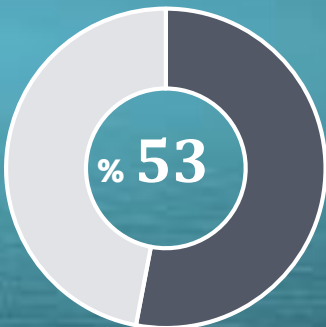

2023


Proje Sayısı
64

Proje Tutarı
770.240.596 TL


Yılı Ödeneği
100.848.567 TL

Yılı Harcaması
88.834.398 TL

Fiziki Gerçekleşme

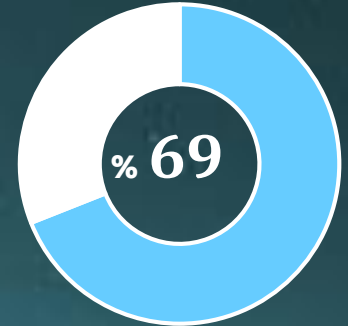

Yılı Harcama Oranı

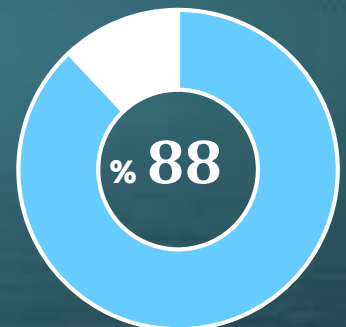

KAMU
YATIRIMLARI



DİNAR

2023 YILI KAMU YATIRIMLARI

| Sıra No | Projenin Adı | Kurumu | Projenin Durumu |
|---------|---|---|------------------|
| 1 | Gençali Köyü İçmesuyu Tesisleri Güneş Enerji Sistemi | KHGB | Bitti |
| 2 | Burunkaya Köyü İçmesuyu Tesisleri Güneş Enerji Sistemi | KHGB | Bitti |
| 3 | Aktoprak Köyü İçmesuyu Tesisleri Güneş Enerji Sistemi | KHGB | Bitti |
| 4 | Bademli Köyü İçmesuyu Tesisleri Güneş Enerji Sistemi | KHGB | Bitti |
| 5 | Çakıcı Köyü İçmesuyu Tesisleri Güneş Enerji Sistemi | KHGB | Bitti |
| 6 | Kadılar Köyü İçmesuyu Tesisleri Güneş Enerji Sistemi | KHGB | Bitti |
| 7 | Yapağlı Köyü İçmesuyu Tesisleri Güneş Enerji Sistemi | KHGB | Bitti |
| 8 | Uluköy Köyü İçmesuyu Tesisleri Güneş Enerji Sistemi | KHGB | Bitti |
| 9 | Doğanlı Köyü Beton Parke Yol Yapımı (1.000 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 10 | Yüksel Köyü Beton Parke Yol Yapımı (1.000 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 11 | Çapalı Köyü Beton Parke Yol Yapımı (1.000 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 12 | Bülüçalan Köyü Beton Parke Yol Yapımı (1.000 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 13 | Dezenfeksiyon Sistemi Kurulumu (16 Köy) | KHGB | Bitti |
| 14 | Gençlik Merkezi Yapımı | Dinar Belediyesi | İhale Aşamasında |
| 15 | Sentetik Çim Yüzeyle Futbol Sahası | Dinar Belediyesi | İhale Aşamasında |
| 16 | Spor Salonunun Bakım Onarımı | Dinar Belediyesi | İhale Aşamasında |
| 17 | Sentetik Çim Yüzeyle Futbol Sahasına Dönüştürülmesi | Dinar Belediyesi | İhale Aşamasında |
| 18 | Tip Yarı Olimpik Yüzme Havuzu | Dinar Belediyesi | İhale Aşamasında |
| 19 | Tabiat Parkları | Tarım ve Orman Bak. 5. Bölge Md. | Devam Ediyor |
| 20 | Kapalı Pazaryeri 2. Etap Yapımı | İller Bankası Eskişehir Bölge Md. | İhale Aşamasında |
| 21 | Millet Bahçesine Beton Parke Taş İle Yol Yapımı | İller Bankası Eskişehir Bölge Md. | Bitti |
| 22 | Kapalı Pazaryeri 1. Etap Yapımı | İller Bankası Eskişehir Bölge Md. | Bitti |
| 23 | Güneş Enerji Santrali Yapımı | İller Bankası Eskişehir Bölge Md. | Bitti |
| 24 | Çöp Toplama Aracı+Çöp Konteyneri (Tatarlı Belediyesi) | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü | Bitti |

DİNAR

2023 YILI KAMU YATIRIMLARI

| Sıra No | Projenin Adı | Kurumu | Projenin Durumu |
|---------|---|---------------------------|------------------|
| 25 | Yıprak Göleti Membran Üstü Beton Kaplanması | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | İhale Aşamasında |
| 26 | Pınarlı Göleti Sulaması Yenilemesi | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | Bitti |
| 27 | Tekin 2. Kısım YAS | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | İhale Aşamasında |
| 28 | Sütlaç YAS Sulama Şebekesi | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | Bitti |
| 29 | Doğanlı 5. Kısım YAS | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | Devam Ediyor |
| 30 | Çakıcı 1. YAS Sulama Şebekesi | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | İhale Aşamasında |
| 31 | Bademli 1. Kısım YAS | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | Devam Ediyor |
| 32 | Yıprak Kınık Köyleri 1. Kısım | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | Devam Ediyor |
| 33 | Çiçektepe Köyü 2.Kısım Taşkın Koruması | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | İhale Aşamasında |
| 34 | Çapalı Köyü Taşkın Koruması | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | İhale Aşamasında |
| 35 | Büyük Menderes Nehri 2.Kısım Taşkın Koruması | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | Devam Ediyor |
| 36 | Karakuyu (Dombay) Pompaj Sulaması Yenileme 1. Kısım | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | İhale Aşamasında |
| 37 | Çölovası Kapalı Havza Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | Bitti |
| 38 | Dinar MTAL (Yık-Yap) (TOKİ) (Atölye) | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Devam Ediyor |
| 39 | Dinar İmam Hatip Ortaokulu (Yık-Yap) (TOBB-Hayırsever+Bakanlık Katkılı) | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Devam Ediyor |
| 40 | Tatarlı Cumhuriyet İlkokulu (Yık-Yap) (TOKİ) (4 Derslik) | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Bitti |
| 41 | Dinar Anadolu Lisesi Deprem Güçlendirmesi | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Bitti |
| 42 | Tatarlı İmam Hatip Ortaokulu (Yık-Yap) | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | İhale Aşamasında |
| 43 | Tatarlı Sağlık Merkezi | İl Sağlık Müdürlüğü | İhale Aşamasında |

DİNAR

2023 YILI KAMU YATIRIMLARI

| Sıra No | Projenin Adı | Kurumu | Projenin Durumu |
|---------|--|----------------------|------------------|
| 44 | Dinar Bölge Trafik İstasyon Amirliği Yeni Hizmet Binası | İl Emniyet Müdürlüğü | İhale Aşamasında |
| 45 | Yıprak, Yüksel ve Göçerli Köyleri Kanalizasyon Kısmi Yenileme Yapımı (Püermanet) | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 46 | Çiçektepe Köyü Kollektör Hattı Yapımı | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 47 | Çapalı Köyü Kanalizasyon İlave Şebeke Hattı | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 48 | Kınık Köyü İlave Şebeke Hattı Yapımı | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 49 | Okçular Köyü Kanalizasyon İlave Şebeke Hattı Yapımı | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 50 | Dikici Köyü İlave Şebeke Hattı Yapımı | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 51 | Göçerli ve Dumanlı Köyleri İçme Suyu Deposunun Bakım ve Onarımı (Püermanet) | İl Özel İdaresi | Devam Ediyor |
| 52 | Çobansaray Köyü Yeni Sondaj Kuyusu Açılması (2022) | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 53 | Çayüstü Köyü Terfi Binası Yapımı | İl Özel İdaresi | Devam Ediyor |
| 54 | Cerit Yaylası Köyü ENH+Motopomp+Terfi Hattı Yapımı | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 55 | Bademli Köyü Terfi Hattı Kısmi Yenileme | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 56 | Doğanlı Köyü Terfi Hattı Yenileme | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 57 | Avdan Köyü GES+Motopomp+Terfi Hattı Yapımı | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 58 | Çakıcı Köyü Terfi Binası Yapımı | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 59 | Akgün Köyü Depo İnşaatı İşi Hattı Güzergah Değişikliği (Püermanet) | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 60 | Tekin Köyü İçmesuyu İlave Şebeke Yenilemesi (Püermanet) | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 61 | Akpınar Köyü Memha İsale Hatı Yenilemesi (Püermanet) | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 62 | Körpeli Köyü İsale Hattı Yenileme (Püermanet) | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 63 | Yüksel Köyü Terfi Binası Yenilemesi | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 64 | Akgün Köyü BSK Asfalt Yapımı (1 km) | İl Özel İdaresi | Bitti |

EMİRDAĞ

2022

Proje Sayısı
78

Proje Tutarı
271.204.545 TL

Yılı Ödeneği
162.612.083 TL

Yılı Harcaması
97.801.786 TL

KAMU
YATIRIMLARI



2023


Proje Sayısı
73

Proje Tutarı
903.584.494 TL


Yılı Ödeneği
388.821.939 TL

Yılı Harcaması
364.566.116 TL


Fiziki Gerçekleşme

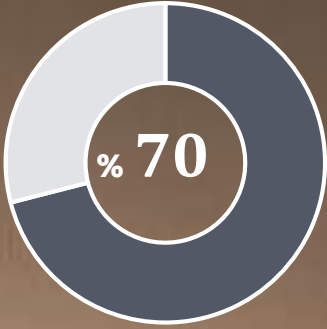


Fiziki Gerçekleşme

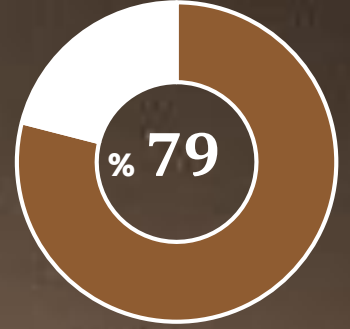

Yılı Harcama Oranı

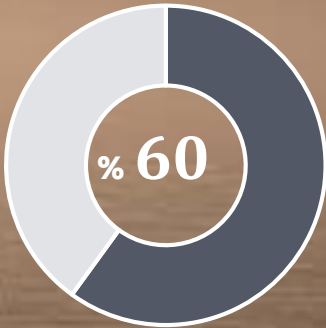

Yılı Harcama Oranı

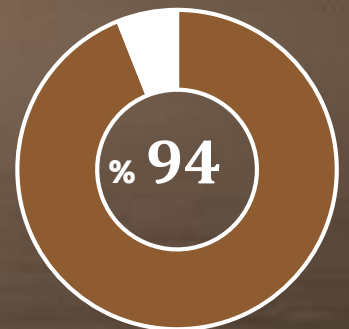

EMİRDAĞ

2023 YILI KAMU YATIRIMLARI

| Sıra No | Projenin Adı | Kurumu | Projenin Durumu |
|---------|---|-----------------------------------|------------------|
| 1 | Çatallı Köyü İçme Suyu Tesisleri Güneş Enerji Sistemi | KHGB | Bitti |
| 2 | Türkmen Köyü İçme Suyu Tesisleri Güneş Enerji Sistemi | KHGB | Bitti |
| 3 | Yukarı Kurudere Köyü İçme Suyu Tesisleri Güneş Enerji Sistemi | KHGB | Bitti |
| 4 | Tezköy Köyü İçme Suyu Tesisleri Güneş Enerji Sistemi | KHGB | Bitti |
| 5 | Yeniköy Köyü İçme Suyu Tesisleri Güneş Enerji Sistemi | KHGB | Bitti |
| 6 | Yenikapı Köyü İçme Suyu Tesisleri Güneş Enerji Sistemi | KHGB | Bitti |
| 7 | Başkonak Köyü İçme Suyu Tesisleri Güneş Enerji Sistemi | KHGB | Bitti |
| 8 | Güveçci Köyü İçme Suyu Tesisleri Güneş Enerji Sistemi | KHGB | Bitti |
| 9 | Çaykışla Köyü İçme Suyu Tesisleri Güneş Enerji Sistemi | KHGB | Bitti |
| 10 | Yüreğil Köyü İçme Suyu Tesisleri Güneş Enerji Sistemi | KHGB | Bitti |
| 11 | Aşağıpiribeyli Köyü İçme Suyu Tesisleri Güneş Enerji Sistemi | KHGB | Bitti |
| 12 | Adayazı Köyü İçme Suyu Tesisleri Güneş Enerji Sistemi | KHGB | Bitti |
| 13 | Demircili Köyü İçme Suyu Tesisleri Güneş Enerji Sistemi | KHGB | Bitti |
| 14 | Emirdağ 2 Trafo Merkezi (Toklucak) | TEİAŞ 7. Bölge Müdürlüğü | İhale Aşamasında |
| 15 | Toklucak-(Emirdağ-Sivrihisar) Elektrik İletim Hattı | TEİAŞ 7. Bölge Müdürlüğü | İhale Aşamasında |
| 16 | Emirdağ (Afyonkarahisar) İçmesuyu Boru Alımı | İller Bankası Eskişehir Bölge Md. | İhale Aşamasında |
| 17 | Beton Parke Taş ve Bordür Döşenmesi | İller Bankası Eskişehir Bölge Md. | Devam Ediyor |
| 18 | Beton Parke Taş ve Sıcak Asfalt İle Yol Yapımı-1 | İller Bankası Eskişehir Bölge Md. | Devam Ediyor |
| 19 | Beton Parke Taş ve Sıcak Asfalt İle Yol Yapımı-2 | İller Bankası Eskişehir Bölge Md. | Devam Ediyor |
| 20 | Millet Bahçesi | İller Bankası Eskişehir Bölge Md. | Bitti |
| 21 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (24 Derslik-1 Atölye) | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | İhale Aşamasında |
| 22 | Emirdağ İlkokul (TOBB) | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Devam Ediyor |
| 23 | Rabia Recep Kuş Anaokulu | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Bitti |
| 24 | Anadolu İmam Hatip Lisesi (Yık-Yap) (TOKİ) (8 Derslik) | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Devam Ediyor |

EMİRDAĞ

2023 YILI KAMU YATIRIMLARI

| Sıra No | Projenin Adı | Kurumu | Projenin Durumu |
|---------|--|--------------------------------|------------------|
| 25 | Fidan Ali Altındaş Anaokulu (Hayırsever+Bakanlık Katkılı) | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Bitti |
| 26 | Mithatpaşa Ortaokulu (Yık-Yap) (TOKİ) (12 Derslik) | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Bitti |
| 27 | Fatih İlkokulu Deprem Güçlendirmesi | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Bitti |
| 28 | Afyonkarahisar Emirdağ Toklucak 3. Kısım YAS | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | İhale Aşamasında |
| 29 | Kılıçlıkavlaklı Köyü 2. Kısım Taşkın Koruma | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | İhale Aşamasında |
| 30 | Karacalar Köyü Taşkın Koruması | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | İhale Aşamasında |
| 31 | Güneysaray Köyü Taşkın Koruma İkmal | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | İhale Aşamasında |
| 32 | Asağı Bademli Köyü 2. Kısım Taşkın Koruma | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | İhale Aşamasında |
| 33 | İçmesuyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | İhale Aşamasında |
| 34 | Davulga Jandarma Karakol Komutanlığı Binası (İkmal İnşaatı) | İl Jandarma Komutanlığı | Bitti |
| 35 | 50 Yataklı Devlet Hastanesi | İl Sağlık Müdürlüğü | Devam Ediyor |
| 36 | 5-6 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi+Toplum Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Yapımı | İl Sağlık Müdürlüğü | Devam Ediyor |
| 37 | (Akşehir-Afyon)Ayr.-Çay-Bolvadin-Emirdağ | Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü | Devam Ediyor |
| 38 | Kilit Beton Parketaşı Alımı (2024 Yılına Devam Edecek İşlerden) | Emirdağ Belediyesi | Devam Ediyor |
| 39 | İlçe Merkezi Yol Tabakası Sökülmesi ve Beton Bordür Taşı Döşemesi | Emirdağ Belediyesi | Bitti |
| 40 | Dekoratif Aydınlatma Direkleri Alımı | Emirdağ Belediyesi | Bitti |
| 41 | Eski Yol Tabakası Sökülmesi ve Taşınması | Emirdağ Belediyesi | Bitti |
| 42 | Beton Parke ve Bordür Taşı Döşemesi | Emirdağ Belediyesi | Bitti |
| 43 | Altyapı Çalışmalarında Tahrip Olan Taş ve Bordür Tamiratu | Emirdağ Belediyesi | Bitti |
| 44 | TEDAŞ Çalışmalarında Tahrip Olan Yolların Onarımı | Emirdağ Belediyesi | Bitti |
| 45 | Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Bordür Taşı Döşemesi-2 | Emirdağ Belediyesi | Bitti |
| 46 | 95.000 m2 Beton Parke Taşı ve 20.000 Metre Beton Bordür Alımı | Emirdağ Belediyesi | Bitti |
| 47 | Muhtelif Mahallelere Beton Parke ve Bordür Taşı Döşemesi-3 | Emirdağ Belediyesi | Bitti |
| 48 | PE 100 Boru Alımı | Emirdağ Belediyesi | Bitti |

EMİRDAĞ

2023 YILI KAMU YATIRIMLARI

| Sıra No | Projenin Adı | Kurumu | Projenin Durumu |
|---------|---|--------------------|-----------------|
| 49 | Millet Bahçesi (Belediye Kaynaklı) | Emirdağ Belediyesi | Bitti |
| 50 | Emirdağ Meydan Projesi | Emirdağ Belediyesi | Bitti |
| 51 | 500 Seyirci Kapasiteli Spor Salonu | Emirdağ Belediyesi | Devam Ediyor |
| 52 | Kapalı Pazar Yerine Branda Yapılması | Emirdağ Belediyesi | Bitti |
| 53 | İlçe Merkezi Parke Döşemesi | Emirdağ Belediyesi | Bitti |
| 54 | Emirdağ Hükümet Konağı | İl Özel İdaresi | Devam Ediyor |
| 55 | Başkonak Köyü Kanalizasyon İlave Şebeke Hattı Yapımı | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 56 | Güveçli Köyü Kanalizasyon Kısmi Yenileme Yapımı | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 57 | Karacalar Köyü Kanalizasyon İlave Şebeke Hattı Yapımı | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 58 | Yavuz Köyü ENH+Motopop ve Terfi Hattı Yapımı | İl Özel İdaresi | Devam Ediyor |
| 59 | Emirdağ Yavuz+Soğukkuyu Köyleri Şebeke Hattı Yenileme (2022) | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 60 | Yarımca Köyü İçme Suyu Hattının Deplase Edilmesi | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 61 | Kırkpınar Köyü İçme Suyu İsale Hattının Deplase Edilmesi | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 62 | Başkonak Köyü İsale Hattı Yapımı (Püermanet) | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 63 | Gedikevi Köyü İsale Hattı Yapımı | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 64 | Beyköy Köyü Terfi Binası+Terfi Hattı Yapımı | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 65 | Karacalar Köyü İçmesuyu Şebeke Yenilemesi | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 66 | Tezköyü-İnceli-Rahimli Mahallesi Yolu (2,4 km) | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 67 | Yukarı Kurudere -Konya Karayolu 1.ve 2.Kat Asfalt Yapımı (3 km) | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 68 | Yeniköy-Sıgracık Yolu 1.ve 2.Kat Asfalt Yapımı (1,1 km) | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 69 | Türkmenköy Giriş Yolu 1.ve 2.Kat Asfalt Yapımı (1,7 km) | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 70 | Gedikevi Köyü-Tepeköy Yolu 1.ve 2.Kat Asfalt Yapımı (2,6 km) | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 71 | Dereköy-Eskiköy Yolu 1.ve 2.Kat Asfalt Yapımı (2,7 km) | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 72 | Demircili-Oğulbeyli Mahallesi Yolu 1.ve2.Kat Asfalt Yapımı (1,5 km) | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 73 | Beyköy-Gökçeyaka-Güneyköy Yolu 1.ve 2.Kat Asfalt Yapımı (11 km) | İl Özel İdaresi | Bitti |

EVCİLER

2022

Proje Sayısı
18

Proje Tutarı
45.791.742 TL

Yılı Ödeneği
29.503.214 TL

Yılı Harcaması
29.272.810 TL

KAMU
YATIRIMLARI



2023


Proje Sayısı
20

Proje Tutarı
81.666.186 TL


Yılı Ödeneği
47.604.705 TL

Yılı Harcaması
43.557.641 TL


Fiziki Gerçekleşme

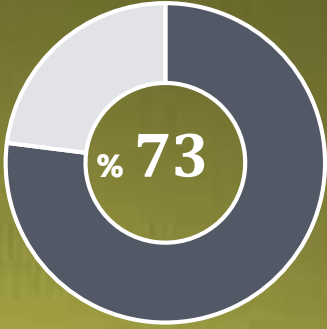


Fiziki Gerçekleşme

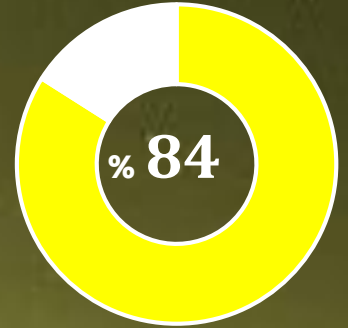

Yılı Harcama Oranı

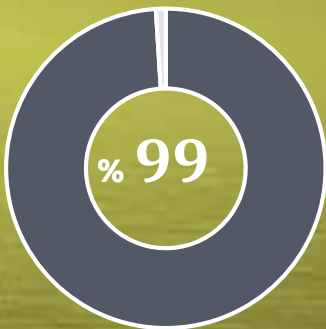

Yılı Harcama Oranı

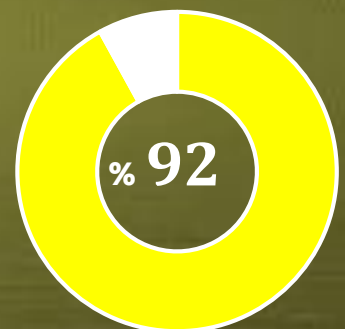

EVCİLER

2023 YILI KAMU YATIRIMLARI

| Sıra No | Projenin Adı | Kurumu | Projenin Durumu |
|---------|--|---|--------------------|
| 1 | Kapalı Pazaryeri Yapımı | İller Bankası Eskişehir Bölge Md. | Devam Ediyor |
| 2 | Kurudere Deresi'nin Camikebir Mahallesi'nde Geçen Kısımlarında Dere Yatağının ve Sanat Yapılarının Düzenlenmesi (İRAP) | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | Projeye Başlanmadı |
| 3 | Kurudere Deresi'nin Yavuz Selim Mahallesi'nde Geçen Kısımlarında Dere Yatağının ve Sanat Yapılarının Düzenlenmesi (İRAP) | DSİ18. Bölge Müdürlüğü | Projeye Başlanmadı |
| 4 | Merkez YAS Sulama Şebekesi | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | Bitti |
| 5 | Gökçek YAS Sulama Şebekesi | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | İhale Aşamasında |
| 6 | Akyarma YAS Sulama Şebekesi | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | Bitti |
| 7 | Madenler Köyü Anaokulu (1 Ek Derslik) | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Devam Ediyor |
| 8 | Yol Süpürme Aracı+Çöp Konteyner Alımı (Evciler Bld.) | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Md. | Bitti |
| 9 | Gökçek Köyü Kilit Parke Taşı Yol Yapımı (1.937 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 10 | Madenler Köyü Kilit Parke Taşı Yol Yapımı(593 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 11 | Körkuyu Köyü Kilit Parke Taşı Yol Yapımı(165 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 12 | Bostancı Köyü Kilit Parke Taşı Yol Yapımı(196 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 13 | Baraklı Köyü Kilit Parke Taşı Yol Yapımı(531 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 14 | Altınova Köyü Kilit Parke Taşı Yol Yapımı (608 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 15 | Akyarma Köyü Kilit Parke Taşı (320 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 16 | Madenler Köyü Kanalizasyon İlave Şebeke Yapımı (Püremanet) | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 17 | Gökçek Köyü Kanalizasyon İlave Şebeke Hattı Yapımı (Püremanet) | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 18 | Altınova Köyü İçmesuyu İlave Şebeke Yapımı | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 19 | Baraklı Köyü 2 Adet Terfi Binası+GES+Terfi Hattı Yapımı | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 20 | Baraklı-Altınova Grup Yolu BSK Asfalt Yapımı (11km) | İl Özel İdaresi | Bitti |

HOCALAR

2022

Proje Sayısı
32

Proje Tutarı
170.076.514 TL

Yılı Ödeneği
94.814.901 TL

Yılı Harcaması
45.293.250 TL

KAMU
YATIRIMLARI



2023


Proje Sayısı
20

Proje Tutarı
414.420.868 TL


Yılı Ödeneği
8.144.207 TL

Yılı Harcaması
3.123.403 TL


Fiziki Gerçekleşme

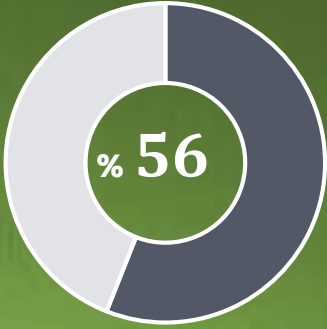


Fiziki Gerçekleşme

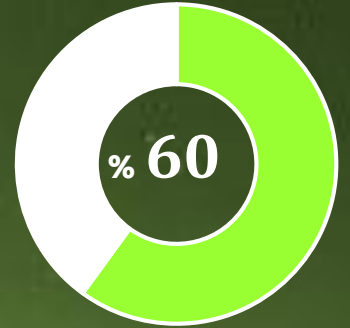

Yılı Harcama Oranı

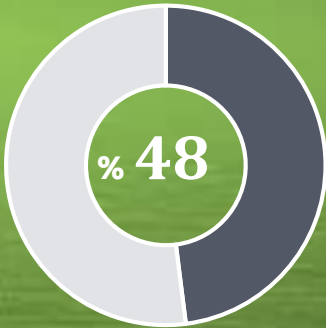

Yılı Harcama Oranı

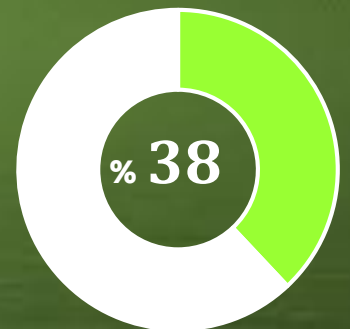

HOCALAR

2023 YILI KAMU YATIRIMLARI

| Sıra No | Projenin Adı | Kurumu | Projenin Durumu |
|---------|---|-----------------------------------|------------------|
| 1 | Yeni Mahalle Kocapınar Mevkii İçme Suyu Tesisleri Güneş Enerji Sistemi Yapımı | KHGB | Bitti |
| 2 | Örencik Köyü İçme Suyu Tesisleri Güneş Enerji Sistemi Yapımı | KHGB | Bitti |
| 3 | Yeşilhisar Köyü İçme Suyu Tesisleri Güneş Enerji Sistemi Yapımı | KHGB | Bitti |
| 4 | Akçadere-Çalça-Çepni-Devlethan İçme Suyu Bakım ve Onarımı | KHGB | Bitti |
| 5 | Pazaryeri Yapımı | İller Bankası Eskişehir Bölge Md. | İhale Aşamasında |
| 6 | Güre Göleti | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | Devam Ediyor |
| 7 | Uluköy Göleti İkmali | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | İhale Aşamasında |
| 8 | Uluköy Göleti Sulaması Malzeme Temini | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | İhale Aşamasında |
| 9 | Güre Göleti Sulaması | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | İhale Aşamasında |
| 10 | Uluköy Göleti Sulaması | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | Devam Ediyor |
| 11 | Çepni Köyü 2.Kısım Taşkın Koruması | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | İhale Aşamasında |
| 12 | Avgancık Köyü Anaokulu (1 Ek Derslik) | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Bitti |
| 13 | Çalça Köyü Kanalizasyon İlave Şebeke Hattı Yapımı | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 14 | Uluköy Köyü Kanalizasyon İlave Şebeke Hattı Yapımı | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 15 | Örtülü Köyü Terfi Binası | İl Özel İdaresi | Devam Ediyor |
| 16 | Örencik Köyü ENH+Motopomp ve Terfi Hattı Yapımı | İl Özel İdaresi | Devam Ediyor |
| 17 | Devlethan Köyü Yeni Sondaj Kuyusu Açılması (2022) | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 18 | Akçadere Köyü Memba Drenaj Yapımı ve Hatta Bağlanması (Püermanet) | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 19 | Avgancık Köyü Yeni Sondaj Kuyusu Açılması | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 20 | Mahalle Tipi Gençlik Merkezi Yapımı | Hocalar Belediyesi | İhale Aşamasında |

İHSANİYE

2022

Proje Sayısı
69

Proje Tutarı
429.754.270 TL

Yılı Ödeneği
66.296.335 TL

Yılı Harcaması
48.306.536 TL

2023

Proje Sayısı
56

Proje Tutarı
587.772.591 TL


Yılı Ödeneği
58.318.863 TL

Yılı Harcaması
42.283.905 TL


KAMU
YATIRIMLARI




Fiziki Gerçekleşme

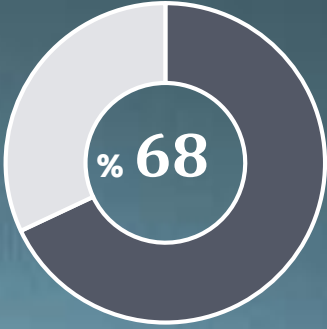


Fiziki Gerçekleşme

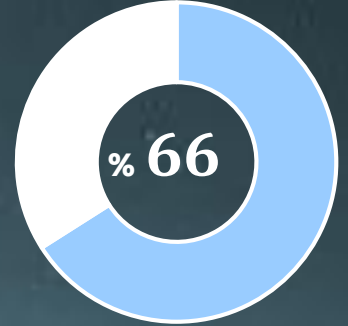

Yılı Harcama Oranı

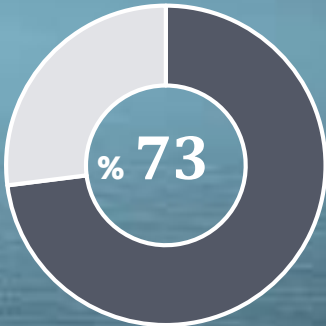

Yılı Harcama Oranı

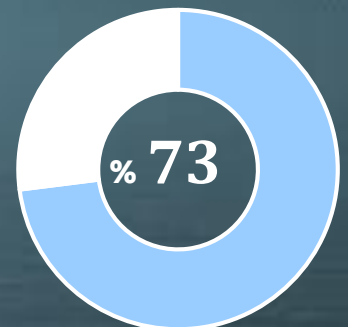

İHSANİYE

2023 YILI KAMU YATIRIMLARI

| Sıra No | Projenin Adı | Kurumu | Projenin Durumu |
|---------|---|---|--------------------|
| 1 | Mahalle Tipi Spor Salonu Yapımı | Yaylabağı Belediyesi | Bitti |
| 2 | Frigya Atlı Binicilik Tesisi Yapımı (Döğer) | Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü | Devam Ediyor |
| 3 | İhsaniye (Afyon2-Altıntaş) Elektrik İletim Hattı | TEİAŞ 7. Bölge Müdürlüğü | İhale Aşamasında |
| 4 | İhsaniye Trafo Merkezi | TEİAŞ 7. Bölge Müdürlüğü | İhale Aşamasında |
| 5 | Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Frigya Kültür Merkezi ve Millet Kiraathanesi Yapımı | İller Bankası Eskişehir Bölge Md. | İhale Aşamasında |
| 6 | Afyon İl Özel İdaresi Frigya (Döğer) Atçılık ve Binicilik Merkezi Yapımı | İller Bankası Eskişehir Bölge Md. | İhale Aşamasında |
| 7 | İhsaniye Güneş Enerji Santrali Yapımı | İller Bankası Eskişehir Bölge Md. | İhale Aşamasında |
| 8 | Gazlıgöl Güneş Enerji Santrali Yapımı | İller Bankası Eskişehir Bölge Md. | İhale Aşamasında |
| 9 | Yaylabağı Kanalizasyon Hatları İçin Boru Alımı | İller Bankası Eskişehir Bölge Md. | Bitti |
| 10 | Gazlıgöl Ön İzolasyonlu Jeotermal Su Borusu ile Birleştirme Seti Alımı | İller Bankası Eskişehir Bölge Md. | Bitti |
| 11 | Aşağıtandır Köyü İlkokul (Yık-Yap) | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Devam Ediyor |
| 12 | Döğer Anaokulu | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Devam Ediyor |
| 13 | Engelli İnsan Platformu (Asansörü) | İhsaniye Belediyesi | Bitti |
| 14 | Dükkan Yapımları (3 adet) | İhsaniye Belediyesi | Bitti |
| 15 | Çöp Konteyneri Alımı (Yaylabağı Belediyesi) | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü | Bitti |
| 16 | Kayıhan Göleti Sulaması | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | Bitti |
| 17 | İhsaniye Kurutma Kanalı'nın Ablak Mahallesinden Geçen Kısmında Dere Yatağı ve Sanat Yapılarının Düzenlenmesi (İRAP) | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | Projeye Başlanmadı |
| 18 | Yeşilyaz Göleti | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | İhale Aşamasında |
| 19 | Yukarıtandır Köyü Taşkın Koruması | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | Bitti |
| 20 | Yeşilyayla Köyü Taşkın Koruması | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | İhale Aşamasında |
| 21 | Orhanlı Köyü Taşkın Koruması | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | İhale Aşamasında |
| 22 | Kıyır Köyü Taşkın Koruması | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | İhale Aşamasında |
| 23 | Kayıhan Kasabası Taşkın Koruması | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | Devam Ediyor |
| 24 | Kadımürsel Köyü Taşkın Koruması | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | İhale Aşamasında |
| 25 | Döğer Kasabası 2. Kısım Taşkın Koruması | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | İhale Aşamasında |
| 26 | Bayramaliler Köyü 2. Kısım Taşkın Koruması | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | İhale Aşamasında |
| 27 | Aşağıtandır Köyü Taşkın Koruması | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | İhale Aşamasında |
| 28 | Ayazini Köyü 2. Kısım Taşkın Koruması | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | İhale Aşamasında |

İHSANİYE

2023 YILI KAMU YATIRIMLARI

| Sıra No | Projenin Adı | Kurumu | Projenin Durumu |
|---------|--|-----------------|-----------------|
| 29 | Oğulbeyli Köyü İçme Suyu Boru Alımı | KHGB | Bitti |
| 30 | Frigya Kadın Ürünleri Pazar Yeri | KHGB | Bitti |
| 31 | Üçlerkayası Köyü Parke Beton Yol Yapımı(600 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 32 | Hacıbeyli Köyü Parke Beton Yol Yapımı(600 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 33 | Eynihankuzviran Köyü Parke Beton Yol Yapımı(600 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 34 | Eskieymir Köyü Parke Beton Yol Yapımı(600 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 35 | Bayramaliler Köyü Parke Beton Yol Yapımı(600 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 36 | Ayazini Köyü Kilitli Parke Taşı ve Beton Bordür Yapımı (600 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 37 | Ablak Köyü Parke Beton Yol Yapımı(600 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 38 | Yukarıtandır Köyü Parke Beton Yol Yapımı(600 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 39 | Aşağıtandır Köyü Parke Beton Yol Yapımı(600 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 40 | Osmanköy Köyü Parke Beton Yol Yapımı(600 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 41 | Kıyır Köyü Parke Beton Yol Yapımı(600 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 42 | Beyköy Köyü Parke Beton Yol Yapımı(600 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 43 | Bozhüyük Köyü Parke Beton Yol Yapımı(600 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 44 | Karacaahmet Köyü Parke Beton Yol Yapımı(600 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 45 | Muratlar Köyü Parke Beton Yol Yapımı(600 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 46 | Hacıbeyli Köyü Kanalizasyon İlave Şebeke Hattı Yapımı | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 47 | Karacaahmet Köyü Kanalizasyon İlave Şebeke Hattı Yapımı | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 48 | Bozhüyük Köyü Kanalizasyon İlave Şebeke Hattı Yapımı | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 49 | Hacıbeyli Köyü Terfi Binası+Depo Tamiri | İl Özel İdaresi | Devam Ediyor |
| 50 | Kıyır Köyü Kanalizasyon Kısmi Yenileme (Püremanet) | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 51 | Aşağı Tandır Köyü İlave İçmesuyu Şebeke Hattı Yapımı | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 52 | Aşağıtandır Köyü Çıkış Demiryol Arası Akören Çıkış 1.ve 2.Kat Asfalt Yapımı (0,7 km) | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 53 | Bozhüyük Köyü Kabir Yolu 1.ve 2.Kat Asfalt Yapımı (0,65 km) | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 54 | İğdemir Köyü Demiryolu Arası 1.ve 2.Kat Asfalt Yapımı (2,5 km) | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 55 | Üçlerkayası Balıklı Göl-Bayramaliler Yolu 1. ve 2.Kat Asfalt Yapımı (1 km) | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 56 | Kıyır Köyü İçmesuyu Deposu ile İsale Boru Hattı Tadilatı | İl Özel İdaresi | Bitti |

İSCEHİSAR

2022

Proje Sayısı
32

Proje Tutarı
170.076.514 TL

Yılı Ödeneği
94.814.901 TL

Yılı Harcaması
45.293.250 TL

2023

Proje Sayısı
32

Proje Tutarı
242.262.576 TL


Yılı Ödeneği
129.018.940 TL

Yılı Harcaması
74.411.878 TL


KAMU
YATIRIMLARI




Fiziki Gerçekleşme

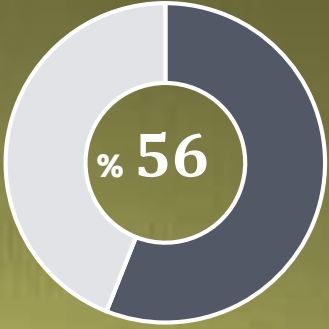


Fiziki Gerçekleşme

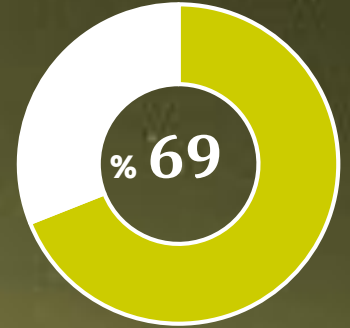

Yılı Harcama Oranı

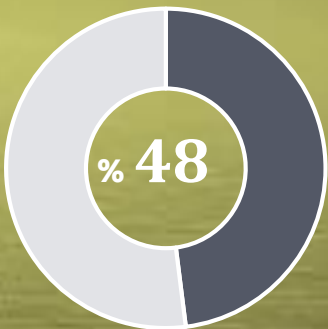

Yılı Harcama Oranı

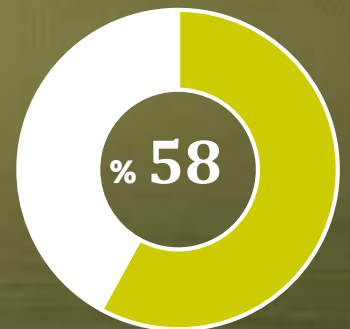

İSCEHİSAR

2023 YILI KAMU YATIRIMLARI

| Sıra No | Projenin Adı | Kurumu | Projenin Durumu |
|---------|---|-----------------------------------|--------------------|
| 1 | İscehisar Hükümet Konağı | İl Özel İdaresi | Devam Ediyor |
| 2 | Çalışlar Köyü Kanalizasyon Kısmi Yenileme | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 3 | Çatağıl Köyü İçme Suyu Deposunun Tamiri ve İlave Şebeke Yapılması (Püremanet) | İl Özel İdaresi | Devam Ediyor |
| 4 | Konarı-Cevizli Grup Yolu BSK Asfalt Yapımı (3,5 km) | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 5 | Karaağaç Köyü ENH+Motopomp+Terfi Hattı | İl Özel İdaresi | Devam Ediyor |
| 6 | Çalışlar Köyü Terfi Binası Yenileme | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 7 | Sıcak Asfalt Çalışmaları | İscehisar Belediyesi | Bitti |
| 8 | İscehisar Dere Sokak ile Seyitler 2-3 Deresi'nin Kesişimi'ndeki Yol Geçişinin Düzenlenmesi (İRAP) | İscehisar Belediyesi | Projeye Başlanmadı |
| 9 | İscehisar Dombaycı Sokak ile Seyitler 2-3 Deresi'nin Kesişimi'ndeki Yol Geçişinin Düzenlenmesi (İRAP) | İscehisar Belediyesi | Projeye Başlanmadı |
| 10 | Halı Saha Yapımı | İscehisar Belediyesi | Bitti |
| 11 | İscehisar-Emirdağ Enerji İletim Hattı | TEİAŞ 7. Bölge Müdürlüğü | Bitti |
| 12 | Beton Parke Taş ve Sıcak Asfalt İle Yol Yapımı-1 | İller Bankası Eskişehir Bölge Md. | Devam Ediyor |
| 13 | Kocatepe Parkı Yapımında Kullanılmak Üzere Mal Alımı | İller Bankası Eskişehir Bölge Md. | İhale Aşamasında |
| 14 | Seydiler Güneş Enerji Santrali Yapımı | İller Bankası Eskişehir Bölge Md. | İhale Aşamasında |
| 15 | Beton Parke Taş ve Asfalt İle Yol Yapımı-2 | İller Bankası Eskişehir Bölge Md. | Bitti |
| 16 | Millet Bahçesi | İller Bankası Eskişehir Bölge Md. | Devam Ediyor |
| 17 | Çalışlar YAS Sulama Şebekesi | DSİ 18. Bölge Md. | İhale Aşamasında |
| 18 | İlçe Merkezi 2. Kısım Taşkın Koruması | DSİ 18. Bölge Md. | İhale Aşamasında |
| 19 | Cevizli Köyü 2. Kısım Taşkın Koruması | DSİ 18. Bölge Md. | İhale Aşamasında |

İSCEHİSAR

2023 YILI KAMU YATIRIMLARI

| Sıra No | Projenin Adı | Kurumu | Projenin Durumu |
|---------|--|--------------------------------|-----------------|
| 20 | İscehisar İlkokulu (12 Derslik, Yık-Yap) | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Devam Ediyor |
| 21 | Selçuklu İlkokulu Deprem Güçlendirmesi | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Bitti |
| 22 | Afyon Ankara Yolu ile Seyitler 2-3 Deresi'nin Kesişimi'ndeki Yol Geçişinin Düzenlenmesi (İRAP) | Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü | Bitti |
| 23 | İscehisar Eski Devlet Hastanesi Deprem Tahkiki | İl Sağlık Müdürlüğü | Bitti |
| 24 | Cevizler Köyü Beton Parke Yol Yapımı (1.000 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 25 | Doğlat Köyü Beton Parke Yol Yapımı (1.000 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 26 | Doğanlar Köyü Beton Parke Yol Yapımı (1.000 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 27 | Karaağaç Köyü Beton Parke Yol Yapımı (1.000 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 28 | Karakaya Köyü Beton Parke Yol Yapımı (1.000 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 29 | Olukpınar Köyü Beton Parke Yol Yapımı (1.000 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 30 | Konarı Köyü Beton Parke Yol Yapımı (1.000 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 31 | Alanyurt Köyü Beton Parke Yol Yapımı (1.000 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 32 | Çalışlar Köyü Beton Parke Yol Yapımı (1.000 metrekare) | KHGB | Bitti |

KIZILÖREN

2022

Proje Sayısı
10

Proje Tutarı
13.094.040 TL

Yılı Ödeneği
8.513.622 TL

Yılı Harcaması
8.513.488 TL

KAMU
YATIRIMLARI



2023


Proje Sayısı
11

Proje Tutarı
10.132.457 TL


Yılı Ödeneği
5.635.159 TL

Yılı Harcaması
5.198.112 TL

Fiziki Gerçekleşme

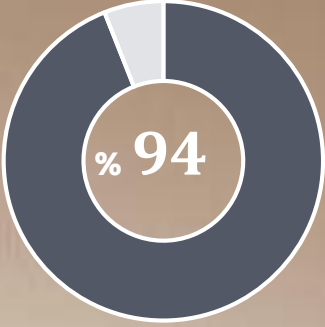


Fiziki Gerçekleşme

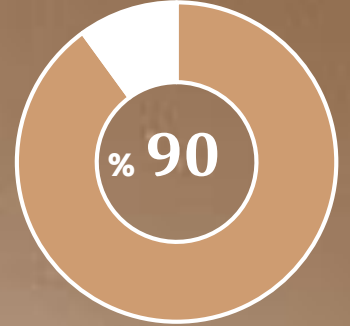

Yılı Harcama Oranı



Yılı Harcama Oranı

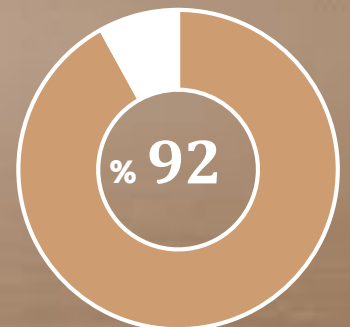

KIZILÖREN

2023 YILI KAMU YATIRIMLARI

| Sıra No | Projenin Adı | Kurumu | Projenin Durumu |
|---------|---|-----------------------------------|-----------------|
| 1 | Beton Parke Taşı ve Bordür Alımı | İller Bankası Eskişehir Bölge Md. | Bitti |
| 2 | Kızılören İçmesuyu Tesisleri | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | Devam Ediyor |
| 3 | Yenibelkavak Köy İçi Parke Yol Yapımı (740 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 4 | Türkelkavak Köy İçi Parke Yol Yapımı(190 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 5 | Gülyazı Köy İçi Parke Yol Yapımı (645 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 6 | Ekinova Köy İçi Parke Yol Yapımı (740 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 7 | T.Belkavak Köyü 250 Kişilik Fosseptik ve Tel Çit ile Çevrilmesi | İl Özel İdaresi | Devam Ediyor |
| 8 | Ekinova Köyü Yangın Vana Takılması | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 9 | Yenibelkavak İlave Şebeke Yapımı ve Yangın Vanası Takılması | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 10 | Türkelkavak Köyü Yangın Vanası Takılması | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 11 | Gülyazı Köyü İlave Şebeke Yapımı ve Yangın Vanası Takılması | İl Özel İdaresi | Bitti |

MERKEZ

2022


Proje Sayısı
216

Proje Tutarı
3.118.235.039 TL


Yılı Ödeneği
1.169.810.656 TL

Yılı Harcaması
763.048.669 TL

Fiziki Gerçekleşme

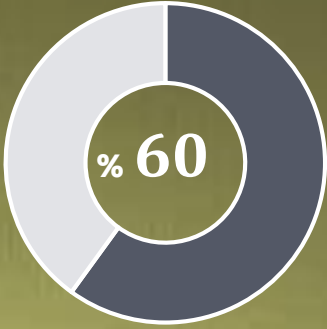

Yılı Harcama Oranı

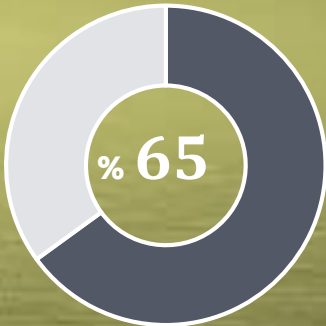

2023


Proje Sayısı
167

Proje Tutarı
10.132.457 TL


Yılı Ödeneği
5.635.159 TL

Yılı Harcaması
5.198.112 TL

Fiziki Gerçekleşme

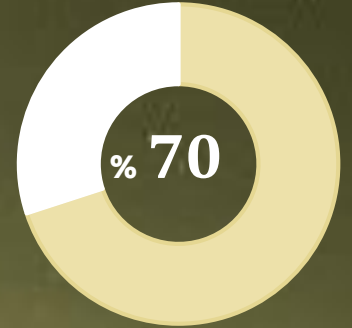

Yılı Harcama Oranı

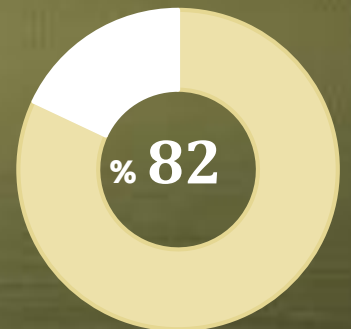

KAMU
YATIRIMLARI



MERKEZ

2023 YILI KAMU YATIRIMLARI

| Sıra No | Projenin Adı | Kurumu | Projenin Durumu |
|---------|--|-----------------------------------|--------------------|
| 1 | Çıkrık Belediyesi İçmesuyu İnşaatı | İller Bankası Eskişehir Bölge Md. | Devam Ediyor |
| 2 | Sülümenli Belediyesi Kanalizasyon Hattı | İller Bankası Eskişehir Bölge Md. | Devam Ediyor |
| 3 | Afyonkarahisar Belediyesi Sokak Sağlıklaştırma Yapımı-2 | İller Bankası Eskişehir Bölge Md. | Devam Ediyor |
| 4 | Işıklar Belediyesi Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Beton Parke Yol Düzenlemesi | İller Bankası Eskişehir Bölge Md. | İhale Aşamasında |
| 5 | Fethibey Belediyesi Güneş Enerjisi Santrali Yapımında Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı | İller Bankası Eskişehir Bölge Md. | İhale Aşamasında |
| 6 | Beyyazı Belediyesi Güneş Enerjisi Santrali Yapımında Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı | İller Bankası Eskişehir Bölge Md. | İhale Aşamasında |
| 7 | Beyyazı Belediyesi İlave Kanalizasyon Hatları Yapımı | İller Bankası Eskişehir Bölge Md. | İhale Aşamasında |
| 8 | Salar Belediyesi İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Yapımı | İller Bankası Eskişehir Bölge Md. | Bitti |
| 9 | Sülün Belediyesi Kilitli Parke Taşı Alımı | İller Bankası Eskişehir Bölge Md. | Bitti |
| 10 | Fethibey Belediyesi Düğün Salonu | İller Bankası Eskişehir Bölge Md. | Devam Ediyor |
| 11 | Sülümenli Belediyesi Tekstil Atölyesi | İller Bankası Eskişehir Bölge Md. | Bitti |
| 12 | Kocatepe Belediyesi İçmesuyu İsale Hattı | İller Bankası Eskişehir Bölge Md. | Devam Ediyor |
| 13 | Yeni Müze Kompleksi ve Çevre Düzenlemesi | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | Bitti |
| 14 | Merkez Afyon 2 Deresi'nin Yeşilyurt Mahalesi'nde Geçen Kısımlarında Dere Yatağı ve Sanat Yapılarının Düzenlenmesi (İRAP) | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | Projeye Başlanmadı |
| 15 | Merkez Afyon 3 Deresi'nin OSB Mahalesi'nde Geçen Kısımlarında Dere Yatağı ve Sanat Yapılarının Düzenlenmesi (İRAP) | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | Projeye Başlanmadı |
| 16 | Halımoru Göleti İkmali | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | İhale Aşamasında |
| 17 | Halımoru Göleti Sulaması | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | Devam Ediyor |
| 18 | Ataköy 1. ve 2. Kısım YAS | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | İhale Aşamasında |
| 19 | Susuz 1.Kısım YAS Sulama Şebekesi | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | İhale Aşamasında |
| 20 | Evsel Atıksu Arıtma Tesisi Sulaması | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | Devam Ediyor |

MERKEZ

2023 YILI KAMU YATIRIMLARI

| Sıra No | Projenin Adı | Kurumu | Projenin Durumu |
|---------|---|--|------------------|
| 21 | Geçirgen ve Geçirimsiz Tersip Bendi Yapımı | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | İhale Aşamasında |
| 22 | Ataköy-Kışlacık Köyleri İkmalî 2. Kısım Taşkın Koruması | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | Bitti |
| 23 | Akarçay 2.Kısım Taşkın Koruması | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | İhale Aşamasında |
| 24 | 3.Kısım Arazi Topplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | Devam Ediyor |
| 25 | Akarçay Havzası Merkez Gebeceler Atıksu Arıtma Tesisi | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | İhale Aşamasında |
| 26 | Akarçay Havzası Merkez Büyükkalecik Atıksu Arıtma Tesisi | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | İhale Aşamasında |
| 27 | Akşehir-Afyon Yolu Bitümlü Sıcak Kaplama (BSK) | Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü | Devam Ediyor |
| 28 | İdare Mahkeme Başkanlığı-İl Seçim Md-Adli Tıp Şube Md. Onarımı | Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı | Bitti |
| 29 | Beton Parke Düzenlemesi (Ataköy Mahallesi) | Afyonkarahisar Belediyesi | Bitti |
| 30 | Muhtelif Sokaklara Beton Parke Düzenlemesi (Yeşilyurt ve Osmangazi Mahalleleri) | Afyonkarahisar Belediyesi | Bitti |
| 31 | 150.000 Ton Asfalt Agregası Alımı | Afyonkarahisar Belediyesi | Devam Ediyor |
| 32 | 150.000 Ton Temel Malzeme Alımı | Afyonkarahisar Belediyesi | Devam Ediyor |
| 33 | Atatürk Kültür Merkezi Restorasyon Yapımı | Afyonkarahisar Belediyesi | Devam Ediyor |
| 34 | Gastronomi Sokağı Yapımı | Afyonkarahisar Belediyesi | Devam Ediyor |
| 35 | İkmal Komutanlığı Binaları ve Sosyal Tesis Yapımı | Afyonkarahisar Belediyesi | Devam Ediyor |
| 36 | Köle Hanı Restorasyonu | Afyonkarahisar Belediyesi | Devam Ediyor |
| 37 | Millet Kütüphanesi Yapımı | Afyonkarahisar Belediyesi | Devam Ediyor |
| 38 | Merkez Sokak Sağıklaştırma (2022 Yılı Uygulama İşleri) | Afyonkarahisar Belediyesi | Devam Ediyor |
| 39 | İzmir İstasyon Binası ve Ataköy İlkokulu Restorasyonu | Afyonkarahisar Belediyesi | Devam Ediyor |
| 40 | Sondaj Kuyusu Açılması | Afyonkarahisar Belediyesi | Bitti |

MERKEZ

2023 YILI KAMU YATIRIMLARI

| Sıra No | Projenin Adı | Kurumu | Projenin Durumu |
|---------|--|---------------------------|-----------------|
| 41 | Beton Parke ve Orta Refüj Bordür Alımı | Afyonkarahisar Belediyesi | Bitti |
| 42 | Beton Parke ve Orta Refüj Bordür Alımı-2 | Afyonkarahisar Belediyesi | Bitti |
| 43 | Milli Egemenlik ve Kurtuluş Caddesine Kaldırım Yapımı | Afyonkarahisar Belediyesi | Bitti |
| 44 | Milli Birlik Caddesi Parke Yapımı | Afyonkarahisar Belediyesi | Bitti |
| 45 | Muhtelif Yerlere Beton Parke Yapımı | Afyonkarahisar Belediyesi | Bitti |
| 46 | Millet Caddesi Parke Yapımı | Afyonkarahisar Belediyesi | Bitti |
| 47 | Katyonik Asfalt Emülsiyonu Alımı | Afyonkarahisar Belediyesi | Bitti |
| 48 | Muhtelif Sokaklara Kaldırım Yapımı (Dervişpaşa Mahallesi) | Afyonkarahisar Belediyesi | Bitti |
| 49 | Muhtelif Sokaklarda Kaldırım Yapımı (Ali İhsan Paşa, Dumlupınar ve Yeşilyol ve Ordu Bulvarı) | Afyonkarahisar Belediyesi | Bitti |
| 50 | 800 Ton Buz Çözücü, Önleyici Sıvı ve Çözelti Alımı | Afyonkarahisar Belediyesi | Bitti |
| 51 | Yeşiltepe Camii Müştemilat Binadı Yapımı | Afyonkarahisar Belediyesi | Bitti |
| 52 | Sosyal Tesis Yapımı (Ataköy ve Kışlacık Mahalleleri) | Afyonkarahisar Belediyesi | Bitti |
| 53 | Millet Caddesi (Uzun Çarşı) Cephe İyileştirme Çalışmaları | Afyonkarahisar Belediyesi | Bitti |
| 54 | Rahvan At Pisti Yapımı | Afyonkarahisar Belediyesi | Bitti |
| 55 | Yoncaaltı Çarşı ve Kapalı Otopark Yapımı | Afyonkarahisar Belediyesi | Bitti |
| 56 | İtfaiye Müdürlüğü İdari Bina Yapımı | Afyonkarahisar Belediyesi | Bitti |
| 57 | Muhtelif Havuzlara Malzeme Alımı | Afyonkarahisar Belediyesi | Bitti |
| 58 | Asri Mezarlık Etrafı ve Selçuklu Mahallesi Yürüyüş Yolu Düzenlemesi Yapımı | Afyonkarahisar Belediyesi | Bitti |
| 59 | Muhtelif Mahalle Park Düzenleme ve Erenler Mezarlık Tel Çit Yapımı | Afyonkarahisar Belediyesi | Bitti |
| 60 | Eski Müze Parkı Çevre Düzenlemesi Yapımı | Afyonkarahisar Belediyesi | Bitti |

MERKEZ

2023 YILI KAMU YATIRIMLARI

| Sıra No | Projenin Adı | Kurumu | Projenin Durumu |
|---------|--|--|-----------------|
| 61 | Saraydüzü Kafeterya Su Deposu ve Bayraktepe Mezarı Perde Duvar Yapımı | Afyonkarahisar Belediyesi | Bitti |
| 62 | Jeo Termal Sera Yapımı | Afyonkarahisar Belediyesi | Bitti |
| 63 | Garnizon Millet Bahçesi | Afyonkarahisar Belediyesi | Bitti |
| 64 | Karaaslan Mevki ve Fidanlık Alanı Çevresi Yapımı | Afyonkarahisar Belediyesi | Bitti |
| 65 | Park Düzenlemeleri (Veysel Karani, Hoca Ahmet Yesevi, Beyazıt Mahalleleri) | Afyonkarahisar Belediyesi | Bitti |
| 66 | Park Düzenlemeleri (Orhangazi, Karşıyaka ve Battalgazi Mahalleleri) | Afyonkarahisar Belediyesi | Bitti |
| 67 | Gençlik Kampı Elektrik Hattı ve Aydınlatma Yapımı | Afyonkarahisar Belediyesi | Bitti |
| 68 | Muhtelif Parklarda Parke ve Halı Saha Bakımları | Afyonkarahisar Belediyesi | Bitti |
| 69 | Çevre Düzenlemeleri (Erenler, Akarçay ve Güvenevler Mahalleleri) | Afyonkarahisar Belediyesi | Bitti |
| 70 | Bayraktepe Mezarlığı İstinat Duvarı Düzenlemesi | Afyonkarahisar Belediyesi | Bitti |
| 71 | Su Depoları Yapımları (90 Metreküp-7 Adet) | Afyonkarahisar Belediyesi | Bitti |
| 72 | Cadde ve Bulvarlardaki Ağaçların Budanması Hizmet Alımı | Afyonkarahisar Belediyesi | Bitti |
| 73 | Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı İçmesuyu Anahat Yapımı | Afyonkarahisar Belediyesi | Bitti |
| 74 | Çakır Mahallesi Kanalizasyon Şebeke Hattı Yapımı | Afyonkarahisar Belediyesi | Bitti |
| 75 | Gazlıgöl Caddesi İçmesuyu Anahat Yapımı | Afyonkarahisar Belediyesi | Bitti |
| 76 | Karşıyaka Mahallesi 1695 ve 1697. Sokakları İçmesuyu Hattı Yenilemesi | Afyonkarahisar Belediyesi | Bitti |
| 77 | Kadınana Caddesi İçmesuyu Anahat Yapımı | Afyonkarahisar Belediyesi | Bitti |
| 78 | Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Bitti |
| 79 | Merkezi Araştırma Laboratuvarı | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Devam Ediyor |
| 80 | Muhtelif İşler (2) | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Bitti |

MERKEZ

2023 YILI KAMU YATIRIMLARI

| Sıra No | Projenin Adı | Kurumu | Projenin Durumu |
|---------|---|---|------------------|
| 81 | FTR Hastanesi | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Devam Ediyor |
| 82 | Çocuk Acil Hizmet Binası | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Devam Ediyor |
| 83 | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | İhale Aşamasında |
| 84 | Muhtelif İşler | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Bitti |
| 85 | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Bitti |
| 86 | Yayın Alımı | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Bitti |
| 87 | Kampüs Altyapısı | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Devam Ediyor |
| 88 | Derslik ve Merkezi Birimler (Sağlık Kampusu Ortak Derslik) | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Devam Ediyor |
| 89 | Derslik ve Merkezi Birimler (Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi) | Afyon Kocatepe Üniversitesi | Devam Ediyor |
| 90 | Muhtelif İşler | Afyon Kocatepe Üniversitesi | Bitti |
| 91 | Yayın Alımları | Afyon Kocatepe Üniversitesi | Bitti |
| 92 | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | Afyon Kocatepe Üniversitesi | Bitti |
| 93 | Genç Ofis ve Çok Amaçlı Salonun Bakım ve Onarımları (Asansör ve Oda Zemin Kaplamalarının Yenilenmesi) | Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü | Bitti |
| 94 | Led Aydınlatma Yapımları (Tınaztepe Spor Salonu, Çiğiltepe Spor Salonu ve Spor Kompleksi) | Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü | Bitti |
| 95 | Merkez Kocatepe Spor Kompleksi B Blok Çok Amaçlı Salon Tadilatları (Duş-WC Yapımları) | Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü | Devam Ediyor |
| 96 | Merkez Spor Lisesi | Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü | Devam Ediyor |
| 97 | Tınaztepe Spor Salonu, Çiğiltepe Spor Salonu ve Kapalı Tenis Kortlarının Doğalgaz Dönüşümü | Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü | Bitti |
| 98 | Karaarslan Trafo Merkezi | TEİAŞ 7. Bölge Müdürlüğü | İhale Aşamasında |
| 99 | Yol Süpürge Aracı Alımı (Afyonkarahisar Belediyesi) | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü | Bitti |
| 100 | Yol Süpürge Aracı Alımı (2 Adet) (İl Özel İdaresi) | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü | Bitti |

MERKEZ

2023 YILI KAMU YATIRIMLARI

| Sıra No | Projenin Adı | Kurumu | Projenin Durumu |
|---------|---|---|------------------|
| 101 | Arazöz (Kocatepe Belediyesi) | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü | Bitti |
| 102 | Afyonkarahisar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü | Devam Ediyor |
| 103 | Yakup Evren Ortaokulu (24 Derslik) | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Devam Ediyor |
| 104 | Kocatepe İlkokulu (24 Derslik) | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Devam Ediyor |
| 105 | Sedat Gökdemir Anaokulu (ÖE-AO) | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | İhale Aşamasında |
| 106 | Kadın Açıkcezaevi Anaokulu | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Bitti |
| 107 | Yeşilyurt Mahallesi Anaokulu | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | İhale Aşamasında |
| 108 | Ömer Kocaşaban Fen Lisesi (Hayırsever) | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Devam Ediyor |
| 109 | Değirmenayvalı Anaokulu | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | İhale Aşamasında |
| 110 | Ali Çağlar Anadolu Lisesi Pansiyon (150 Öğrencilik) | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | İhale Aşamasında |
| 111 | Mehmet Gençler İlkokulu (12 Derslik) (Hayırsever) | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Bitti |
| 112 | Çayırbağ Anadolu Lisesi (12 Derslikli) | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Devam Ediyor |
| 113 | Selçuklu Mahallesi Anaokulu | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Devam Ediyor |
| 114 | Afyonkarahisar MTAL (32 Derslik ve 2 Atölye Binası) | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Devam Ediyor |
| 115 | Spor Lisesi (Sporcu Eğitim Merkezi) | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Devam Ediyor |
| 116 | Anadolu İmam Hatip Lisesi (24 Derslik + 200 Öğrenci Pansiyonu) | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Devam Ediyor |
| 117 | Güvenevler Mahallesi Anaokulu | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Devam Ediyor |
| 118 | Kamil Miras Anadolu Lisesi (Yık-Yap) (TOKİ) (32 Derslik + 200 Öğrenci Pansiyonu) | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Bitti |
| 119 | Gazi Mahallesi Anaokulu | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Devam Ediyor |
| 120 | Ahmet Kocaşaban Ortaokulu (Hayırsever+Bakanlık Katkılı) | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | İhale Aşamasında |

MERKEZ

2023 YILI KAMU YATIRIMLARI

| Sıra No | Projenin Adı | Kurumu | Projenin Durumu |
|---------|--|----------------------------------|------------------|
| 121 | Osman Atilla İlkokulu (Yık-Yap) | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Devam Ediyor |
| 122 | Büyük Kalecik İlkokulu (Yık-Yap) | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Bitti |
| 123 | Şemsettin Karahisari Ortaokulu (Yık-Yap) | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Devam Ediyor |
| 124 | Methiye Dumlu Ortaokulu (8 Derslik, Yık-Yap) | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Devam Ediyor |
| 125 | Salar İlkokulu (16 Derslik) (Yık-Yap) | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Bitti |
| 126 | Yunus Emre Ortaokulu (Yık-Yap) | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Devam Ediyor |
| 127 | Ataköy Mahallesi Anaokulu | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Devam Ediyor |
| 128 | Ali İhsan Paşa Anaokulu | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Devam Ediyor |
| 129 | Kızıldağ Ortaokulu (Yık-Yap) | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Bitti |
| 130 | Merkez Hacı Bakıroğlu Camii Proje Temini | Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü | Bitti |
| 131 | Merkez 392 Ada 15 Parse Konut Yapımı İçin Altyapı Proje Temini | Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü | Devam Ediyor |
| 132 | Afyonkarahisar Garda Prefabrik Hizmet Binası Yapımı | TCDD 7. Bölge Müdürlüğü | İhale Aşamasında |
| 133 | Afyonkarahisar Gar Sahası Ana İkmal Depo Yapılması | TCDD 7. Bölge Müdürlüğü | İhale Aşamasında |
| 134 | Merkez Devlet Hastanesi Bünyesinde Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi Projesi | İl Sağlık Müdürlüğü | Bitti |
| 135 | Erenler Halil Araç 4 Hekimlik AHB+112 ASHİ (Hayırsever) | İl Sağlık Müdürlüğü | Devam Ediyor |
| 136 | Ataköy Işık 2 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi (Hayırsever) | İl Sağlık Müdürlüğü | Bitti |
| 137 | Merkez 50 Ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi + 112 Acil Sağlık Hizmetleri Binası | İl Sağlık Müdürlüğü | Devam Ediyor |
| 138 | Sarık Köyü Stabilize Parke Yol Yapımı (1.000 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 139 | Saraydüzü Köyü Stabilize Parke Yol Yapımı (1.000 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 140 | Kızıldağ Köyü Stabilize Parke Yol Yapımı (1.000 metrekare) | KHGB | Bitti |

MERKEZ

2023 YILI KAMU YATIRIMLARI

| Sıra No | Projenin Adı | Kurumu | Projenin Durumu |
|---------|--|--------------------|-----------------|
| 141 | Halımoru Köyü Stabilize Parke Yol Yapımı (1.000 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 142 | Olucak Köyü Stabilize Parke Yol Yapımı (1.000 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 143 | Anıtkaya Köyü Stabilize Parke Yol Yapımı (4.500 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 144 | Omuzca Köyü İçme Suyu Tesisleri Güneş Enerji Sistemi Yapımı | KHGB | Bitti |
| 145 | Değirmendere Köyü Yağmur Atıksu Şebeke Yapımı | KHGB | Bitti |
| 146 | Anıtkaya Köyü İçme Suyu ve İlave Şebeke Yapımı | KHGB | Bitti |
| 147 | Mahalle Tipi Gençlik Merkezi (Işıklar Belediyesi) | Işıklar Belediyesi | Bitti |
| 148 | Anıtkaya Köyü Kısmi Yenileme ve İlave Şebeke Yapımı (Püermanet) | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 149 | Değirmendere Köyü Kanalizasyon Kısmi Yenileme Yapımı (KHGB Tarafından Tamamlandı.) | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 150 | Halımoru Köyü Kanalizasyon Kısmi Yenileme Yapımı (Karayolları Tarafından Yapıldı.) | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 151 | Sarık Köyü Kanalizasyon Yağmur Atık Suyu Yapımı | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 152 | Saadet Köyü Yeni Sondaj Kuyusu Açılması | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 153 | Anıtkaya Köyü Kanalizasyon Kısmi Yenileme ve İlave Şebeke Yapımı | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 154 | Halımoru Köyü Kanalizasyon Kısmi Yenileme Yapımı (Karayolları Tarafından Yapılacaktır.)(Püermanet) | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 155 | Belkaracaören Köyü Memba İsale Hattı Yapımı | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 156 | Sarık Köyü Terfi İniş Hattı Yapımı (Püermanet) | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 157 | Şeker Fabrikası Sülümenli Arası BSK Yapımı (2,2km) | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 158 | Karaaslan Köyü Konya Yolu BSK Asfalt Yapımı (2,5km) | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 159 | Anıtkaya Köyü- Çatkuyu Arası 1. ve 2. Kat Asfalt Yapımı (9 km) | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 160 | Karaaslan Köyü-Nuribey Arası 1.ve2.Kat Asfalt Yapımı(1,5km) | İl Özel İdaresi | Bitti |

MERKEZ

2023 YILI KAMU YATIRIMLARI

| Sıra No | Projenin Adı | Kurumu | Projenin Durumu |
|---------|---|-----------------|-----------------|
| 161 | Saadet Köyü 1.ve2. Kat Asfalt Yapımı (1,5km) | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 162 | Küçükkalecik Köyü 1.ve 2.Kat Asfalt Yapımı (3km) | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 163 | Susuz-Beyyazı Arası 1.ve 2.Kat Asfalt Yapımı (2km) | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 164 | Sarık-Salar Arası 1.ve 2.Kat Asfalt Yapımı (1km) | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 165 | Sarık-Değirmenayvalı Arası 1.ve 2. kat Asfalt Yapımı (0.5 km) | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 166 | Anıtkaya Köyü Köyiçi 1.ve 2. Kat Asfalt Yapımı (6 km) | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 167 | Çavdarlı Köyü 1. ve 2. Kat Asfalt Yapımı (1,5 km) | İl Özel İdaresi | Bitti |

SANDIKLI

2022


Proje Sayısı
88

Proje Tutarı
866.507.549 TL


Yılı Ödeneği
202.599.375 TL

Yılı Harcaması
152.903.800 TL

Fiziki Gerçekleşme

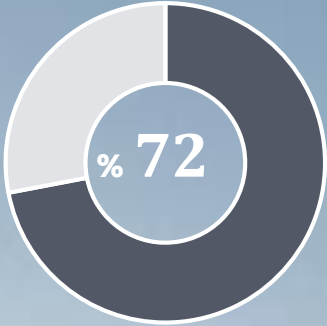

Yılı Harcama Oranı

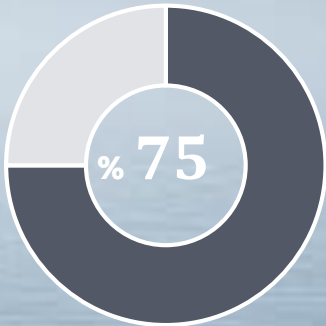

2023


Proje Sayısı
74

Proje Tutarı
998.653.693 TL


Yılı Ödeneği
357.780.948 TL

Yılı Harcaması
244.226.022 TL

Fiziki Gerçekleşme

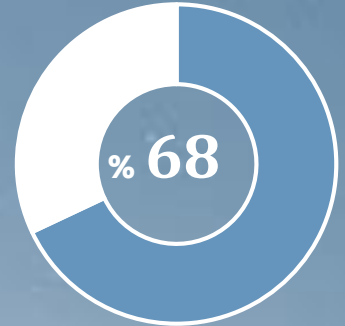

Yılı Harcama Oranı

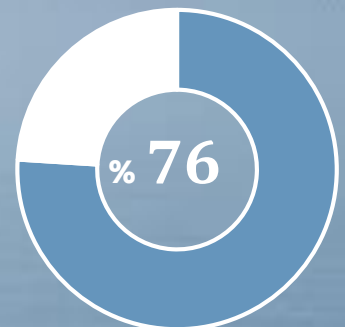

KAMU
YATIRIMLARI



SANDIKLI

2023 YILI KAMU YATIRIMLARI

| Sıra No | Projenin Adı | Kurumu | Projenin Durumu |
|---------|--|--|--------------------|
| 1 | Yeşildirek, Konak, İstasyon ve Dereboyu Caddelerinde Sokak Sağlıklaştırma ve Cephe Kaplama Yapımı | İller Bankası Eskişehir Bölge Md. | Devam Ediyor |
| 2 | Akharım Güneş Enerji Santrali | İller Bankası Eskişehir Bölge Md. | İhale Aşamasında |
| 3 | Sıcak Asfalt İle Yol ve Kaldırım Yapımı-1 | İller Bankası Eskişehir Bölge Md. | Devam Ediyor |
| 4 | Sıcak Asfalt İle Yol ve Kaldırım Yapımı-2 | İller Bankası Eskişehir Bölge Md. | Bitti |
| 5 | Sıcak Asfalt İle Yol Yapımı-3 | İller Bankası Eskişehir Bölge Md. | Bitti |
| 6 | Sıcak Asfalt ve Yol Yapımında Kullanılmak Üzere Muhtelif Malzeme Alımı | İller Bankası Eskişehir Bölge Md. | Devam Ediyor |
| 7 | Bisiklet Yolu ve Yeşil Yürüyüş Yolu Yapımı | İller Bankası Eskişehir Bölge Md. | Bitti |
| 8 | Sandıklı Akkaya Deresi'nin İstasyon Mahallesi'nde Geçen Kısımlarında Dere Yatağının ve Sanat Yapılarının Düzenlenmesi (İRAP) | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | Projeye Başlanmadı |
| 9 | Sandıklı Akkaya Deresi'nin Koçhisar Mahallesi'nde Geçen Kısımlarında Dere Yatağının ve Sanat Yapılarının Düzenlenmesi (İRAP) | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | Projeye Başlanmadı |
| 10 | Menteş Göleti İkmali 2. Kısım | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | Devam Ediyor |
| 11 | Menteş Göleti Sulaması | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | İhale Aşamasında |
| 12 | Eşören Göleti Sulaması İkmali | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | Devam Ediyor |
| 13 | Ballık Göleti Sulaması | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | Bitti |
| 14 | Ekinhisar Göleti Sulaması | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | Bitti |
| 15 | Çiğiltepe Köyü Taşkın Koruma | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | İhale Aşamasında |
| 16 | İçmesuyu Arıtma Tesisi | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | Bitti |
| 17 | İçmesuyu Tesisleri | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | Bitti |
| 18 | Yavaşlar Barajı Rölekasyon Yolu Sanat Yapıları ve İlave Tedbirlerin Alınması | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | İhale Aşamasında |
| 19 | Yavaşlar Barajı Relokasyon Yolu Ek 2 Protokol Bedeli | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | İhale Aşamasında |
| 20 | Yavaşlar Kasabası Akpınar Deresi 2. Kısım Taşkın Koruması | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | Devam Ediyor |
| 21 | İlçe Merkezi 3.Kısım Taşkın Koruması | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | Devam Ediyor |
| 22 | Akdağ Tabiat Parkı Tanıtım Tabelası | Tarım ve Orman Bk. 5. Bölge Md. | Bitti |
| 23 | Çöp Toplama Aracı+Kanal Açma ve Temizleme Aracı (Sandıklı Belediyesi) | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Md | Bitti |

SANDIKLI

2023 YILI KAMU YATIRIMLARI

| Sıra No | Projenin Adı | Kurumu | Projenin Durumu |
|---------|--|---------------------------|------------------|
| 24 | Örenkaya Köyü Anaokulu (Yık-Yap) | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | İhale Aşamasında |
| 25 | Sandıklı Anaokulu ve İlkolulu (TOBB) | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Devam Ediyor |
| 26 | Sandıklı MTAL (Yık-Yap) (TOKİ) (2 Adet Atölye) | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Bitti |
| 27 | Ali Çetinkaya İlkokulu (Yık-Yap) (Toki) | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Devam Ediyor |
| 28 | Cumhuriyet Ortaokulu (Yık-Yap) (TOKİ) (24 Derslik) | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Bitti |
| 29 | Miralay Reşat Bey İlkokulu (16 Derslik) (Yık-Yap) | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Devam Ediyor |
| 30 | Çakır Mahallesi Anaokulu (4 Derslik) | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | İhale Aşamasında |
| 31 | Nasuhoglu Köyü İçme Suyu Kuyusu Açılması | KHGB | Bitti |
| 32 | Odaköy Köyü İçme Suyu Kuyusu Açılması | KHGB | Bitti |
| 33 | Ballık Köyü İçme Suyu Kuyusu Açılması | KHGB | Bitti |
| 34 | Dodurga Köyü Kilitli Parke ve Beton Bordür Yapımı | KHGB | Bitti |
| 35 | Karadirek Köyü Kilitli Parke Taşı ve Beton Bordür Yapımı | KHGB | Bitti |
| 36 | Kusura Köyü Kilitli Parke Taşı ve Beton Bordür Yapımı | KHGB | Bitti |
| 37 | Baştepe Köyü Kilitli Parke Taşı ve Beton Bordür Yapımı | KHGB | Bitti |
| 38 | Başagaç Köyü Kilitli Parke Taşı ve Beton Bordür Yapımı | KHGB | Bitti |
| 39 | Yayman Köyü Beton Parke Yol Yapımı (1.000 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 40 | Reşadiye Köyü Beton Parke Yol Yapımı (1.000 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 41 | Örenkaya Köyü Beton Parke Yol Yapımı (1.000 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 42 | Koçhisar Köyü Beton Parke Yol Yapımı (1.000 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 43 | Kızık Köyü Beton Parke Yol Yapımı (1.000 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 44 | Çambeyli Köyü Beton Parke Yol Yapımı (1.000 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 45 | Ballık Köyü Beton Parke Yol Yapımı (1.000 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 46 | Sandıklı Yusuf Aktürk 2-3 AHB (Hayırsever) | İl Sağlık Müdürlüğü | Devam Ediyor |
| 47 | Sandıklı Hükümet Konağı | İl Özel İdaresi | Devam Ediyor |
| 48 | Çiğiltepe ve Koçhisar Köyleri Kanalizasyon İlave Şebeke Hattı Yapımı (Püermanet) | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 49 | Hırka Köyü Kanalizasyon Kısmi Yenileme | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 50 | Dodurga Köyü Yağmur Suyu Hattı Yapımı | İl Özel İdaresi | Bitti |

SANDIKLI

2023 YILI KAMU YATIRIMLARI

| Sıra No | Projenin Adı | Kurumu | Projenin Durumu |
|---------|---|---------------------|------------------|
| 51 | Yavaşlar Köyü Kanalizasyon Kısmi Yenileme | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 52 | Ekinhisar Köyü Kanalizasyon İlave Şebeke Hattı Yapımı | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 53 | Karacaören Köyü Kanalizasyon İlave Şebeke Hattı Yapımı | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 54 | Emirhisar Köyü Kanalizasyon İlave Şebeke Hattı | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 55 | Akın Köyü Kanalizasyon İlave Şebeke Hattı Yapımı | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 56 | Saltık Köyü Yeni Sondaj Kuyusu Açılması (2022) | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 57 | Emirhisar Köyü Yeni Sondaj Kuyusu Açılması (2022) | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 58 | Yumruca Köyü Terfi Binası+Terfi Hattı+ENH+Motopomp Alımı (2022) | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 59 | Odaköy Köyü Yeni Sondaj Kuyusu Açılması | İl Özel İdaresi | İhale Aşamasında |
| 60 | Nasuhoglu Köyü Yeni Sondaj Kuyusu Açılması | İl Özel İdaresi | İhale Aşamasında |
| 61 | Reşadiye Köyü Sondaj+ENH+Motopop ve Terfi Hattı Yapımı | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 62 | Akın Köyü Sondaj+ENH+Motopop ve Terfi Hattı Yapımı | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 63 | Alamescit Köyü Sondaj+ENH+Motopop ve Terfi Hattı Yapımı | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 64 | Çambeyli Köyü İçme Suyu Depo İkmal İnşaatı | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 65 | Karkın Köyü Sondaj+ENH+Motopop ve Terfi Hattı Yapımı | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 66 | Ürküt-Başağaç Grup Yolu BSK Asphalt Yapımı (18km) | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 67 | Çambeyli Köyü Yeni Sondaj Kuyusu Açılması (2022) | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 68 | Rekonstrüksiyon ve Mühendislik Projeleri | Sandıklı Belediyesi | Bitti |
| 69 | Kompost Üretim Tesisi Kurulumu | Sandıklı Belediyesi | Devam Ediyor |
| 70 | Hisar Höyüğü Koruma Duvarı | Sandıklı Belediyesi | Bitti |
| 71 | Jeotermal Su Sondaj Kuyusu Altyapı Çalışmaları | Sandıklı Belediyesi | Bitti |
| 72 | Yerel Ürünler Girişimcilik ve Satış Merkezi | Sandıklı Belediyesi | Bitti |
| 73 | Sosyal Aktivite Parkı ve Aquapark Yapımı | Sandıklı Belediyesi | Bitti |
| 74 | Kütüphane ve Kültür Binası İkmal Yapımı | Sandıklı Belediyesi | Bitti |

SİNANPAŞA

2022

Proje Sayısı
74

Proje Tutarı
492.052.498 TL

Yılı Ödeneği
59.930.101 TL

Yılı Harcaması
38.611.217 TL

KAMU
YATIRIMLARI



2023


Proje Sayısı
61

Proje Tutarı
813.205.874 TL


Yılı Ödeneği
116.234.026 TL

Yılı Harcaması
96.752.117 TL


Fiziki Gerçekleşme

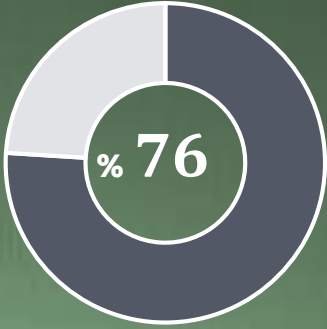


Fiziki Gerçekleşme

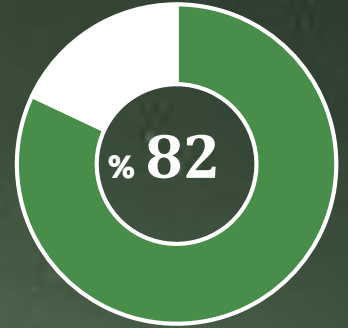

Yılı Harcama Oranı

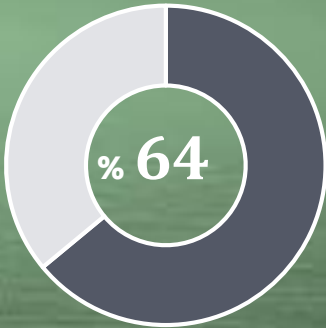

Yılı Harcama Oranı

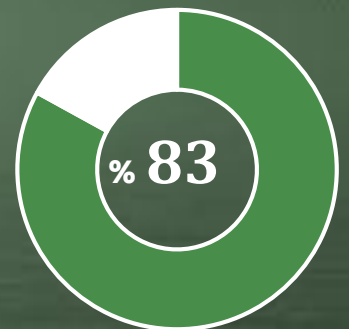

SİNANPAŞA

2023 YILI KAMU YATIRIMLARI

| Sıra No | Projenin Adı | Kurumu | Projenin Durumu |
|---------|--|---|------------------|
| 1 | 26 Ağustos Tabiat Parkı Kilitli Parke Taşı Yapımı | Tarım ve Orman Bk. 5. Bölge Md. | Bitti |
| 2 | 26 Ağustos Tabiat Parkı Misafirhanesi Elektrik Tesisat Tadilatı | Tarım ve Orman Bk. 5. Bölge Md. | Bitti |
| 3 | Kapalı Çelik Konstrüksiyonlu Yarı Olimpik Yüzme Havuzu | Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü | Devam Ediyor |
| 4 | Küçükhüyük Belediyesi Kapalı Pazaryeri | İller Bankası Eskişehir Bölge Md. | İhale Aşamasında |
| 5 | Serban Belediyesi Paket Atıksu Arıtma Tesisi | İller Bankası Eskişehir Bölge Md. | İhale Aşamasında |
| 6 | Kılıçarslan Belediyesi Araç Alım İşi | İller Bankası Eskişehir Bölge Md. | Bitti |
| 7 | Tınaztepe Belediyesi Kilitli Parke Taşı Alımı | İller Bankası Eskişehir Bölge Md. | Bitti |
| 8 | Küçükhüyük Belediyesi Kültür Merkezi Yapımı | İller Bankası Eskişehir Bölge Md. | Bitti |
| 9 | Akören Belediyesi Tekstil Fabrikası Yapımı | İller Bankası Eskişehir Bölge Md. | Bitti |
| 10 | Akören Belediyesi Güneş Enerjisi Santrali Rehabilitasyonu İçin Malzeme Alımı | İller Bankası Eskişehir Bölge Md. | Bitti |
| 11 | Çiğiltepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | İhale Aşamasında |
| 12 | Tokuşlar Köyü Anaokulu | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Devam Ediyor |
| 13 | Kılıçarslan Anaokulu (2 Derslik) | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Bitti |
| 14 | Kılıçarslan Göleti | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | Devam Ediyor |
| 15 | Elvanpaşa Göleti Sulaması | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | Bitti |
| 16 | Çobanözü Tokuşlar Göleti Sulaması | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | Devam Ediyor |
| 17 | Küçükhüyük 6. Kısım YAS Sulama Şebekesi | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | İhale Aşamasında |
| 18 | Kılıçarslan 1.ve 2. YAS Sulama Şebekesi | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | İhale Aşamasında |
| 19 | Tınaztepe Köyü İkmali Taşkın Koruma | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | Bitti |
| 20 | Nuh Köyü 2.Kısım Taşkın Koruma | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | İhale Aşamasında |
| 21 | Güney Beldesi İçmesuyu Deposu | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | Devam Ediyor |
| 22 | Güney Beldesi İsale Hattı | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | İhale Aşamasında |
| 23 | Kilitli Parke Taşı Alımı (Küçükhüyük Belediyesi) | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü | Bitti |
| 24 | Kazıcı Yükleyici Aracı Alımı (Sinanpaşa Belediyesi) | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Md. | Bitti |
| 25 | Kınık Köyü İçme Suyu Hattı | KHGB | Bitti |
| 26 | Tazlar Köyü Yağmur Suyu Kanalı Yapımı | KHGB | Bitti |
| 27 | Akdeğirmen Köyü İçme Suyu Tesisleri Güneş Enerji Sistemi | KHGB | Bitti |

SİNANPAŞA

2023 YILI KAMU YATIRIMLARI

| Sıra No | Projenin Adı | Kurumu | Projenin Durumu |
|---------|--|--------------------------------|-----------------|
| 28 | Afyon-Uşak Yolu BSK Onarımı Yapımı | Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü | Devam Ediyor |
| 29 | Yıldırımkema Köyü Kilitli Beton Parke Yapımı (500 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 30 | Tazlar Köyü Kilitli Beton Parke Yapımı (500 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 31 | Saraycık Köyü Kilitli Beton Parke Yapımı (500 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 32 | Nuh Köyü Kilitli Beton Parke Yapımı (500 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 33 | Kınık Köyü Kilitli Beton Parke Yapımı (500 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 34 | Karacaören Köyü Kilitli Beton Parke Yapımı (500 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 35 | Gezler Köyü Kilitli Beton Parke Yapımı (500 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 36 | Garipçe Köyü Kilitli Beton Parke Yapımı (500 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 37 | Eyice Köyü Kilitli Beton Parke Yapımı (500 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 38 | Elvanpaşa Köyü Kilitli Beton Parke Yapımı (500 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 39 | Çayhisar Köyü Kilitli Beton Parke Yapımı (500 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 40 | Çatkuyu Köyü Kilitli Beton Parke Yapımı (500 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 41 | Bulca Köyü Kilitli Beton Parke Yapımı (500 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 42 | Boyalı Köyü Kilitli Beton Parke Yapımı (500 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 43 | Balmahmut Köyü Kilitli Beton Parke Yapımı (500 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 44 | Ayvalı Köyü Kilitli Beton Parke Yapımı (500 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 45 | Akdeğirmen Köyü Kilitli Beton Parke Yapımı (500 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 46 | Garipçe Köyü İçme Suyu Deposu Küçük Onarımı | KHGB | Bitti |

SİNANPAŞA

2023 YILI KAMU YATIRIMLARI

| Sıra No | Projenin Adı | Kurumu | Projenin Durumu |
|---------|---|----------------------|-----------------|
| 47 | Çayhisar Köyü Yangın Hidrantı Yapımı | KHGB | Bitti |
| 48 | Çobanözü Köyü İçme Suyu İlave Şebeke Yapımı | KHGB | Bitti |
| 49 | Bulca Köyü İçme Suyu Depo Onarımı | KHGB | Bitti |
| 50 | Ayvalı Köyü İçme Suyu Vana Bakım ve Yapımı | KHGB | Bitti |
| 51 | Nuh Köyü Kanalizasyon Altyapısı | KHGB | Bitti |
| 52 | Kınık Köyü Kanalizasyon Altyapısı | KHGB | Bitti |
| 53 | Tokuşlar Köyü Kanalizasyon Yapımı | KHGB | Bitti |
| 54 | Mahalle Tipi Gençlik Merkezi | Sinanpaşa Belediyesi | Bitti |
| 55 | Spor Kompleksi (Sentetik Çim Yüzeyle Futbol Sahasının Kapatılması+Mahalle Tipi Gençlik Merkezi ve Basketbol-Voleybol Sahası) Yapımı | Güney Belediyesi | Bitti |
| 56 | Yörükmezarı-Çayırhisar Köyü 1.ve 2.Kat Asfalt Yapımı (2km) | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 57 | Balmahmut-İğdeli Köyü 1.ve 2.Kat Asfalt Yapımı (4km) | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 58 | Balmahmut-Çatkuş Köyü 1.ve2.Kat Asfalt Yapımı (6km) | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 59 | Boyalı-Kayadibi Köyü 1. ve 2. Kat Asfalt Yapımı (5 km) | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 60 | Boyalı Köyü Kanalizasyon Kısmi Yenileme | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 61 | Kınık Depo İnış Hattı Yapımı | İl Özel İdaresi | Devam Ediyor |

SULTANDAĞI

2022

Proje Sayısı
26

Proje Tutarı
146.685.393 TL

Yılı Ödeneği
59.351.208 TL

Yılı Harcaması
54.415.048 TL

KAMU
YATIRIMLARI



2023


Proje Sayısı
25

Proje Tutarı
265.237.080 TL


Yılı Ödeneği
131.826.913 TL

Yılı Harcaması
126.826.912 TL


Fiziki Gerçekleşme

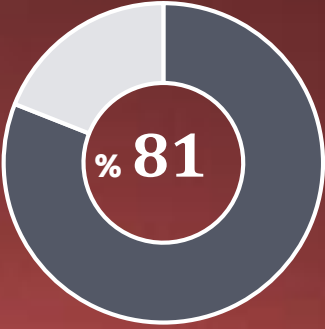


Fiziki Gerçekleşme

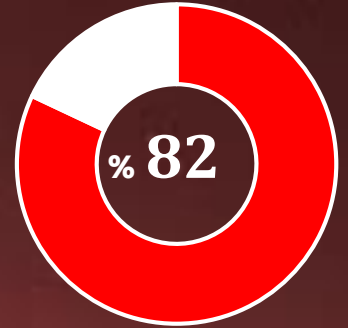

Yılı Harcama Oranı

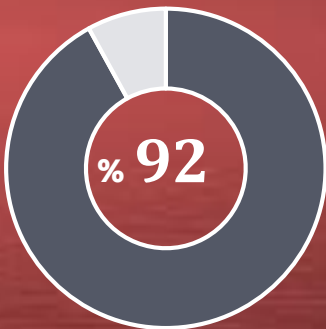

Yılı Harcama Oranı

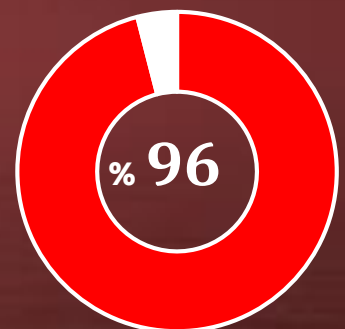

SULTANDAĞI

2023 YILI KAMU YATIRIMLARI

| Sıra No | Projenin Adı | Kurumu | Projenin Durumu |
|---------|--|-----------------------------------|--------------------|
| 1 | Sultandağı Kapı Deresi'nin Dereçine Mahallesi'nde Geçen Kısımlarında Dere Yatağının ve Sanat Yapılarının Düzenlenmesi (İRAP) | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | Projeye Başlanmadı |
| 2 | Sultandağı Kapı Deresi'nin Taşköprü Mahallesi'nde Geçen Kısımlarında Dere Yatağının ve Sanat Yapılarının Düzenlenmesi (İRAP) | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | Projeye Başlanmadı |
| 3 | Yakasenek 1., 2. 3. ve 4. Kısım YAS Sulama Şebekesi | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | Devam Ediyor |
| 4 | Dereçine Regülatörü ve Sulaması İkmali | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | Bitti |
| 5 | Bitüm Malzeme ve Beton Parke Taş Alım | İller Bankası Eskişehir Bölge Md. | İhale Aşamasında |
| 6 | İçmesuyu İnşaatı Yapımı | İller Bankası Eskişehir Bölge Md. | Bitti |
| 7 | Sultandağı Anaokulu | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Devam Ediyor |
| 8 | Yeşil Çiftlik İlkokulu Deprem Güçlendirmesi | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Bitti |
| 9 | Karapınar Köyü Stabilizeden Parke Taşı Yol Yapımı (400 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 10 | Taşköprü Köyü Stabilizeden Parke Taşı Yol Yapımı (400 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 11 | Çukurcak Köyü Stabilizeden Parke Taşı Yol Yapımı (400 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 12 | Üçköyü Köyü Stabilizeden Parke Taşı Yol Yapımı (800 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 13 | Kırca Köyü Stabilizeden Parke Taşı Yol Yapımı (800 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 14 | Yakasenek Köyü Stabilizeden Parke Taşı Yol Yapımı (800 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 15 | Karapınar Köyü İlave İsale Hattı Yapımı | KHGB | Bitti |
| 16 | Çukurcak Köyü İçme Suyu ENH Bakım ve Onarımı | KHGB | Bitti |
| 17 | Karapınar Köyü İçme Suyu Tesisleri Güneş Enerji Sistemi | KHGB | Bitti |
| 18 | Doğancık Köyü İçme Suyu Tesisleri Güneş Enerji Sistemi | KHGB | Bitti |
| 19 | Taşköprü Grup Yolu BSK Asfalt Yapımı (12 km) | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 20 | Yakasenek Güneş Enerji Tarlası Yapımı | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 21 | Kırca Köyü Kanalizasyon İlçe Bağlantısı Yapımı (Püermanet) | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 22 | Yakasenek Köyü Kanalizasyon İlave Şebeke Hattı Yapımı | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 23 | Yakasenek Köyü Şebeke Basınç Kırıcı Vanaların Bakım Onarımı ve Değiştirilmesi | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 24 | Çukurcak-Üçkuyu-Yeniköy Grup Köyleri İçme Suyu Hattı Bakım Onarımı (Püermanet) | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 25 | Yakasenek Köy İçü 1.ve 2.Kat Asfalt Yapımı (2 km) | İl Özel İdaresi | Bitti |

ŞUHUT

2022


Proje Sayısı
89

Proje Tutarı
686.516.714 TL


Yılı Ödeneği
190.461.375 TL

Yılı Harcaması
135.126.374 TL

Fiziki Gerçekleşme

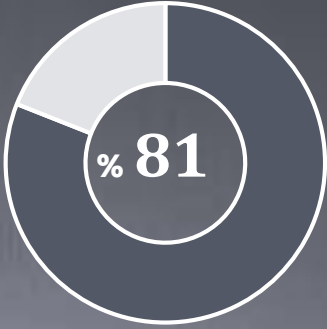

Yılı Harcama Oranı

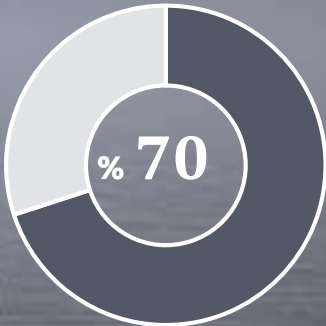

2023


Proje Sayısı
50

Proje Tutarı
1.231.128.521 TL


Yılı Ödeneği
146.829.634 TL

Yılı Harcaması
136.613.576 TL

Fiziki Gerçekleşme

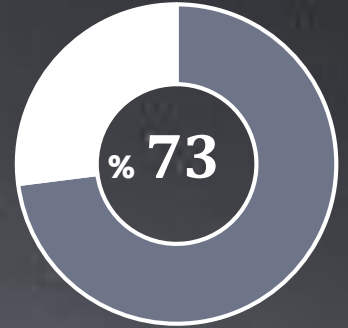

Yılı Harcama Oranı

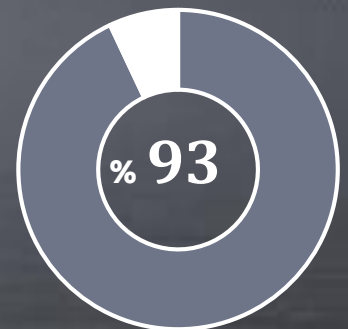

KAMU
YATIRIMLARI



ŞUHUT

2023 YILI KAMU YATIRIMLARI

| Sıra No | Projenin Adı | Kurumu | Projenin Durumu |
|---------|---|---|------------------|
| 1 | Kapalı Çelik Konstrüksiyonlu Yarı Olimpik Yüzme Havuzu | Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü | Devam Ediyor |
| 2 | Beton Parke Taş İle Yol Yapımı | İller Bankası Eskişehir Bölge Md. | Bitti |
| 3 | Kanal Açma ve Temizleme Aracı (Şuhut Belediyesi) | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Md. | Bitti |
| 4 | Karadilli Çok Programlı Lisesi (4 Derslikli) | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Devam Ediyor |
| 5 | Koçyatağı Göleti | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | Devam Ediyor |
| 6 | Başören Tekke Kavaklı Göleti İkmali | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | Devam Ediyor |
| 7 | Arızlı Göleti | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | Devam Ediyor |
| 8 | Başören Tekke Kavaklı Göleti Sulaması | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | İhale Aşamasında |
| 9 | Arızlı Göleti Sulaması | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | İhale Aşamasında |
| 10 | Karaadilli 3. Kısım YAS Sulama Şebekesi | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | Devam Ediyor |
| 11 | Arızlı YAS Sulama | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | Devam Ediyor |
| 12 | Yarışlı Köyü Taşkın Koruması | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | İhale Aşamasında |
| 13 | Kavaklı Köyü Taşkın Koruması | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | İhale Aşamasında |
| 14 | Efeköy Köyü Taşkın Koruması | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | İhale Aşamasında |
| 15 | Çobankaya Köyü Taşkın Koruması | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | İhale Aşamasında |
| 16 | Balçıkhisar Köyü 2. Kısım Taşkın Koruması | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | Devam Ediyor |
| 17 | İçmesuyu Tesisleri | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü | İhale Aşamasında |
| 18 | Başören Köy İçi Kilit Parke Taşı Yol Yapımı (1000 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 19 | İçikli Köy İçi Kilit Parke Taşı Yol Yapımı (1.000 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 20 | Yarışlı Köy İçi 5 Metre Beton Büz Yapımı | KHGB | Bitti |
| 21 | Çakırözü Köy İçi 5 Mt Beton Büz Yapımı | KHGB | Bitti |
| 22 | Çakırözü Köy İçi Kilit Parke Taşı Yol Yapımı (1.000 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 23 | Yarışlı Köy İçi Kilit Parke Taşı Yol Yapımı (1.000 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 24 | Mahmut Köyü İçi Kilit Parke Taşı Yol Yapımı (1.000 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 25 | Kayabelen Köy İçi Kilit Parke Taşı Yol Yapımı (1.000 metrekare) | KHGB | Bitti |

ŞUHUT

2023 YILI KAMU YATIRIMLARI

| Sıra No | Projenin Adı | Kurumu | Projenin Durumu |
|---------|--|-----------------------|------------------|
| 26 | Kavaklı Köy İçi Kilit Parke Taşı Yol Yapımı (1000 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 27 | Güneytepe Köy İçi Kilit Parke Taşı Yol Yapımı (1000 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 28 | Efe Köy İçi Kilit Parke Taşı Yol Yapımı (1000 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 29 | Dadak Köy İçi Kilit Parke Taşı Yol Yapımı (1000 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 30 | Balçıkhisar Köyü Kilitli Parke ve Beton Bordür Yapımı (1.000 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 31 | Atlıhisar Köy İçi Kilit Parke Taşı Yol Yapımı (1000 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 32 | Anayurt Köy İçi Kilit Parke Taşı Yol Yapımı (1000 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 33 | Akyuva Köy İçi Kilit Parke Taşı Yol Yapımı (1000 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 34 | Ağzıkara Köy İçi Kilit Parke Taşı Yol Yapımı (1000 metrekare) | KHGB | Bitti |
| 35 | Atlıhisar Köyü İlave Kanalizasyon Şebeke Hattı Yapımı (Püermanet) | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 36 | Akyuva Köyü Kanalizasyon İlave Şebeke (Püermanet) | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 37 | Güneytepe Köyü Kanalizasyon İlave Şebeke | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 38 | Mahmut Köyü Kanalizasyon İlave Şebeke Yapımı | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 39 | İcikli Köyü Kanalizasyon İlave Şebeke Yapımı | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 40 | İsalı Köyü Kanalizasyon İlave Şebeke Hattı Yapımı | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 41 | Dadak Köyü Yağmur Suyu Hattı | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 42 | Senir Köyü Kanalizasyon İlave Şebeke Hattı Yapımı | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 43 | Hallaç Köyü İlave Şebeke Hattı Yapımı | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 44 | Güneytepe ENH+Motopomp+Terfi Hattı Yapımı | İl Özel İdaresi | Devam Ediyor |
| 45 | Demirbel Köyü Terfi Binası Yapımı | İl Özel İdaresi | Devam Ediyor |
| 46 | Yarışlı Köyü Memba İsale Hattı Yapımı | İl Özel İdaresi | Devam Ediyor |
| 47 | Güneytepe Köyü İçmesuyu Sondaj Yapımı (2022) | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 48 | Köy Yollarına Sıcak Asfalt Yapılması BSK (10km) | İl Özel İdaresi | Bitti |
| 49 | Spor Salonu (500 Seyirci Kapasiteli) | Şuhut Belediyesi | İhale Aşamasında |
| 50 | Nizami Sentetik Çim Yüzeyle Futbol Sahası, Mevcut Yağlı Güreş Sahasına Soyunma Odası ve 500 Seyirci Kapasite Tribün Yapımı | Karaadilli Belediyesi | Bitti |
