



7. BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ
ISPARTA

***AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ
İL KOORDİNASYON KURULU
2.DÖNEM TOPLANTISI
19.04.2024***

- Afyonkarahisar‘da Kuruluşumuzun devam eden 5, ihale aşamasında 5, etüt aşamasında 6 adet ve biten 2 adet projesi mevcuttur.

Sıra	Proje Adı	Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2024 Yılı Ödeneği	Dönem Sonu Harcama	Nakdi Gerç. %	Fiziki Gerç. %
1	Bolvadin TM	80.000.000 TL *	54.003.000,00 TL	10.000.000,00 TL	72.000,00 TL	0,72	45
2	Karaaslan TM	120.000.000TL	-	2.000 TL	-	-	-
3	Afyon-2 T Noktası – İhsaniye EİH Yenileme (TTFO)	1.650.000 TL	2.000 TL	250.000 TL	-	-	-
4	Karahisar GIS TM	135.000.000 TL *	45.215.000	40.000.000 TL	4.111.,00 TL	10,28	50
5	(Afyon-2 - Afyon Çimento) Brş. N. - Karaaslan EİH	16.000.000 TL	2.000 TL	2.000 TL	-	-	-
6	Çay(Seka) TM (Farklı Sahada)	70.000.000 TL	-	2.000 TL	-	-	-
7	İhsaniye TM	10.000 TL	-	7.000 TL	-	-	-
8	Dazkırı TM	100.000.000 TL*	23.280.000 TL	60.000.000 TL	14.445.000 TL	24,08	60
9	Toklucak TM	105.000.000 TL	-	24.000 TL	-	-	-
10	Afyon1 – Uşak EİH (Yenileme)	498.000 TL	2.000 TL	750.000 TL	-	-	-

Not: * İhalesi yapılmış projelerin, Sözleşme bedelleri

- Afyonkarahisar‘da Kuruluşumuzun devam eden 5, ihale aşamasında 5, etüt aşamasında 6 adet ve biten 2 adet projesi mevcuttur.


Sıra	Proje Adı	Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2024 Yılı Ödeneği	Dönem Sonu Harcama	Nakdi Gerç. %	Fiziki Gerç. %
11	(Emirdağ - Çay Seka) Brş. N.- Bolvadin TM EİH	20.888.000 TL*	2.000 TL	2.000 TL	-	-	-
12	İhsaniye - Altıntaş Brş N. EİH	60.000.000 TL	2.000 TL	2.000 TL	-	-	-
13	Dazkırı - (Bozkurt - Dinar) Brş N. EİH	31.124.000 TL*	-	2.000 TL	-	-	-
14	Afyon2 - Eskişehir EİH	5.000.000 TL	100.000 TL	1.030.000 TL	-	-	-
15	Toklucak-(Emirdağ-Sivrihisar) Brş N. EİH	2.430.000 TL	2.000 TL	365.000 TL	-	-	-
16	Seydişehir – Afyon2 EİH (Yenileme)	5.230.000 TL	-	1.535.000 TL	-	-	-
	TOPLAM	757.312.000 TL	122.610.000 TL	137.949.000 TL	18.628.000 TL	13,50	21,59

Not: * İhalesi yapılmış projelerin, Sözleşme bedelleri

DEVAM EDEN PROJELERİMİZ

1. 154 kV KARAHİSAR GAZ İZOLELİ TRANSFORMATÖR MERKEZİ

- Sözleşme Tarihi: 07/10/2022
- Sözleşme Bedeli: 135.000.000 TL
- İş Başlama Tarihi: 17/11/2022
- İş Bitiş Tarihi (Güncellendi): 26/10/2024
- 2024 Yılı Ödeneği: 45.215.000 TL
- Dönem Sonu Harcama: 4.111.000 TL
- 17.11.2022 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.
 - Tesis çalışmaları devam etmektedir.

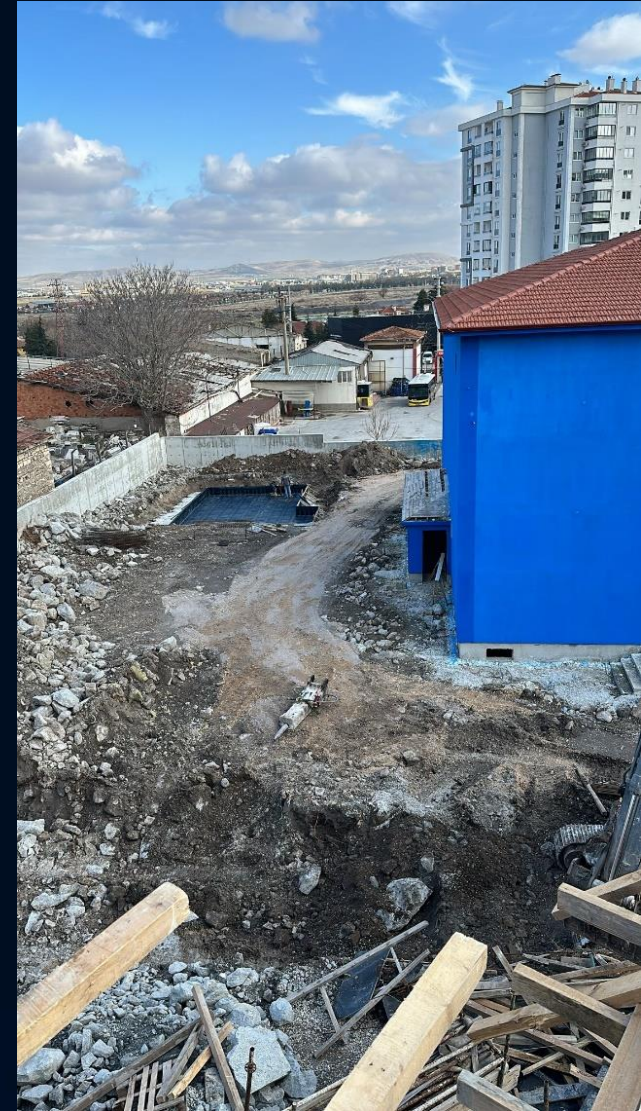

1. 154 kV KARAHİSAR GAZ İZOLELİ TRANSFORMATÖR MERKEZİ



2. 154 kV BOLVADİN TRANSFORMATÖR MERKEZİ

- Sözleşme Tarihi: 26/09/2022
- Sözleşme Bedeli: 80.000.000,00 TL
- İş Başlama Tarihi: 03/10/2022
- İş Bitiş Tarihi (Güncellendi): 12/08/2024
- 2024 Yılı Ödeneği: 54.003.224,08 TL
- Dönem Sonu Harcama: 72.000 TL
- 03/10/2022 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.
- Tesis çalışmaları devam etmektedir.



2. 154 kV BOLVADİN TRANSFORMATÖR MERKEZİ




3. DAZKIRI TRAFİKO MERKEZİ

- Proje Bedeli: 81.417.000 TL
- Sözleşme Tarihi: 27/04/2023
- Sözleşme Bedeli: 100.000.000 TL
- İş Başlama Tarihi: 06/05/2023
- İş Bitiş Tarihi: 27/08/2024
- 2024 Yılı Ödeneği : 23.280.000 TL
- Dönem Sonu Harcama: 14.445.000 TL
- 06.05.2023 tarihinde Yer teslimi yapılmıştır.
- Tesis çalışmaları devam etmektedir.



3. DAZKIRI TRAFİKO MERKEZİ

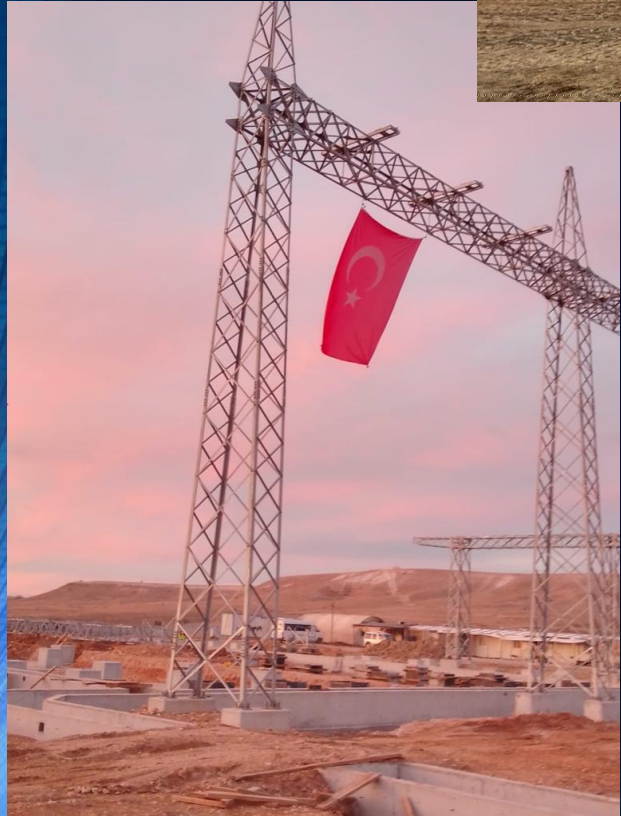

4. (EMİRDAĞ – ÇAY SEKA) BRŞ. N. – BOLVADİN EİH

- Hat uzunluğu: 1+1 km (İki ayrı hat)
- 2024 Yılı Ödeneği : 2.000 TL
- Önceki Yıllar Harcaması: 2.000 TL
- Proje Bedeli: 20.888.000 TL
- İhale Bedeli: 20.887.735,97 TL
- Teşekkülümüz Yatırım Programında 2022D00-175939-176934 proje numarası ile yer alan 154 kV, 1272 MCM karakteristiğinde, yaklaşık 1+1 km. uzunluğunda iki ayrı hat şeklinde tesis edilecektir.
- 02.01.2024 Tarihinde sözleşme imzalanmış olup; 16.01.2024 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Zemin etüt çalışmalarına başlanmıştır.

5. DAZKIRI – (BOZKURT – DİNAR) BRŞ.N. EİH

- Hat uzunluğu: Yaklaşık 3+3 km (İki ayrı hat)
- 2024 Yılı Ödeneği : 2.000 TL
- Proje Bedeli: 31.124.000 TL.
- İhale Bedeli: 31.124.000 TL
- Teşekkülümüz Yatırım Programında 2023D00-194708-211555 proje numarası ile yer alan 154 kV, 1272 MCM karakteristiğinde, bağlantı hattımız iki ayrı hat şeklinde tesis edilecektir.
- 25.01.2024 Tarihinde sözleşme imzalanmış olup; 07.02.2024 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Zemin etüt çalışmalarına başlanmıştır.

İHALE AŞAMASINDAKİ PROJELERİMİZ

1. 154 kV KARAASLAN TRANSFORMATÖR MERKEZİ

- 154 kV Trafo Merkezi Tesisi (Karaaslan TM).
- Proje Bedeli: 120.000.000 TL
- 2024 Yılı Ödeneği: 2.000 TL
- Karaaslan TM Mera Vasıf Değişikliği değişikliği talebimiz Mera Komisyonu tarafından henüz sonuçlanmamıştır.
- İstinaf Mahkemesi süreci kararı Teşekkülümüz lehine sonuçlanmıştır.

2. ÇAY (SEKA) TM YENİLEME (FARKLI SAHADA)

- 154 kV Trafo Merkezi Tevsiyat (Çay (Seka) TM).
- Proje Bedeli: 70.000.000 TL
- 2024 Yılı Ödeneği: 2.000 TL
- Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş., İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı ile Bölge Müdürlüğümüzce mahallinde incelemeler yapılmıştır.
- Mevcut trafo merkezinde OG Şalt ve Kumanda Binası yenilemesi yerine Bolvadin TM tesisi sonrasında Çay(Seka) Trafo Merkezinin farklı bir sahada yenilenmesi konusunda mutabık kalınmış olup, alternatif saha çalışmalarımız devam etmektedir.

3. TOKLUCAK TRAFİ MERKEZİ

- 154 kV Trafo Merkezi Tesisi (Toklucak TM)
- Proje Bedeli: 105.000.000 TL
- 2024 Yılı Ödeneđi: 24.000 TL
- İhale öncesi hazırlık çalışmaları tamamlanmış olup; ihale edilmeye hazır durumdadır.

4. (AFYON-2 - AFYON ÇİMENTO) BRŞ. N. - KARAASLAN EİH

- Hat uzunluğu: 2+2 km.
- 2024 Yılı Ödeneği : 2.000 TL
- Önceki Yıllar Harcaması : 2.000 TL
- Proje Bedeli: 16.000.000 TL.
- Teşekkülümüz Yatırım Programında 20D000012-23 proje numarası ile yer alan 154 kV, 1272 MCM karakteristiğinde, yaklaşık 2+2 km. uzunluğunda iki ayrı hat şeklinde tesis edilecek bağlantı hattımız için etüt süreci devam etmektedir.



5. İHSANİYE – ALTINTAŞ BRŞ.N. EİH

- Hat uzunluğu: Yaklaşık 16 km
- 2024 Yılı Ödeneği : 2.000 TL
- Önceki Yıllar Harcaması : 2.000 TL
- Proje Bedeli: 60.000.000 TL.
- Teşekkülümüz Yatırım Programında 2020D00-149430-149468 proje numarası ile yer almaktadır.
- Etüt çalışmaları devam etmektedir.
- ÇED'e tabi olup; ÇED süreci devam etmektedir

ETÜTLER GRUBUNDAKİ PROJELERİMİZ


1. AFYON-2 - ESKİŞEHİR EİH

- Hat uzunluğu: 125 km.
- Önceki Yıllar Harcaması : 100.000 TL
- 2024 Yılı Ödeneği : 1.030.000 TL
- Proje Bedeli: 5.000.000 TL.
- Teşekkülümüz Yatırım Programında 20D000011-22 proje numarası ile etütler grubunda yer alan 400 kV, 3 B 1272 MCM karakteristiğinde, yaklaşık 125 km. uzunluğundaki Afyon2 - Eskişehir EİH projemiz için kurumlardan altlıklar toplanmaya başlanmıştır.
- Güzergah belirleme çalışmaları devam etmektedir.

2. TOKLUCAK -(EMİRDAĞ – SİVRİHİSAR) BRŞ. N. EİH

- Hat uzunluğu: 20+20 km.
- Önceki Yıllar Harcaması : 2.000 TL
- 2024 Yılı Ödeneği : 365.000 TL
- Proje Bedeli: 2.430.000 TL.
- 154 kV, 1272 MCM karakteristiğinde, yaklaşık 20+20 km. uzunluğunda iki ayrı hat şeklinde tesis edilecek hattımız için ihale öncesi çalışmalarımız devam etmektedir.
- ÇED'e tabi olup; ÇED süreci devam etmektedir.

3. AFYON-2 T NOKTASI - İHSANIYE EİH (TTFO)

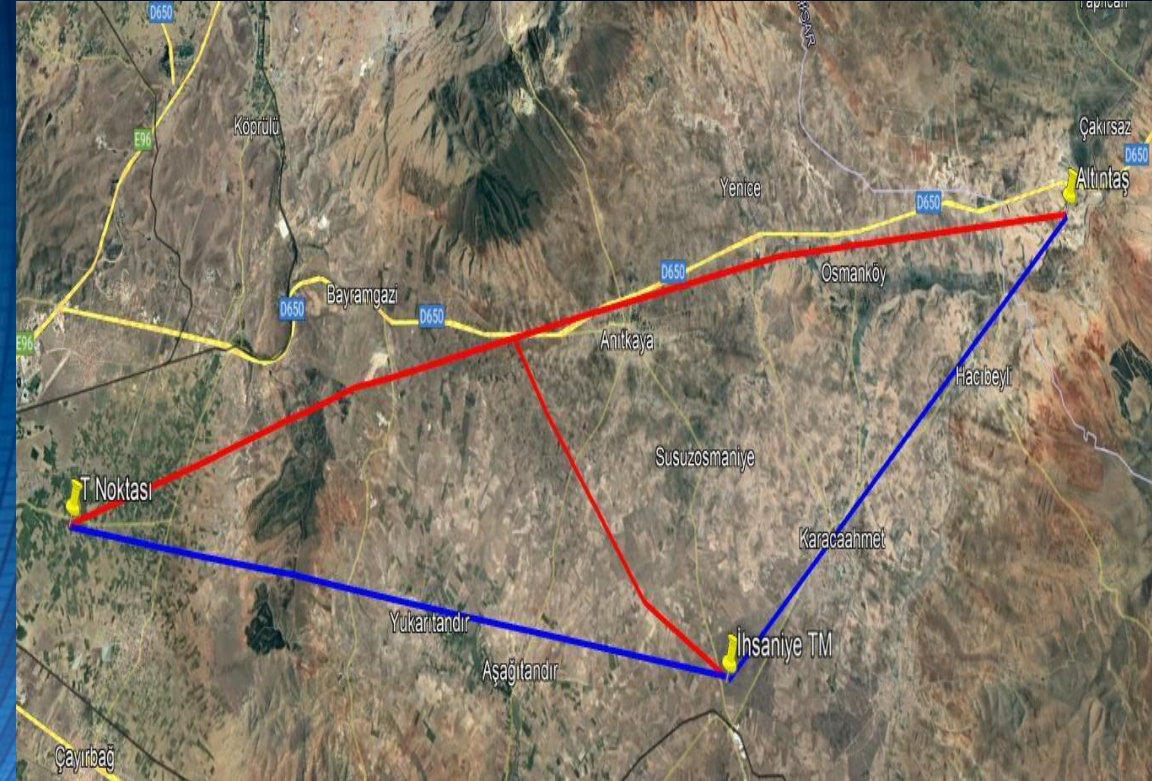

- Hat uzunluğu: 25 km.
- Önceki Yıllar Harcaması : 2.000 TL
- 2024 Yılı Ödeneği : 250.000 TL
- Proje Bedeli: 1.650.000 TL
- İhsaniye TM'nin Altıntaş ve Afyon2 TM'lerin arasına girmesi ile TM bağlantılarının Afyon- 2 T Noktası – İhsaniye ve İhsaniye – Altıntaş olacak şekilde revize edilmiştir.
- Etüt çalışmaları devam etmektedir.
- ÇED'e tabi olup; ÇED süreci devam etmektedir.

4. AFYON 1 – UŞAK EİH (Yenileme)

- Hat Uzunluğu: 15+66 km.
- Proje Bedeli: 4.980.000 TL
- Önceki Yıllar Harcaması: 2.000 TL
- 2024 Yılı Ödeneği: 750.000 TL
- Plan – Profil ve Tevziat Çalışmaları tamamlanan hattımız Uşak Karma OSB hattı ile eş zamanlı ihale edilecektir.
- Teşekkülümüz Yatırım Programında 18D00290-16 proje numarası ile yer alan hat 154 kV, 1272 MCM karakteristiğinde, yaklaşık 81 km., uzunluğunda hattımızın projemizin arazi ölçümü, plan, profil ve tevziat çalışmaları tamamlanmıştır. ihale öncesi çalışmalarımız devam etmektedir.



5. İHSANİYE TRAFİO MERKEZİ

- 154 kV Trafo Merkezi (İhsaniye TM).
- Proje Bedeli: 10.000 TL
- 2024 Yılı Ödeneđi: 7.000 TL
- İhale öncesi hazırlık çalışmaları tamamlanmış olup; Yıl içerisinde ihale edilmesi beklenmektedir.

6. SEYDİŞEHİR – AFYON2 EİH (YENİLEME))


- Hat uzunluğu: 190 km.
- Proje Bedeli: 5.230.000 TL
- 2024 Yılı Ödeneđi: 1.535.000 TL
- Teşekkülümüz 2024 yılı yatırım programına 24D000011-2 proje numarası ile dahil olan hattımızın etüt çalışmaları devam etmektedir.

TAMAMLANMIŞ PROJELERİMİZ

1. 380 kV KONYA KUZEY- ILGIN TES – AFYON 2 E.İ.H.



- Toplam Hat Uzunluğu: 120 km.
- Sözleşme Bedeli: 179.199.481,70 TL
- Önceki Yıllar Harcaması: 90.236.000TL
- 2023 Yılı Ödeneği: 392.157.176 TL
- Dönem Sonu Harcama:392.157.176 TL
- Konya Kuzey-Ilgın TES-Afyon 2 EİH 2 kısım halinde ihale edilmiştir.
- Genel Müdürlüğümüzce proje bedeli 900.000.000 TL olarak güncellenmiştir.
- Tesis çalışmaları 20.12.2023 tarihinde tamamlanmış olup; geçici kabulü 05.03.2024 yapılarak hat enerjilendirilmiştir.

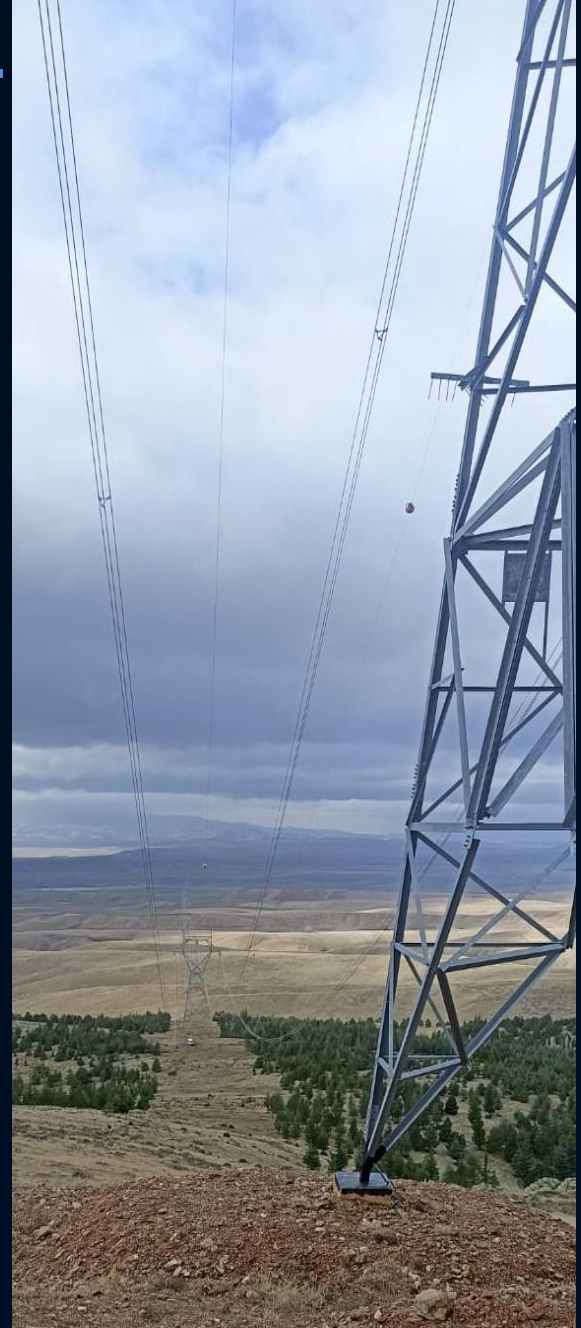

2. 154 kV İSCEHİSAR TM – EMİRDAĞ TM E.İ.H.

- Toplam Hat Uzunluğu: 40 km.
- Sözleşme Bedeli: 104.094.424,79 TL
- 2023 Yılı Ödeneği: 104.094.424,79 TL
- Dönem Sonu Harcama: 104.094.424,79 TL
- İscehisar TM ile Emirdağ TM arasındaki bağlantı hattı.
- 13.05.2022 tarih ve 31384 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5546 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı çerçevesinde 27.06.2022 tarihli ve 1291872 sayılı Genel Müdürlük Olur’u ile iş tasfiye edilmiştir. Fesih sonrası yeni ihale yapıldı 29.03.2023 tarihinde sözleşme imzalandı.
- Tesis çalışmaları tamamlanarak 22.12.2023 Tarihinde geçici kabulü yapılarak enerjilendirilmiştir.





“Enerjinin Gücü”

    / kurumsalteias
www.teias.gov.tr

Saygılarımla arz ederim.

Ramazan AYYILDIZ
TEİAŞ 7. Bölge Müdürü
