



7. BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ
ISPARTA

***AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ
İL KOORDİNASYON KURULU
2. DÖNEM TOPLANTISI
18.04.2025***

Afyonkarahisar'da Kuruluşumuza Ait Projelerin Aşama ve Süreçleri

TEİAŞ

Etütler		Devam Eden Projeler		İhale Sürecindekiler		Tamamlanan Projeler	
TM	EİH	TM	EİH	TM	EİH	TM	EİH
İhsaniye TM	Afyon1 – Uşak EİH (Yenileme)	Bolvadin TM	-	Karaaslan TM	(Afyon-2 - Afyon Çimento) Brş. N. - Karaaslan EİH		
Afyon3 TM Tevsiat (1 Fider Sandıklı)	Afyon-2 T Noktası - İhsaniye EİH	Karahisar GIS	-	Çay(Seka) TM Yenileme (Farklı Sahada)	İhsaniye - Altıntaş Brş N. EİH (TTFO)		
Sandıklı TM Tevsiat (1 Fider Afyon 3)	Toklucak - (Emirdağ - Sivrihisar) Brş N. EİH	Dazkırı TM	-	154 kV Toklucak TM	400 kV Seydişehir – Afyon2 EİH(Yenileme)		
-	400 kV Afyon2 - Eskişehir EİH	-	-	-	-		
-	Çivril-Sandıklı E.İ.H (Yenileme)	-	-	-	-		
	Sandıklı-Eber RES Brş.N E.İ.H (Yenileme)						

Afyonkarahisar'da Kuruluşumuza Ait Projelerin Aşama ve Süreçleri

Etütler		Devam Eden Projeler		İhale Sürecindekiler		Tamamlanan Projeler	
TM	EİH	TM	EİH	TM	EİH	TM	EİH
	Eber RES Brş.N- Çayseka E.İ.H (Yenileme)						
	Çayseka-Emirdağ E.İ.H (Yenileme)						
	Afyon1-Afyon2 E.İ.H (Yenileme)						
	(Çayseka-Emirdağ) Brş.N-DDY Gömü T Bağlantı Hattı						
	Emirdağ-Sivrihisar E.İ.H (Yenileme)						
	Afyon 3 – Sandıklı EİH						

Afyonkarahisar'da Kuruluşumuzun devam eden 3, ihale aşamasında 6, etüt aşamasında 15 adet projesi mevcuttur.

Sıra	Proje Adı	Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2025 Yılı Ödeneği	Dönem Sonu Harcama	Nakdi Gerç. %	Fiziki Gerç. %
1	Bolvadin TM	92.000.000 TL	57.000.000 TL	35.000.000 TL	-	-	35
2	Karaaslan TM	156.840.000TL	-	-	-	-	-
3	Afyon-2 T Noktası- İhsaniye EİH	1.980.000 TL	3.000 TL	375.000 TL	-	-	-
4	Karahisar GIS TM	160.000.000 TL	110.000.000 TL	50.000.000 TL	-	-	45
5	(Afyon-2 –Afyon Çimento) Brş. N.-Karaaslan EİH	20.000.000 TL	2.000 TL	1.000.000 TL	-	-	-
6	Çay(Seka) TM Yenileme (Farklı Sahada)	91.490.000 TL	2.000 TL	2.000 TL	-	-	-
7	İhsaniye TM	15.000 TL	-	2.000 TL	-	-	-
8	Dazkırı TM	106.420.000TL	90.000.000 TL	-	-	-	90
9	Toklucak TM	137.235.000 TL	-	25.000.000 TL	-	-	-
10	400 kV Afyon2 - Eskişehir EİH	4.800.000 TL	150.000 TL	2.000.000 TL	-	-	-

Afyonkarahisar'da Kuruluşumuzun devam eden 3, ihale aşamasında 6, etüt aşamasında 15 adet projesi mevcuttur.

Sıra	Proje Adı	Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2025 Yılı Ödeneği	Dönem Sonu Harcama	Nakdi Gerç. %	Fiziki Gerç. %
11	154 kV Afyon1 – Uşak EİH (Yenileme)	4.781.000 TL	3.000 TL	780.000 TL	-	-	-
12	154 kV İhsaniye - Altıntaş Brş N. EİH	70.000.000 TL	2.000 TL	2.000 TL	-	-	-
13	154 kV Toklucak-(Emirdağ-Sivrihisar) Brş N. EİH	2.920.000 TL	3.000 TL	365.000 TL	-	-	-
14	400 kV Seydişehir – Afyon2 EİH (Yenileme)	2.400.000.000 TL	-	120.000.000 TL	-	-	-
15	154 kV Afyon 3 – Sandıklı EİH	4.000.000 TL		400.000 TL			
16	Afyon3 TM Tevsiat (1 Fider Sandıklı)	15.000 TL	-	10.000 TL			
17	Sandıklı TM Tevsiat (1 Fider Afyon 3)	15.000 TL	-	10.000 TL			
18	154 kV Çivril-Sandıklı E.İ.H (Yenileme)	5.864.000 TL	-	587.000 TL			
19	154 kV Sandıklı-Eber RES Brş.N E.İ.H (Yenileme)	3.310.000 TL	-	330.000 TL			
20	154 kV Eber RES Brş.N-Çayseka E.İ.H (Yenileme)	3.893.000 TL	-	390.000 TL			

Afyonkarahisar'da Kuruluşumuzun devam eden 3, ihale aşamasında 6, etüt aşamasında 15 adet projesi mevcuttur.

Sıra	Proje Adı	Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2025 Yılı Ödeneği	Dönem Sonu Harcama	Nakdi Gerç. %	Fiziki Gerç. %
21	154 kV Emirdağ-Sivrihisar E.İ.H (Yenileme)	5.435.000 TL	-	540.000 TL			
22	154 kV Emirdağ- Çayseka E.İ.H (Yenileme)	5.623.000 TL	-	500.000 TL			
23	154 kV Afyon1-Afyon2 E.İ.H (Yenileme)	500.000 TL	-	50.000 TL			
24	154 kV (Çayseka -Emirdağ) Brş.N-DDY Gömü T Bağlantı Hattı	1.000.000 TL	-	10.000 TL			
	TOPLAM	3.278.136.000 TL	257.165.000 TL	237.353.000 TL	-	-	6,10

DEVAM EDEN PROJELERİMİZ

154 kV KARAHİSAR GAZ İZOLELİ TRANSFORMATÖR MERKEZİ

- Sözleşme Tarihi: 07/10/2022
- Sözleşme Bedeli: 160.000.000 TL
- İş Başlama Tarihi: 17/11/2022
- Süre Uzatımlı İş Bitiş Tarihi: 24.08.2025
- 2025 Yılı Ödeneği: 50.000.000 TL
- Dönem Sonu Harcama: -
- 17.11.2022 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.
- Yüklenici firma konkordato ilan etmiş olup tesis çalışmaları devam etmemektedir.



154 kV KARAHİSAR GAZ İZOLELİ TRANSFORMATÖR MERKEZİ



154 kV KARAHİSAR GAZ İZOLELİ TRANSFORMATÖR MERKEZİ



154 kV BOLVADİN TRANSFORMATÖR MERKEZİ

- Sözleşme Tarihi: 26/09/2022
- Sözleşme Bedeli: 92.000.000 TL
- İş Başlama Tarihi: 03/10/2022
- Süre Uzatımlı İş Bitiş Tarihi: 16.05.2025
- 2025 Yılı Ödeneği: 35.000.000 TL
- Dönem Sonu Harcama: -
- 03/10/2022 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.
- Yüklenici tarafından herhangi bir çalışma yapılmamaktadır.



154 kV BOLVADİN TRANSFORMATÖR MERKEZİ



154 kV DAZKIRI TRAFO MERKEZİ

- Sözleşme Tarihi: 27/04/2023
- Sözleşme Bedeli: 106.420.000 TL
- İş Başlama Tarihi: 06/05/2023
- Süre Uzatımlı İş Bitiş Tarihi: 09.03.2025
- 06.05.2023 Tarihinde Yer teslimi yapılmıştır.
- Yüklenici firma konkordato ilan etmiş olup tesis çalışmaları devam etmemektedir.
- Yüklenici firmaya Genel Müdürlüğümüz tarafından Mart ayı sonuna kadar işe başlaması için uyarı yazısı yazılmıştır.



154 kV DAZKIRI TRAFİO MERKEZİ



154 kV DAZKIRI TRAFİO MERKEZİ



İHALE AŞAMASINDAKİ PROJELERİMİZ

İHALE AŞAMASINDAKİ TRAFİ MERKEZİ PROJELERİMİZ

154 kV KARAASLAN TM

- 154 kV Trafo Merkezi Tesisi (Karaaslan TM).
- Proje Bedeli: 156.840.000 TL
- İstinaf Mahkemesi süreci kararı Teşekkülümüz lehine sonuçlanmıştır.
- Karaaslan TM Mera Vasıf Değişikliği talebimiz Mera Komisyonu tarafından reddedilmiştir.
- Yeni yer seçim çalışmalarımız devam etmektedir.

154 kV ÇAY (SEKA) TM YENİLEME (FARKLI SAHADA)

- 154 kV Trafo Merkezi Yenileme (Çay (Seka) TM).
- Proje Bedeli: 9 1 .490.000 TL
- 2025 Yılı Ödeneği : 2.000 TL
- Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş., İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı ile Bölge Müdürlüğümüzce mahallinde incelemeler yapılmıştır.
- Mevcut Trafo merkezinde OG Şalt ve Kumanda Binası yenilemesi yerine Bolvadin TM tesisi sonrasında Çay(Seka) Trafo Merkezinin farklı bir sahada yenilenmesi konusunda mutabık kalınmış olup, alternatif saha çalışmalarımız devam etmektedir.

İHALE AŞAMASINDAKİ TRAFO MERKEZİ PROJELERİMİZ

154 kV TOKLUCAK TRAFO MERKEZİ

- 154 kV Trafo Merkezi Tesisi (Toklucak TM)
- Proje Bedeli: 137.235.000 TL
- 2025 Yılı Ödeneği : 25.000.000 TL
- İhale öncesi hazırlık çalışmaları tamamlanmış olup; ihale edilmeye hazır durumdadır.

154 kV İHSANİYE – ALTINTAŞ BRŞ.N. EİH

- Hat uzunluğu: ≈ 16 km
- Proje Bedeli: 70.000.000 TL.
- 2025 Yılı Ödeneği : 2.000 TL
- Teşekkülümüz Yatırım Programında 2020D00-149430-149468 proje numarası ile yer almaktadır.
- Etüt çalışmaları devam etmektedir.
- ÇED’e tabi olup; ÇED süreci devam etmektedir


154 kV (AFYON-2 - AFYON ÇİMENTO) BRŞ. N. - KARAASLAN EİH

- Hat uzunluğu: 2+2 km.
- Proje Bedeli: 20.000.000 TL.
- 2025 Yılı Ödeneği : 1.000.000 TL
- Teşekkülümüz Yatırım Programında 20D000012-23 proje numarası ile yer alan 154 kV, 1272 MCM karakteristiğinde, yaklaşık 2+2 km. uzunluğunda iki ayrı hat şeklinde tesis edilecek bağlantı hattımız için etüt süreci devam etmektedir.

İHALE AŞAMASINDAKİ ELEKTRİK İLETİM HATTI PROJELERİMİZ

400 kV Seydişehir – Afyon2 EİH Yenileme


- Hat uzunluğu: ≈ 190 km
- Proje Bedeli: 2.400.000.000 TL.
- 2025 Yılı Ödeneği : 120.000.000 TL
- Teşekkülümüz Yatırım Programında 2025D00-248458 proje numarası ile yer almaktadır.
- Etüt çalışmaları devam etmektedir.

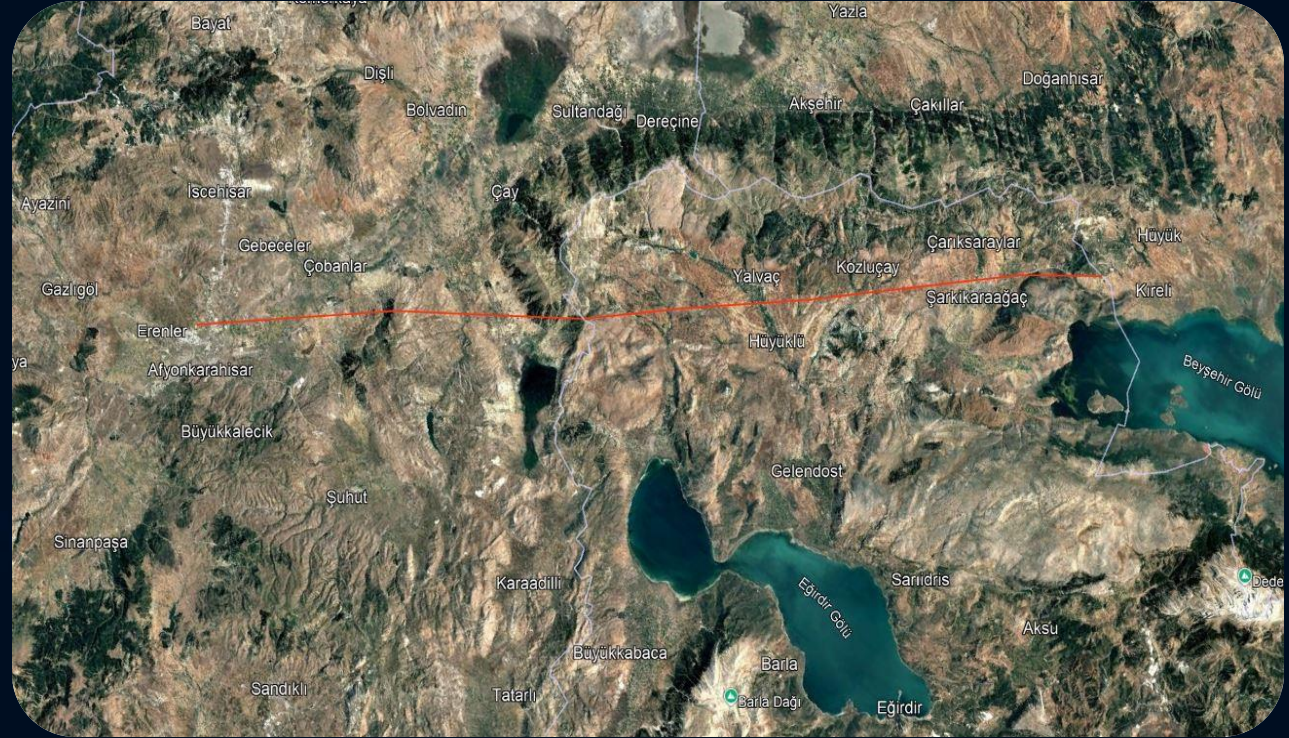

ETÜTLER GRUBUNDAKİ PROJELERİMİZ

154 kV İHSANİYE TRAFO MERKEZİ

- 154 kV Trafo Merkezi (İhsaniye TM).
- Proje Bedeli: 15.000 TL
- 2025 Yılı Ödeneği : 2.000 TL
- İhale öncesi hazırlık çalışmaları tamamlanmış olup; Yıl içerisinde ihale edilmesi beklenmektedir.

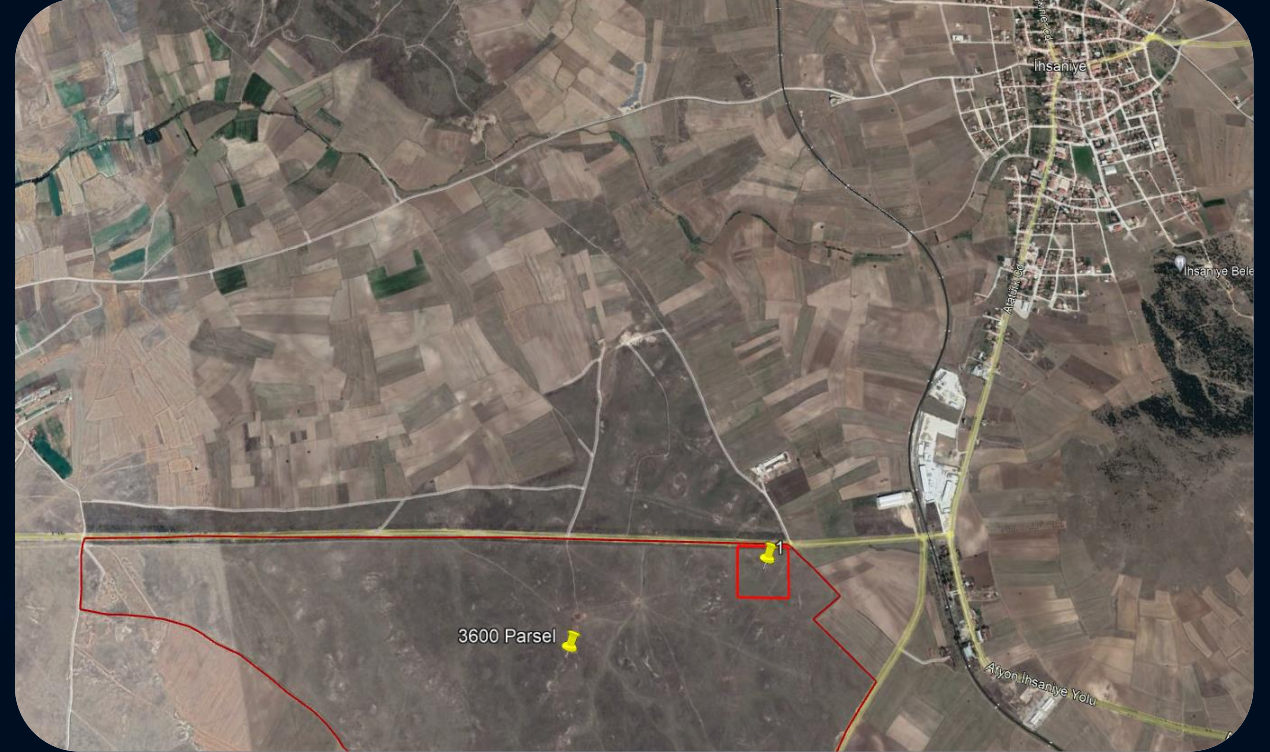

154 kV TOKLUCAK -(EMİRDAĞ – SİVRİHİSAR) BRŞ. N. EİH

- Hat uzunluğu: 20+20 km.
- Proje Bedeli: 2.920.000 TL.
- 2025 Yılı Ödeneği : 365.000 TL
- 154 kV, 1272 MCM karakteristiğinde, yaklaşık 20+20 km. uzunluğunda iki ayrı hat şeklinde tesis edilecek hattımız için ihale öncesi çalışmalarımız devam etmektedir.
- ÇED’e tabi olup; ÇED süreci devam etmektedir.

400 kV AFYON 2 TM - ESKİŞEHİR EİH

- Hat uzunluğu: 125 km.
- Proje Bedeli: 4.800.000 TL.
- 2025 Yılı Ödeneği : 2.000.000 TL
- Teşekkülümüz Yatırım Programında 20D000011-22 proje numarası ile etütler grubunda yer alan 400 kV, 3 B 1272 MCM karakteristiğinde, yaklaşık 125 km. uzunluğundaki Afyon2 - Eskişehir EİH projemiz için kurumlardan altlıklar toplanmaya başlanmıştır.
- Güzergah tespit çalışmaları devam etmektedir.

Afyon-3 TM Tevsiat

- Proje Bedeli: 15.000 TL.
- 2025 Yılı Ödeneği : 10.000 TL
- Afyon 3 TM'ye Sandıklı fider ilavesi

Sandıklı TM Tevsiat

- Proje Bedeli: 15.000 TL.
- 2025 Yılı Ödeneği : 10.000 TL
- Sandıklı TM'ye Afyon 3 fider ilavesi

Afyon-3 - Sandıklı EİH

- Hat uzunluğu: 45 km.
- Proje Bedeli: 4.000.000 TL.
- 2025 Yılı Ödeneği : 400.000 TL
- Bölgenin artan enerji ihtiyacının karşılanması için Afyon3 TM'den Sandıklı TM'ye yeni hat etüdü devam etmektedir.

Çivril - Sandıklı EİH Yenileme

- Hat uzunluğu: 63 km.
- Proje Bedeli: 5.864.000 TL.
- 2025 Yılı Ödeneği : 587.000 TL
- Etüt çalışmaları devam etmektedir.

Sandıklı - Eber RES Brş N. EİH Yenileme

- Hat uzunluğu: 34 km.
- Proje Bedeli: 3.310.000 TL.
- 2025 Yılı Ödeneği : 330.000 TL
- Etüt çalışmaları devam etmektedir.


Eber RES Brş. N. - Çayseka EİH Yenileme

- Hat uzunluğu: 40 km.
- Proje Bedeli: 3.893.000 TL.
- 2025 Yılı Ödeneği : 390.000 TL
- Etüt çalışmaları devam etmektedir.

ETÜTLER GRUBUNDA BULUNAN PROJELERİMİZ

Emirdağ - Sivrihisar EİH Yenileme

- Hat uzunluğu: 58 km.
- Proje Bedeli: 5.435.000 TL.
- 2025 Yılı Ödeneği : 540.000 TL
- Etüt çalışmaları devam etmektedir.

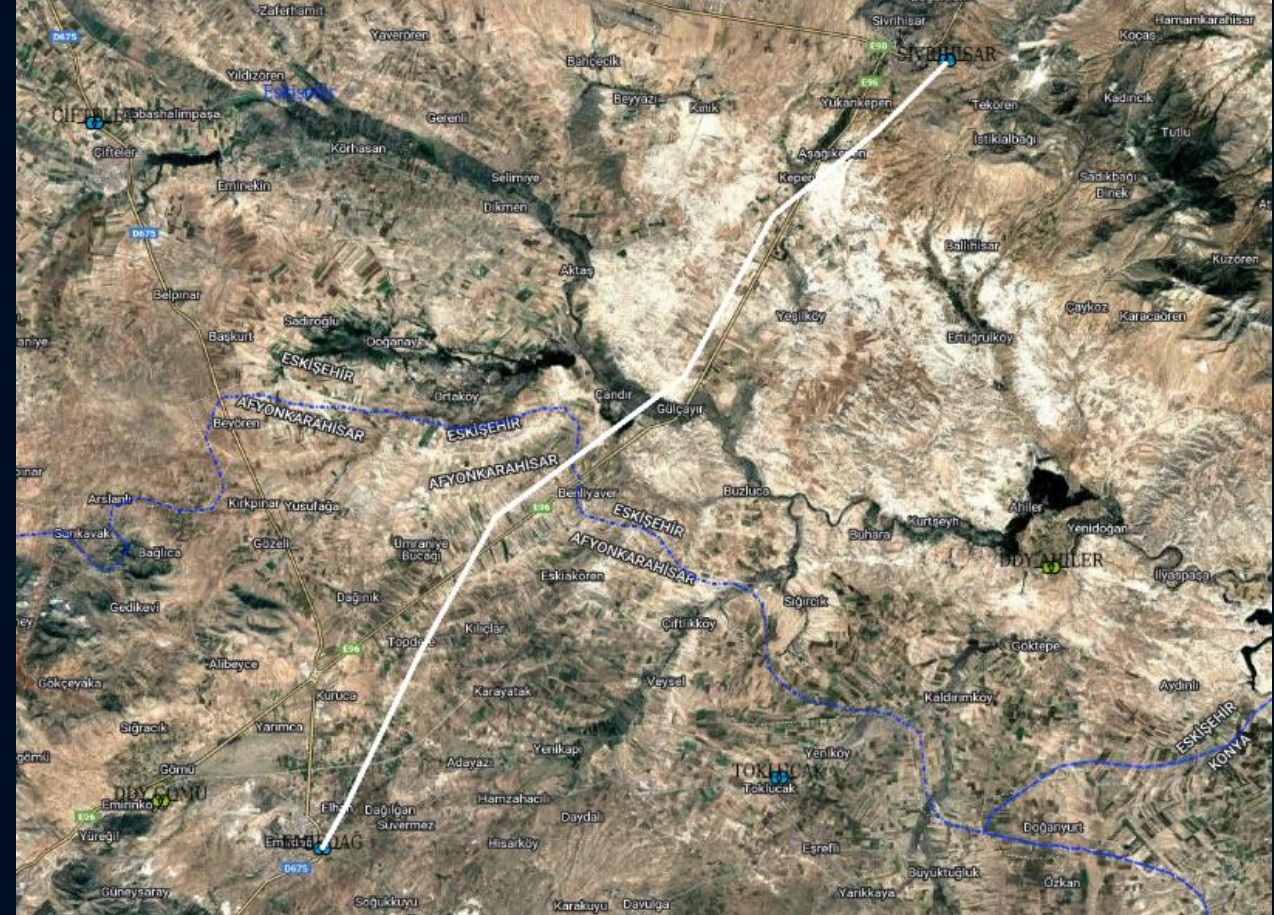

Çayseka - Emirdağ EİH Yenileme

- Hat uzunluğu: 60 km.
- Proje Bedeli: 5.623.000 TL.
- 2025 Yılı Ödeneği : 500.000 TL
- Etüt çalışmaları devam etmektedir.



ETÜTLER GRUBUNDA BULUNAN PROJELERİMİZ

Afyon-1 - Afyon-2 EİH Yenileme




- Hat uzunluğu: 6 km.
- Proje Bedeli: 500.000 TL.
- 2025 Yılı Ödeneği : 50.000 TL
- Etüt çalışmaları devam etmektedir.

(Çayseka - Emirdağ) Brş N – DDY Gömü T Bağlantı Hattı

- Hat uzunluğu: 10 km.
- Proje Bedeli: 1.000.000 TL.
- 2025 Yılı Ödeneği : 10.000 TL
- Etüt çalışmaları devam etmektedir.

154 kV AFYON-2 T NOKTASI - İHSANİYE EİH (TTFO)

- Hat uzunluğu: 25 km.
- Proje Bedeli: 2.000.000 TL
- 2025 Yılı Ödeneği : 375.000 TL
- İhsaniye TM'nin Altıntaş ve Afyon2 TM'lerin arasına girmesi ile TM bağlantılarının Afyon- 2 T Noktası – İhsaniye ve İhsaniye – Altıntaş olacak şekilde revize edilmiştir.
- Etüt çalışmaları devam etmektedir.
- ÇED'e tabi olup; ÇED süreci devam etmektedir.

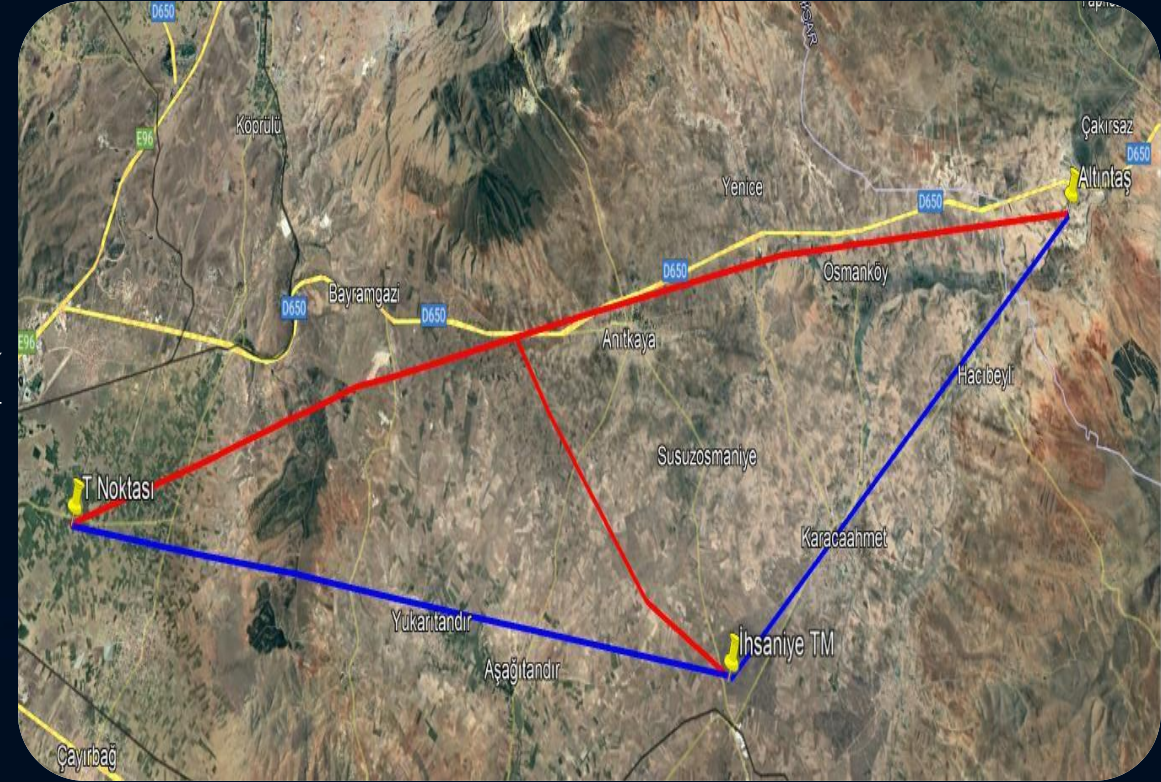

154 kV AFYON 1 – UŞAK EİH (Yenileme)

- Hat Uzunluğu: 15+66 km.
- Proje Bedeli: 4.781.000 TL
- 2025 Yılı Ödeneği : 780.000 TL
- Plan – Profil ve Tevziat Çalışmaları tamamlanan hattımız Uşak Karma OSB hattı ile eş zamanlı ihalesi gerçekleştirilecektir.
- Teşekkülümüz Yatırım Programında 18D00290-16 proje numarası ile yer alan hat 154 kV, 1272 MCM karakteristiğinde, yaklaşık 81 km., uzunluğunda hattımızın projemizin arazi ölçümü, plan, profil ve tevziat çalışmaları tamamlanmıştır. ihale öncesi çalışmalarımız devam etmektedir.





“Enerjinin Gücü”

    / kurumsalteias
www.teias.gov.tr

Saygılarımla arz ederim.

Ramazan AYYILDIZ
TEİAŞ 7. Bölge Müdürü
