




13.Bölge

ANTALYA

İŞARETLER


SORUMLULUK ALANIMIZDA

DEVLET YOLU	:	1.924 Km
İL YOLU	:	1.578 Km
TOPLAM		3.502 Km
TURİSTİK YOL	:	168 Km
OTOYOL	:	373 Km
GENEL TOPLAM	:	4.043 Km

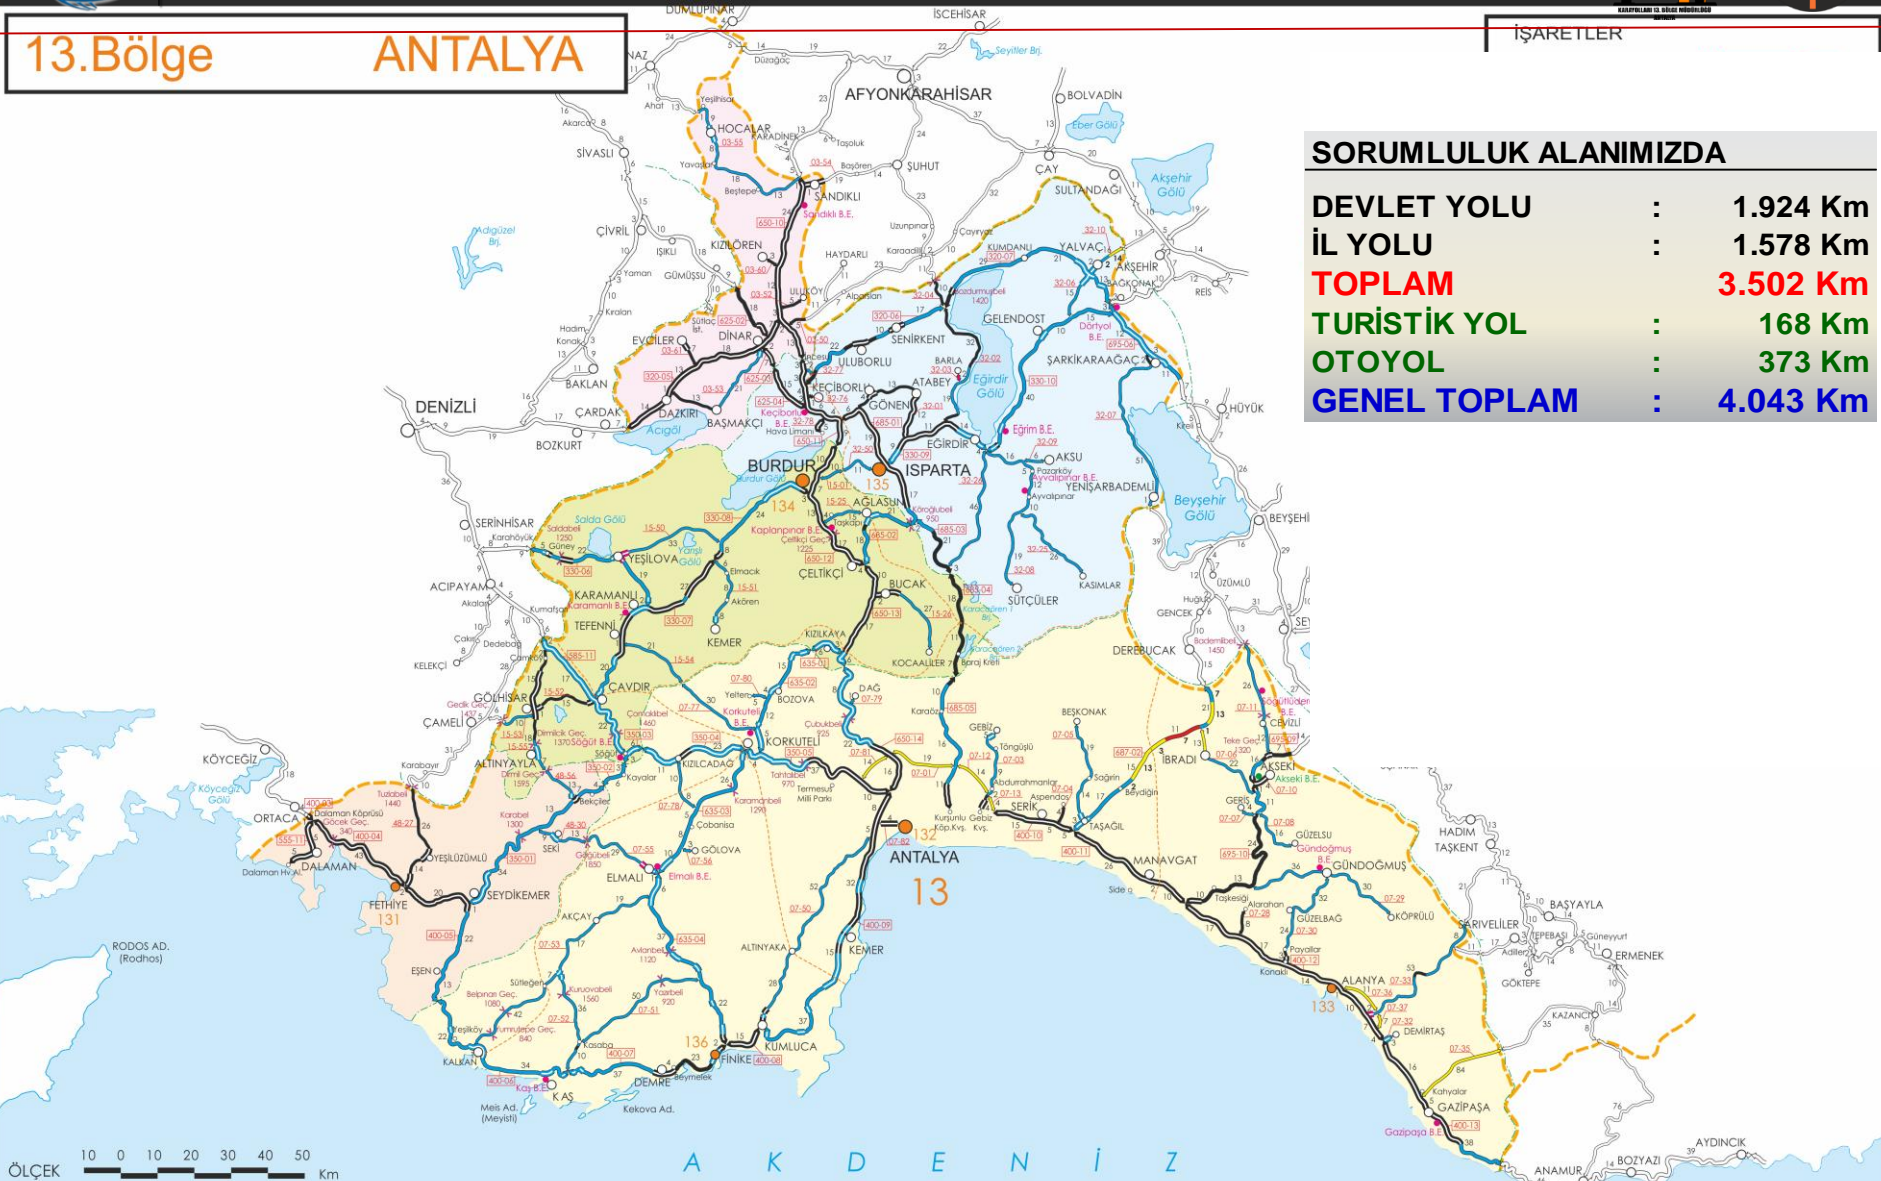

Karayolları 13.Bölge Müdürlüğü, **42.552 km²** lik bir alanda, **3 ilin** tamamını (Antalya, Burdur, Isparta) ve **2 ilin** de (Afyonkarahisar, Muğla) bir kısmını kapsamaktadır.

İL HARİTASI

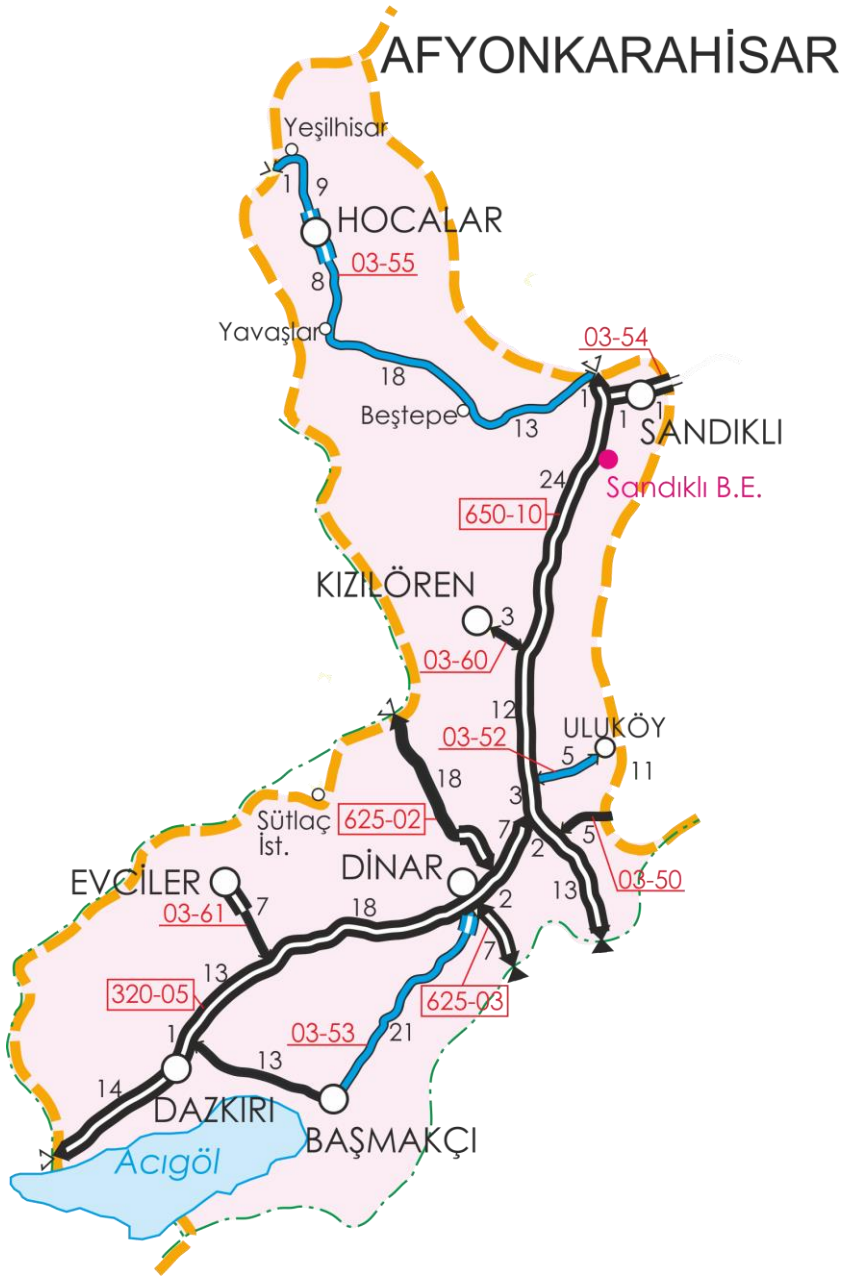

Bölge Müdürlüğümüzün Afyonkarahisar ili sorumluluk alanı içerisinde, Hocalar, Sandıklı, Kızılören, Dinar, Evciler, Başmakçı, Dazkırı ilçeleri yer almaktadır.

SORUMLULUK ALANIMIZDA

DEVLET YOLU	:	135 Km
İL YOLU	:	105 Km
TOPLAM		240 Km
TURİSTİK YOL	:	9 Km
OTOYOL	:	16 Km
GENEL TOPLAM	:	265 Km



Karayolları 13.Bölge Müdürlüğü, **42.552 km²** lik bir alanda, **3 ilin** tamamını (Antalya, Burdur, Isparta) ve **2 ilin** de (Afyonkarahisar, Muğla) bir kısmını kapsamaktadır.

4.319.575 nüfusa sahip **1.924 km** devlet yolu, **1.578 km** il yolu olmak üzere toplam **3.502 km'** lik Karayolu ağında **6** adet şube, **11** adet Bakımevi, **2** adet Tünel İşletme Şefliği ve **182** teknik personel, **65** idari personel, **2** sağlık personeli, **5** avukatlık personeli, **2** Araştırmacı, **2** Şehir Plancısı, **1** Matematikçi **1** Yardımcı Hizmet Personeli, **920** sanat sınıfı olmak üzere toplam **1.180** personel ile hizmet vermektedir.






SATIĐ DURUMU



SATIĐ CİNSLERİ	DEVLET YOLU		İL YOLU		TOPLAM		
	KM	%	KM	%	KM	%	
ASFALT BETONU	135	100	34	32	169	70	
SATIĐ KAPLAMA			70	67	70	29	
PARKE KAPLAMA			1	1	1		
STABİLİZE							
TOPRAK YOL							
GEÇİT VERMEZ							
TURİSTİK YOL	9 Km						
OTOYOL	16 Km						
TOPLAM	135	100	105	100	240	100	

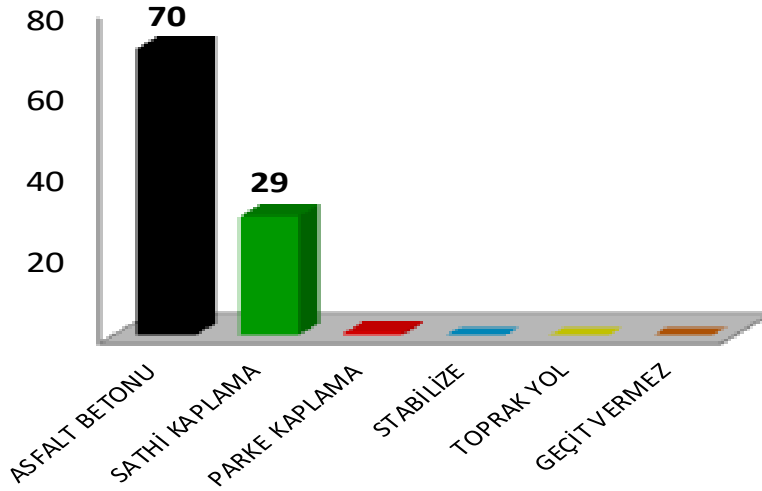



2017 Yılında Afyonkarahisar İlimizde ;

- 1 Adet Devlet Yolları yapım ve onarımı,
- 2 Adet Köprü Yapımı
- 1 Adet İ Turizm Alanı ve Merkezi Yolları
- 1 Adet Otoyol Etüt Proje Müş.Hizmetleri,
- 3 Adet Asfalt Fiziki Standartlarının Yükseltilmesi

olmak üzere toplam 8 adet yatırım projesi bulunmaktadır.





İli	2017 SENE BAŞI ÖDENEĞİ		2017 YILI VERİLEN EK ÖDENEK		2017 VER. TOPLAM ÖDENEK	HEDEF HARCAMALAR	YATIRIM HARCAMA	CARI HARCAMA	TOPLAM HARCAMA	
	Yatırım	Cari	Yatırım	Cari						
1	Antalya	116.638		257.054	3.265	376.957	618.418	375.171	1.786	376.957
2	Burdur	17.327		24.632		41.959	116.463	41.959		41.959
3	Isparta	11.991		47.162		59.153	104.100	58.921	232	59.153
4	Afyonkarahisar	753		9.646		10.399	22.997	9.867	531	10.399
5	Muğla	10.307		18.034		28.341	48.341	28.341		28.341
GENEL TOPLAM		157.016		356.528	3.265	516.809	910.319	514.259	2.549	516.808

2017 Yılı Projelerinin Toplam Bedelleri

64 Milyon TL

Önceki Yıllar Harcaması

15 Milyon TL

2017 Yılı Ödenekleri(Senebaşı) Toplam

2 Milyon TL

2017 Yılı Gelen Ödenek

10 Milyon TL

2017 Yılı Harcama Hedefi

23 Milyon TL

Bu Güne Kadar Yapılan Harcama

10 Milyon TL

Nakdi Gerçekleşme

% 100

Fizisel Gerçekleşme

% 41






İLLERE GÖRE BÖLÜNÜMÜŞ YOLLAR




İLLER	TOPLAM	YAPILAN			KALAN	2017 YILINDA		
		2003 Öncesi	2003 -2016 Yılları Arası	Toplam		Hedef	Yapılan	Çalışılan
ANTALYA	938	159	318	477	460	22	2	242
BURDUR	344	42	188	230	114	7	5	31
ISPARTA	280	91	89	181	100	12	1	16
AFYONKARAHİSAR	129	11	118	129				
MUĞLA	179	22	74	96	83			48
TOPLAM	1.870	325	788	1.113	757	41	8	337

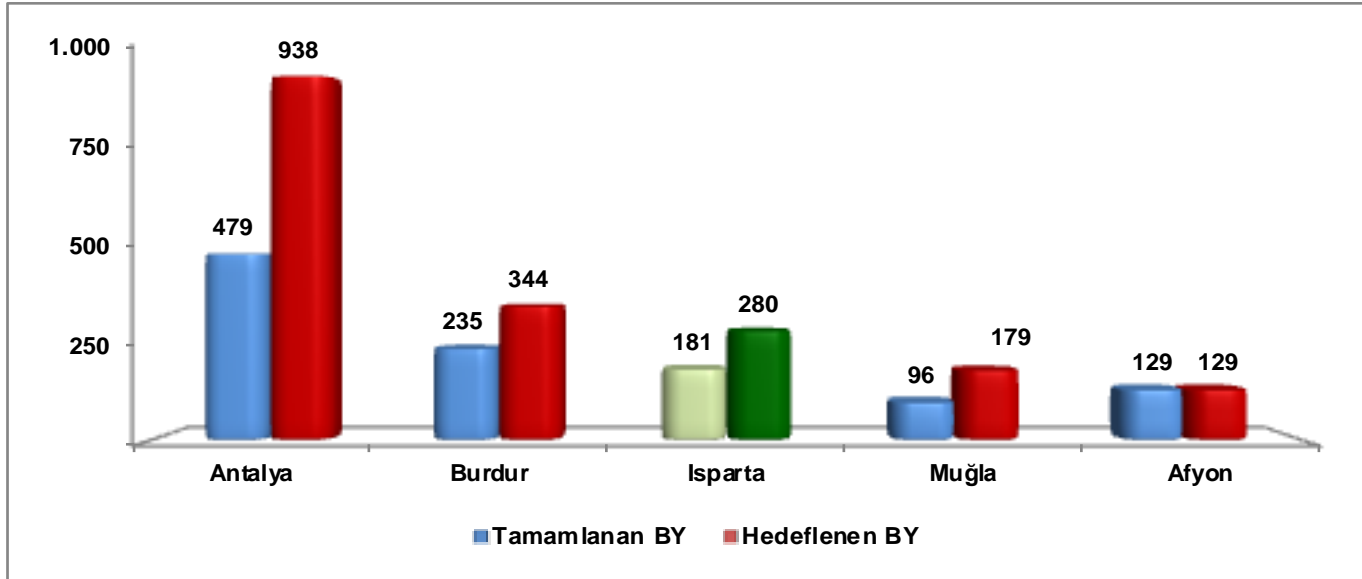

İLLERE GÖRE BSK YOLLAR

İLLER	TOPLAM	YAPILAN			KALAN	2017 YILINDA		
		2003 Öncesi	2003 -2016 Arası	Toplam		Hedef	Yapılan	Çalışılan
ANTALYA	1.070	122	270	392	678	169	28	532
BURDUR	424	27	187	214	210	67	12	142
ISPARTA	359	78	93	170	189	84	58	35
AFYONKARAHİSAR	169	10	154	164	5	5	5	
MUĐLA	234	20	96	117	117	24		59
TOPLAM	2.257	257	801	1.057	1.199	349	102	767


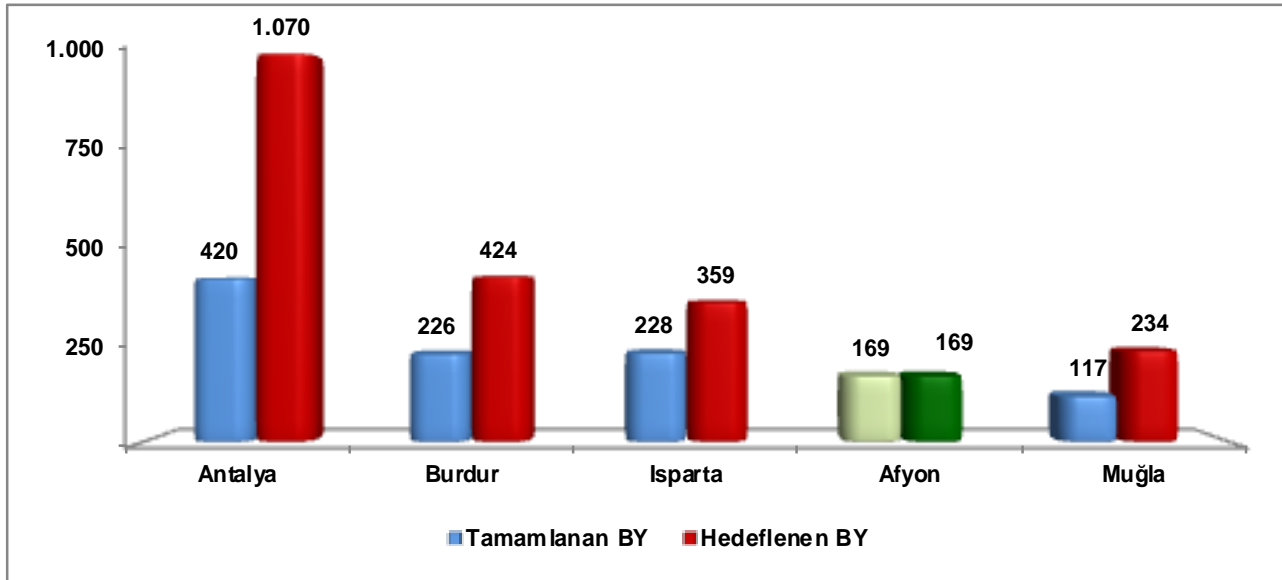




BSK YOL ÇALIŞMALARI



	BSK
TOPLAM UZUNLUK	169 Km
BİTEN	169 Km
ÇALIŞILAN	
İHALESİ PLANLANAN	
2017 HEDEFLENEN	5 Km
2017 GERÇEKLEŞEN	5 Km

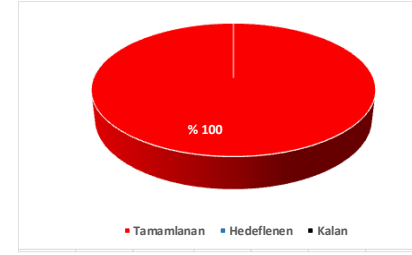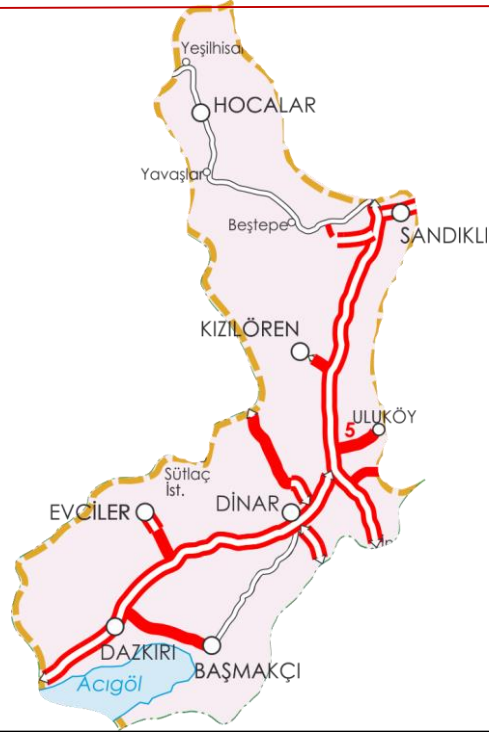

YOLUN ADI	HEDEF	TAMAMLANAN		KALAN	2017 HEDEFİ			2017 YILI YAPILAN			ÇALIŞILAN		İHALESİ PLANLANAN	
		BY/BSK	TY/bSK		BY/BSK	BY/SKÜ BSK	TY/SKÜ BSK	BY/BSK	BY/SKÜ BSK	TY/SKÜ BSK	BY/BSK	BY/SKÜ BSK	BY/SKÜ BSK	TY/SKÜ BSK
SANDIKLI-KEÇİBORLU	55 Km	55 Km												
KEÇİBORLU-DİNAR	7 Km	7 Km												
DİNAR-DAZKIRI	55 Km	55 Km												
DİNAR-ÇİVRİL	18 Km	6 Km	12 Km											
(SANDIKLI-KEÇİBORLU)AYR.-ŞUHUT	5 Km		5 Km											
(SANDIKLI-KEÇİBORLU)AYR.-ULUKÖY	5 Km		5,0 Km				5 Km			5,0 Km				
DİNAR-BAŞMAKÇI	14 Km	0,4 Km	13 Km											
SANDIKLI GEÇİŞİ	2 Km	2 Km												
SANDIKLI AYR.-HOCALAR-2.BL.HD.														
(AFYON-BURDUR)AYR.-KIZILÖREN	2 Km		2 Km											
DİNAR AYR.-EVCİLER	7 Km		7 Km											
TOPLAM	169 Km	125 Km	44 Km	0 Km			5 Km			5 Km				
		169 Km					5 Km			5 Km				




HEDEF ve GERÇEKLEŞMELER




YOL TİPİ		ÇALIŞILAN	İHALESİ PLANLANAN	2017 YILI HEDEF	2017 YILI GERÇEKLEŞME
BÖLÜNMÜŞ YOL	BÖLGE GENELİ	334 Km	113 Km	41 Km	8 Km
	AFYONKARAHİSAR İLİ				
TEK YOL	BÖLGE GENELİ	133 Km		22 Km	6 Km
	AFYONKARAHİSAR İLİ				
BSK	BÖLGE GENELİ	767 Km	145 Km	349 Km	102 Km
	AFYONKARAHİSAR İLİ			5 Km	5 Km
SATHİ KAPLAMA	BÖLGE GENELİ		831 Km	831 Km	121 Km
	AFYONKARAHİSAR İLİ		42 Km	42 Km	
BÖLGE GENELİ		HARCAMA		910.318.698 TL	516.808.224 TL
AFYONKARAHİSAR İLİ				22.996.663 TL	10.398.560 TL



ÇALIŞMALAR		2003-2016 GERÇEKLEŞME	2017	
			HEDEF	YAPILAN
BÖLÜNMÜŞ YOL	km	118		
YOL İYİLEŞTİRME (TY)	km	35		
KAZA KARA NOKTA	Adet	8		
BY-BSK YAPIMI	km	118		
TY-BSK(1A+2A+3A)	km	38	5	5
ASFALT ÇALIŞMALARARI	km	1.083	42	
KÖPRÜ YAPIMI	Adet	19		
DÜŞEY İŞARETLEME	m ²	9.288	1.146	170
YATAY İŞARETLEME	km	1.509.090	268	60
	m ²		75.309	28.000
OTOKORKULUK	km	243	30	
DİKİLEN FİDAN	Adet		15.000	



KEÇİBORLU - DİNAR

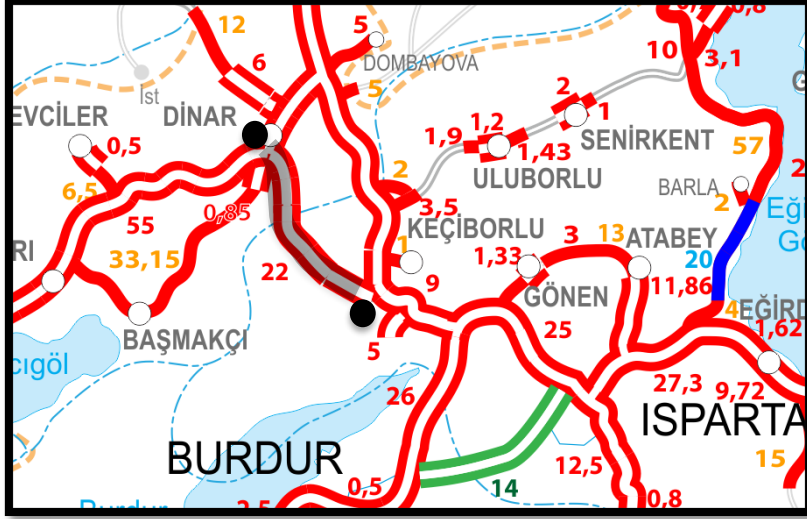

Toplam uzunluğu 22 km, Afyonkarahisar ilindeki uzunluğu 7 km olan yolumuzun tamamı BSK'lı bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır. 2016 yılında binder seviyesinde tamamlanan kesimlerde aşınma çalışmaları yapılmıştır.

2017 yılında eksik imalatların tamamlanması hedeflenmektedir.






TURİZİM ALANI VE MERKEZİ YOLLARI



(Keçiborlu-Sandıklı)Ayr.-(Sandıklı-Hocalar)Ayr. Km:0+000-8+641,21 arası

Kaplıca Turizm Yolu Tİ, SY ve BSK ÜYİ.

Toplam 8,6 km uzunluğundaki yolun 4 km'si BY-BSK, 4 km'si TY-BSK olarak tamamlanmıştır. 2017 yılında eksik imalatların tamamlanması hedeflenmektedir.

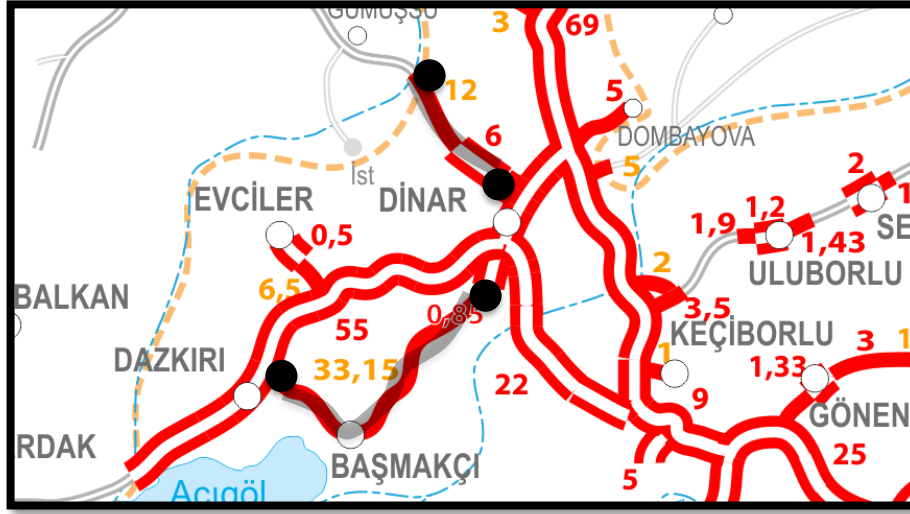

Dinar Yolunun Km:0+000-18+000 Arası ve Başmakçı-Dazkırı Yolunun Km:21+000-34+000 Arası Binder ve Aşınma Yapılması

Toplam uzunluğu 52 km olan yolda 2016 yılında Dinar-Çivril yolunda 6 km BY/SKÜBSK, 12 km TY/SKÜBSK, Başmakçı-Dazkırı arasında 13 km TY/SÜBSK, 20 km TY/SK tamamlanmıştır.

2017 yılında 18 km aşınma yapılarak tamamlanmıştır.



OTOYOLLAR



	Afyon		Isparta		Burdur		Antalya		Denizli		TOPLAM		TOPLAM
	3. Bl.	13.Bl.	13 Bl.	13.Bl.	13.Bl.	13.Bl.	2.Bl.	13.Bl.	13 Bl.	2-3 Bl.			
Afyon Antalya	135	16	25	77	19				137	135	272		
Antalya-Alanya					155				155		155		
Denizli-Burdur				81		49			81	49	130		
	151	25	158	174	49			373	184	557			

AFYON-ANTALYA OTOYOLU
272 Km – Mega+Protek O.G.
137 Km 13. Böl. Müd.
135 Km 3.Böl.Md.

DENİZLİ-BURDUR OTOYOLU
130 Km – UBM Proje
81 Km 13. Böl. Müd.
49 Km 2. Böl. Müd.

ANTALYA-ALANYA OTOYOLU
155 Km – Yüksel Proje

Toplam uzunluk 557 Km
Bölge Hudutlarındaki Uzunluk 373 Km

1/5000 Ön Proje çalışmaları devam etmektedir.

	Toplam Uzunluk Km	Tünel		Viyadük		Köprü		Oran
		Adet	Uzunluk m	Adet	Uzunluk m	Adet	Uzunluk m	
Afyon Antalya Otoyolu	272	2	3.595	27	21.160			% 9
Antalya-Alanya	155	10	22.420	23	10.477	15	1.455	% 22
Denizli-Burdur	130	4	13.115	2	2.450			% 12
TOPLAM	557	16	39.130	52	34.087	15	1.455	% 13




ASFALT SATHİ KAPLAMA ÇALIŞMALARI



2003-2016 Yılları arasında 654 km K ve 429 km Ko olmak üzere toplam 1083 km asfalt sathi kaplama çalışması yapılmıştır. 2017 yılında 42 km K ve km Ko, olmak üzere toplam 42 km asfalt sathi kaplama çalışması yapılması hedeflenmektedir.

		2003-2016 Arası yapılan	2017 Yılı Hedeflenen	2017 Yılı Yapılan	TOPLAM
AFYONKARAHİSAR	K	654	42		654
	Ko	429			429
	CRS				
	Kı				
	Top.	1.083	42	0	1.083

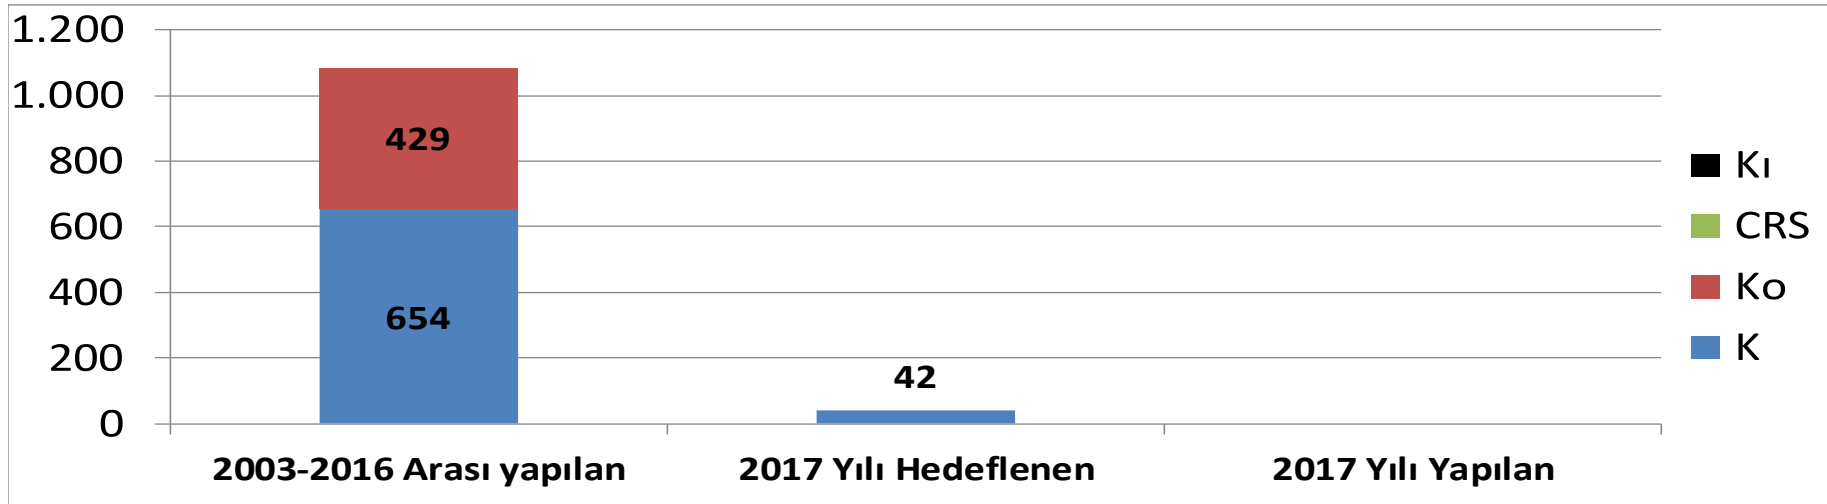



2017 yılında 1.146 m² düşey işaretleme, 268 km (75.309 m²) yatay işaretleme, 30 km otokorkuluk çalışması yapılması hedeflenmektedir. 30.06.2017 tarihi itibariyle 170 m² düşey işaretleme, 60 km (28.000 m²) yatay işaretleme çalışması yapılmıştır.





BAKIM ONARIM ALIŖMALARI



Afyonkarahisar ilinde rutin yol bakım-onarım hizmetleri, evre koruma hizmetleri, kar mücadele giderleri, Ŗube ve Bakımevi onarımları ve yol boyu gelişimi alıŖmaları **134 Ŗube Ŗefliđi** Yol bakım ve trafik ekiplerince aksatılmadan sürdürölmektedir. 2017 yılında **15.000 adet** fidan dikilmesi hedeflenmektedir.



28 04 2016
