



AFYONKARAHİSAR İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI

11 NİSAN 2018



13.Bölge

ANTALYA



SORUMLULUK ALANIMIZDA

DEVLET YOLU	:	1.925 Km
İL YOLU	:	1.577 Km
TOPLAM		3.502 Km
TURİSTİK YOL	:	67 Km
OTOYOL	:	373 Km
GENEL TOPLAM	:	3.942 Km

Karayolları 13.Bölge Müdürlüğü, **44.119 km²** lik bir alanda, **3 ilin** tamamını (Antalya, Burdur, Isparta) ve **2 ilin** de (Afyonkarahisar, Muğla) bir kısmını kapsamaktadır.



13.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



Devlet Yolu 1.925 Km
İl Yolu 1.577 Km
TOPLAM YOL AĞI 3.502 Km
Turistik Yol..... 67 Km
Otoyol373 Km
TOPLAM 3.942 Km

BÖLGE KURULUŞ YILI	1960
BÖLGE ALANI	44.119 km ²
BÖLGE NÜFUSU	3.359.044

13.Bölge Müdürlüğü, **3 ilin** tamamını (Antalya, Burdur, Isparta), **2 ilin** de (Afyonkarahisar, Muğla) bir kısmını kapsamaktadır.



ŞUBE ŞEFLİKLERİ

6

BAKİMEVİ

11

TÜNEL İŞL. ŞEFLİKLERİ

2





13.Bölge

ANTALYA

Bölge ağımız sorumluluğunda,
bakım hizmetlerini **6 adet**
Şube Şefliği tarafından
yerine getirmekteyiz.

131.Fethiye Şube

132.Antalya Şube

133.Alanya Şube

134.Burdur Şube

135.Isparta Şube

136.Finike Şube



Aktif Bakımevleri



Pasif Bakımevleri

Karayolu ağında **6 adet** şube, **11 adet** Bakımevi, **2 adet** Tünel İşletme Şefliği
ile hizmet vermektedir.




Karayolları 13.Bölge Müdürlüğü, **44.119 km²** lik bir alanda, **3 ilin** tamamını (Antalya, Burdur, Isparta) ve **2 ilin** de (Afyonkarahisar, Muğla) bir kısmını kapsamaktadır.

3.459.044 nüfusa sahip **1.925 km** devlet yolu, **1.577 km** il yolu olmak üzere toplam **3.502 km'** lik Karayolu ağında **6** adet şube, **11** adet Bakımevi, **2** adet Tünel İşletme Şefliği ve **195** teknik personel, **59** idari personel, **2** sağlık personeli, **5** avukatlık personeli, **2** Araştırmacı, **3** Şehir Plancısı ve **900** sanat sınıfı olmak üzere toplam **1.166** personel ile hizmet vermektedir.



İL HARİTASI

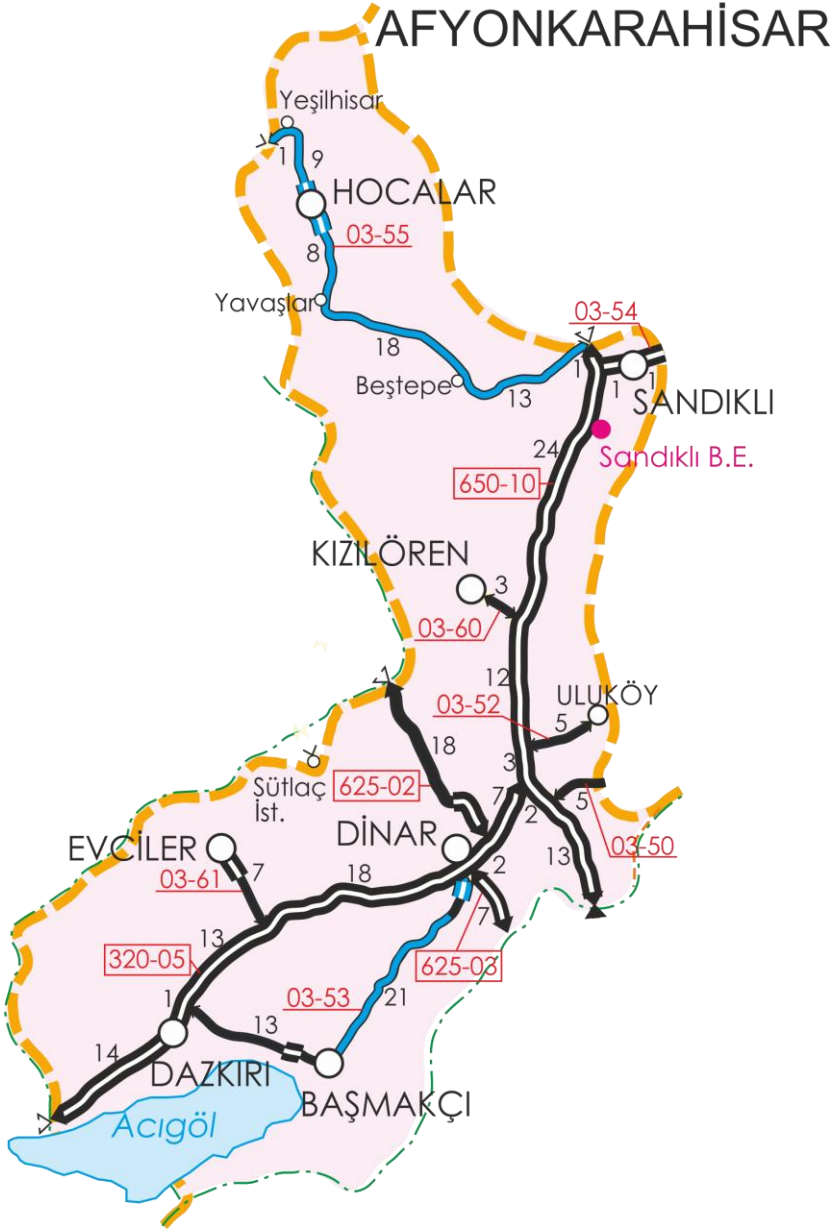

Bölge Müdürlüğümüzün Afyonkarahisar ili sorumluluk alanı içerisinde, Hocalar, Sandıklı, Kızılören, Dinar, Evciler, Başmakçı, Dazkırı ilçeleri yer almaktadır.

SORUMLULUK ALANIMIZDA


DEVLET YOLU	:	135 Km
İL YOLU	:	105 Km
TOPLAM		240 Km
OTOYOL	:	16 Km
GENEL TOPLAM	:	256 Km



SATIĐ DURUMU



SATIĐ CİNSLERİ	DEVLET YOLU		İL YOLU		TOPLAM		
	KM	%	KM	%	KM	%	
ASFALT BETONU	135	100	45	42	180	75	
SATIĐ KAPLAMA			60	57	60	25	
PARKE KAPLAMA			1	1	1		
STABİLİZE							
TOPRAK YOL							
GEÇİT VERMEZ							
OTOYOL	16 Km						
TOPLAM	135	100	105	100	240	100	

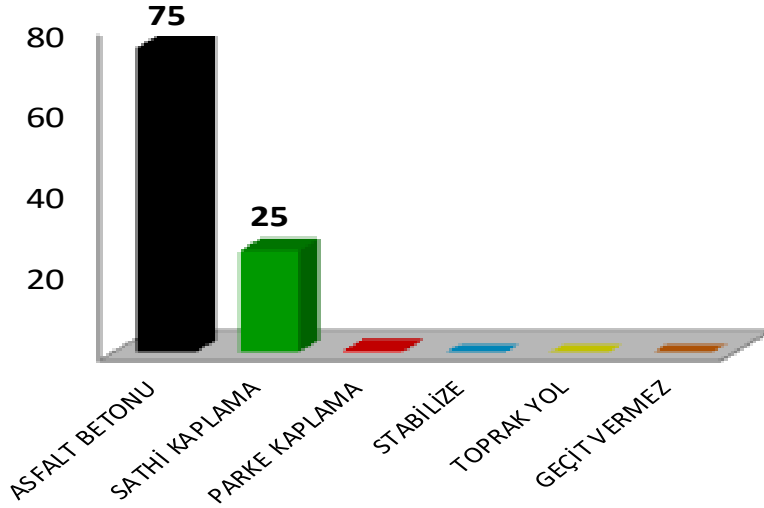



İLLER YOL AĞI DURUMU



İLLER	YOL CİNSİ	SATIŞ CİNSİ (KM.)						Toplam	Asfalt %' si	Bölünmüş Yollar
		SK	BSK	Parke	Stabilize	Toprak	Geçit Vermez			
AFYON	Devlet		135					135	100	123
	İl	60	45	1				105	99	6
	TOPLAM	60	180	1				240	100	129
ANTALYA	Devlet	377	498	0	1	0	28	904	97	482
	İl	576	134	3	0	0	144	857	83	46
	TOPLAM	953	632	3	1		172	1.761	90	528
BURDUR	Devlet	90	265	1	0	0	0	356	100	220
	İl	125	77	1	0	0	0	202	100	23
	TOPLAM	214	342	2				558	100	242
ISPARTA	Devlet	129	231					360	100	172
	İl	213	109	2			14	338	95	22
	TOPLAM	342	340	2			14	698	98	193
MUĞLA	Devlet	93	77					170	100	87
	İl	11	64					75	100	9
	TOPLAM	104	141					245	100	96
BÖLGE	Devlet	689	1.206	1	1		28	1.925	98	1.083
GENEL	İl	984	428	7			158	1.577	90	105
TOPLAMI	TOPLAM	1.673	1.634	8	1		186	3.502	94	1.189



2018 Yılında Afyonkarahisar İlimizde ;

- 2 Adet Köprü Yapımı
- 1 Adet Otoyol Etüt Proje Müş.Hizmetleri,
- 1 Adet Asfalt Fiziki Standartlarının Yükseltilmesi

olmak üzere toplam 4 adet yatırım projesi bulunmaktadır.





İli	2018 SENE BAŞI ÖDENEĞİ		2018 YILI VERİLEN EK ÖDENEK		2018 VER. TOPLAM ÖDENEK	HEDEF HARCAMALAR	YATIRIM HARCAMA	CARI HARCAMA	TOPLAM HARCAMA	
	Yatırım	Cari	Yatırım	Cari						
1	Antalya	254.437		330.467	766	331.233	1.269.636	330.467	766	331.233
2	Burdur	91.156		44.611	90	44.700	186.978	44.611	90	44.700
3	Isparta	29.075		40.498	15	40.513	221.490	40.498	15	40.513
4	Afyonkarahisar	1.358		13.240	15	13.255	87.513	13.240	15	13.255
5	Muğla	20.257		667		667	22.382	667		667
GENEL TOPLAM		396.283		429.483	885	430.369	1.787.999	429.483	885	430.369

2018 Yılı Projelerinin Toplam Bedelleri

112 Milyon TL

Önceki Yıllar Harcaması

3 Milyon TL

2018 Yılı Ödeneği

13 Milyon TL

2018 Yılı Harcama Hedefi

101 Milyon TL

31.03.2018 sonu harcama

13 Milyon TL

Nakdi Gerçekleşme

% 100

Fizisel Gerçekleşme

% 15





YATIRIM PROGRAMI






İLLERE GÖRE BÖLÜNÜMÜŞ YOLLAR



İLLER	TOPLAM PROJE UZUNLUĞU	YAPILAN			KALAN	2018 YILINDA		
		2003 Öncesi	2003 -2017 Yılları Arası	Toplam		Hedef	Yapılan	Çalışılan
ANTALYA	Yol Ağında	939	167	361	528	411	34	278
	Ağ Dışında	38	30	8	38			
	TOPLAM	977	197	369	566	411	34	278
BURDUR	Yol Ağında	344	42	201	242	102	21	23
	Ağ Dışında	5	5		5			
	TOPLAM	349	47	201	247	102	21	23
ISPARTA	Yol Ağında	281	91	102	193	88	16	27
	Ağ Dışında	13	1	5	6	7		
	TOPLAM	294	92	107	199	95	16	27
AFYONKARAHİSAR	Yol Ağında	129	11	118	129		0	
	Ağ Dışında							
	TOPLAM	129	11	118	129		0	
MUĞLA	Yol Ağında	179	22	74	96	83		83
	Ağ Dışında							
	TOPLAM	179	22	74,30	96	83		83
TOPLAM	1.928	369	869	1.238	690	70	0	411


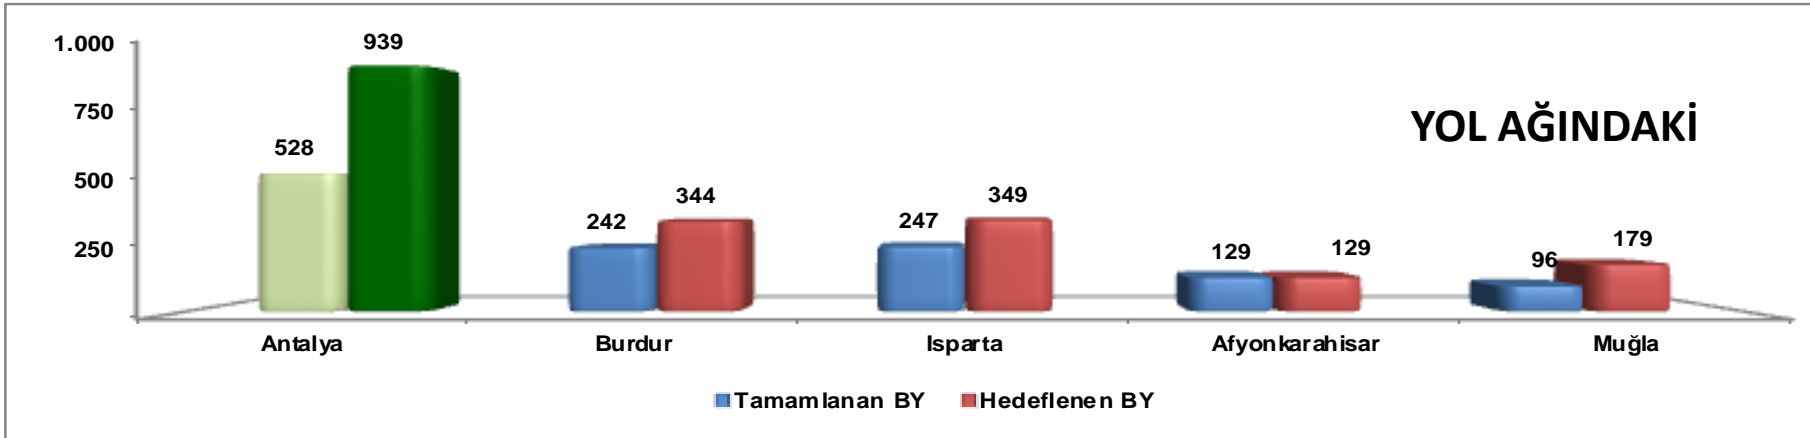




BÖLÜNmüş YOL ÇALIŞMALARI



	BY
TOPLAM UZUNLUK	129 Km
BİTEN	129 Km

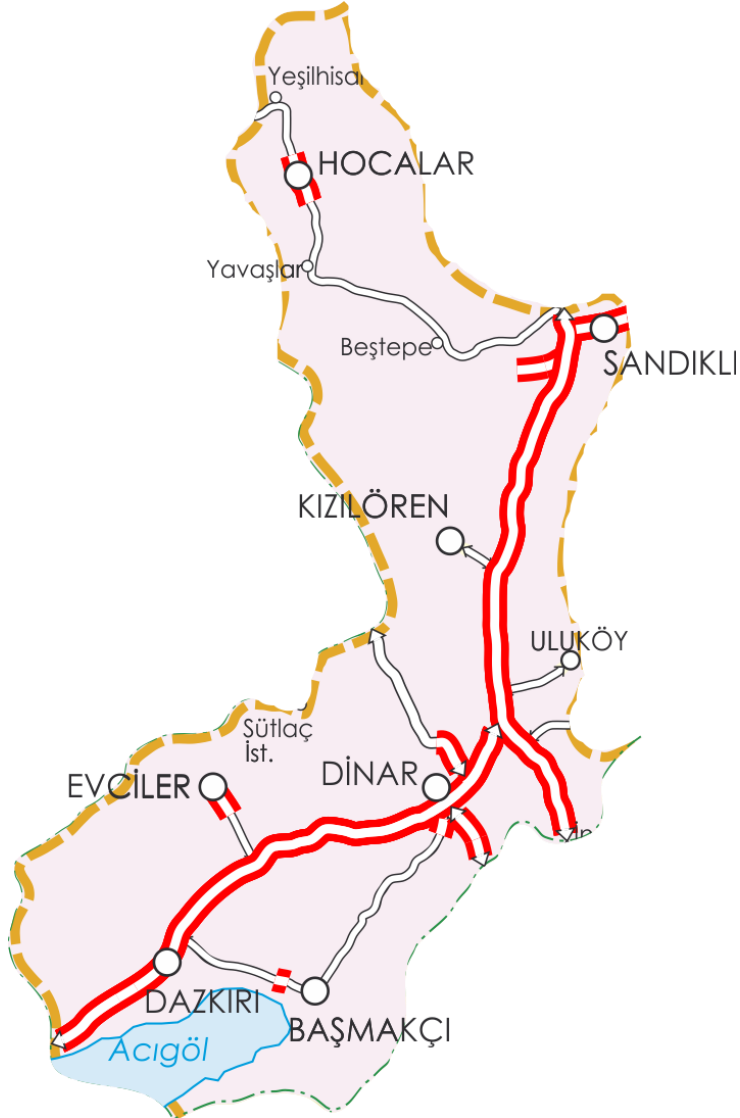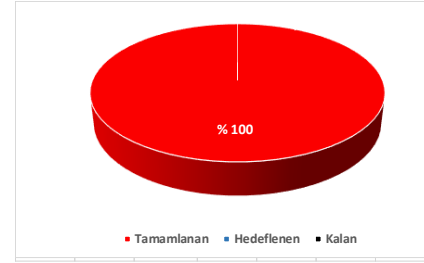



YOLUN ADI	HEDEF	TAMAMLANAN		KALAN
		BY/BSK	BY/SK	
SANDIKLI-KEÇİBORLU	55 Km	55,0 Km		
KEÇİBORLU-DİNAR	7 Km	7,0 Km		
DİNAR-DAZKIRI	55 Km	55,0 Km		
DİNAR-ÇIVRİL	6 Km	5,6 Km		
DİNAR-BAŞMAKÇI	1 Km	0,6 Km	0,5 Km	
SANDIKLI GEÇİŞİ	2 Km	2,0 Km		
SANDIKLI AYR.-HOCALAR-2.BLHD.	2,7 Km		2,7 Km	
(AFYON-BURDUR)AYR.-KIZILÖREN				
DİNAR AYR.-EVCİLER	0,5 Km	0,5 Km		
TOPLAM	129 Km	126 Km	3 Km	
		129 Km		



BSK YOL ÇALIŞMALARI



TOPLAM UZUNLUK	BSK 180 Km
BİTEN	180 Km
ÇALIŞILAN	
İHALESİ PLANLANAN	
2018 HEDEFLENEN	
2018 GERÇEKLEŞEN	

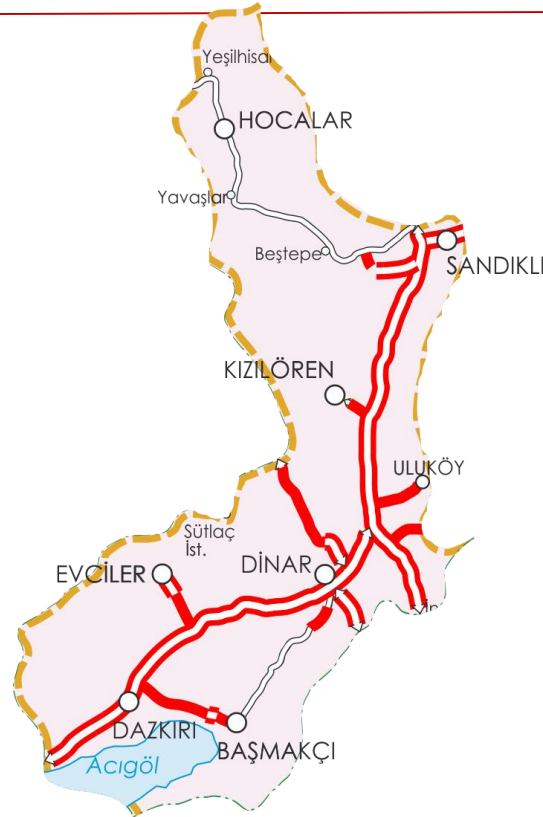

YOLUN ADI	HEDEF	TAMAMLANAN		KALAN	2018 HEDEFİ			2017 YILI YAPILAN				ÇALIŞILAN		İHALESİ PLANLANAN	
		BY/BSK	TY/bSK		BY/BSK	BY/SKÜ BSK	TY/SKÜ BSK	BY/BSK	BY/SKÜ BSK	BY/SKÜ BSK	TY/SKÜ BSK	BY/BSK	BY/SKÜ BSK	BY/SKÜ BSK	TY/SKÜ BSK
SANDIKLI-KEÇİBORLU	55 Km	55 Km													
KEÇİBORLU-DİNAR	7 Km	7 Km													
DİNAR-DAZKIRI	55 Km	55 Km													
DİNAR-ÇİVRİL	18 Km	6 Km	12 Km	0 Km											
(SANDIKLI-KEÇİBORLU)AYR.-ŞUHUT	5 Km		5 Km												
(SANDIKLI-KEÇİBORLU)AYR.-ULUKÖY	5 Km		5,0 Km												
DİNAR-BAŞMAKÇI	23 Km	0,6 Km	22 Km					0 Km							
SANDIKLI GEÇİŞİ	2 Km	2 Km													
SANDIKLI AYR.-HOCALAR-2.BL.HD.															
(AFYON-BURDUR)AYR.-KIZILÖREN	3 Km		3 Km												
DİNAR AYR.-EVCİLER	7 Km	1 Km	7 Km												
TOPLAM	180 Km	126 Km	54 Km	0 Km				0 Km							
		180 Km						0 Km							





TEK YOL ÇALIŞMALARI



	TY
TOPLAM UZUNLUK	112 Km
YOL AĞINDA BİTEN	111 Km
AĞ DIŞINDA BİTEN	1 Km
TOPLAM BİTEN	112 Km
ÇALIŞILAN	
İHALESİ PLANLANAN	
2018 HEDEFLenen	
2018 GERÇEKLEŞEN	

YOLUN ADI	HEDEF	TAMAMLANAN		KALAN
		TY/BSK	TY/SK	
DİNAR-ÇİVRİL	12 Km		12 Km	
(SANDIKLI-KEÇİBORLU)AYR.-ŞUHUT	5 Km	5 Km		
(SANDIKLI-KEÇİBORLU)AYR.-ULUKÖY	5 Km	5 Km		
DİNAR-BAŞMAKÇI	33 Km		33 Km	0 Km
SANDIKLI GEÇİŞİ				
SANDIKLI AYR.-HOCALAR-2.BL.HD.	46 Km		46 Km	
(AFYON-BURDUR)AYR.-KIZILÖREN	3 Km	3 Km		
DİNAR AYR.-EVCİLER	7 Km	7 Km		
AĞ DIŞI YOLLAR	1 Km	1 Km	0 Km	
TOPLAM	112 Km	21 Km	91 Km	0 Km
		112 Km		

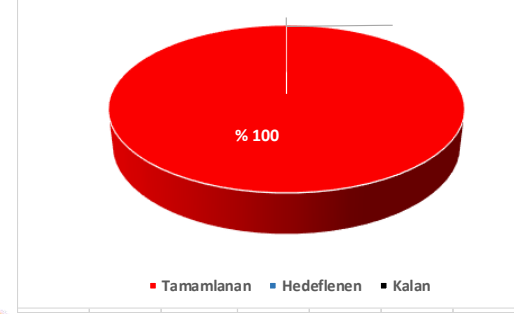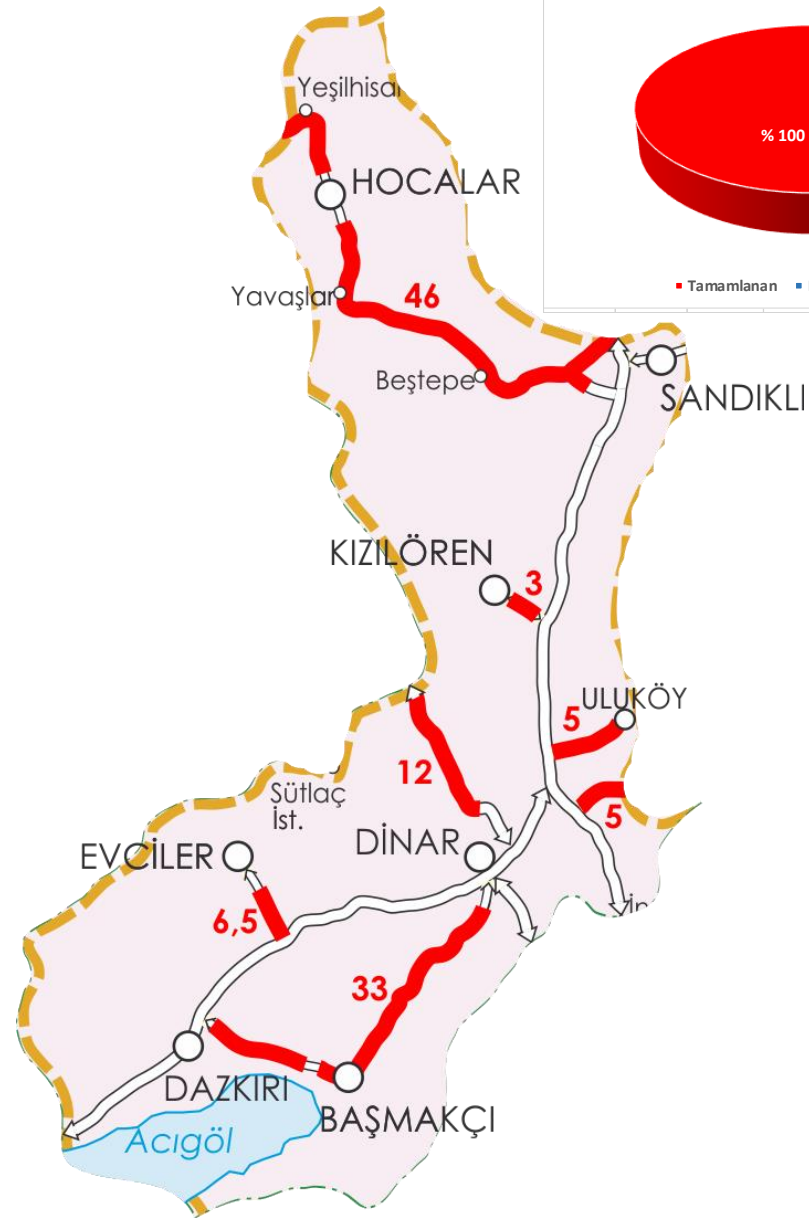




HEDEF ve GERÇEKLEŞMELER



YOL TİPİ		ÇALIŞILAN	İHALESİ PLANLANAN	2018 YILI HEDEF	2018 YILI GERÇEKLEŞME
BÖLÜNMÜŞ YOL	BÖLGE GENELİ	411 Km	142 Km	70 Km	
	AFYONKARAHİSAR İLİ				
TEK YOL	BÖLGE GENELİ	85 Km	28 Km	44 Km	31 Km
	AFYONKARAHİSAR İLİ				
BSK	BÖLGE GENELİ	712 Km	184 Km	161 Km	61 Km
	AFYONKARAHİSAR İLİ				
SATHİ KAPLAMA	BÖLGE GENELİ			375 Km	
	AFYONKARAHİSAR İLİ				
BÖLGE GENELİ		HARCAMA		1.787.998.702 TL	430.368.916 TL
AFYONKARAHİSAR İLİ				87.513.000 TL	13.255.218 TL



ÇALIŞMALAR		2003-2017 GERÇEKLEŞME	2018	
			HEDEF	YAPILAN
BÖLÜNMÜŞ YOL	km	118		
YOL İYİLEŞTİRME (TY)	km	42		
KAZA KARA NOKTA	Adet	8		
BY-BSK YAPIMI	km	126		
TY-BSK(1A+2A+3A)	km	55		
ASFALT ÇALIŞMALARARI	km	1.129		
KÖPRÜ YAPIMI	Adet	19	3	
DÜŞEY İŞARETLEME	m ²	10.363	1.327	133
YATAY İŞARETLEME	km	1.579.090	616	
	m ²		67.586	
OTOKORKULUK	km	276	7	3
DİKİLEN FİDAN	Adet			





KÖPRÜ YAPIM ÇALIŖMALARI



Evciler DDY Üst Geçit Köprüsü

Afyon-Evciler yolunda EVCİLER DDY ÜSTGEÇİT KÖPRÜSÜ

22.08.2017 tarihinde ihalesi yapılmıŖ çalıŖmalara başlanmıŖtır. ÇalıŖmalar devam etmektedir.

Dinar Çivril Yolunda ÇİVRİL Köprüsü

06.09.2017 tarihinde ihalesi yapılarak çalıŖmalara başlanmıŖtır. ÇalıŖmalar devam etmektedir.

ANTALYA

	Afyon		Isparta		Burdur		Antalya		Denizli		TOPLAM		TOPLAM	
	3. Bl.	13. Bl.	13. Bl.	13. Bl.	13. Bl.	13. Bl.	2. Bl.	13. Bl.	13. Bl.	2-3 Bl.				
Afyon Antalya	135	16	25	77	19						137	135	272	
Antalya-Alanya							155							155
Denizli-Burdur						81		49						130
	151	25	158	174	49						373	184	557	

AFYON-ANTALYA OTOYOLU
272 Km – Mega+Protek O.G.
137 Km 13. Böl. Müd.
135 Km 3. Böl. Md.

DENİZLİ-BURDUR OTOYOLU
130 Km – UBM Proje
81 Km 13. Böl. Müd.
49 Km 2. Böl. Müd.

ANTALYA-ALANYA OTOYOLU
155 Km – Yüksel Proje

Toplam uzunluk 557 Km
Bölge Hudutlarındaki Uzunluk 373 Km

Antalya – Alanya Otoyolu ön proje çalışmaları tamamlanarak geçici kabulü yapılmıştır. Diğer iki projede, 1/5000 Ön Proje çalışmaları devam etmektedir.

	Toplam Uzunluk Km	Tünel		Viyadük		Köprü		Oran
		Adet	Uzunluk m	Adet	Uzunluk m	Adet	Uzunluk m	
Afyon Antalya Otoyolu	272	2	3.595	27	21.160			% 9
Antalya-Alanya	155	10	22.420	23	10.477	15	1.455	% 22
Denizli-Burdur	130	4	13.115	2	2.450			% 12
TOPLAM	557	16	39.130	52	34.087	15	1.455	% 13



2003-2017 yılları arasında 1.129 km asfalt sathi kaplama çalıőmaları yapılmıőtır.



2018 yılında 1.327 m² düşey işaretleme, 616 km (67.586 m²) yatay işaretleme, 7 km otokorkuluk çalışması yapılması hedeflenmektedir. 31.03.2018 tarihi itibariyle, 133 m² Düşey işaretleme, 3 km otokorkuluk çalışması yapılmıştır.





BAKIM ONARIM ALIŖMALARI



Afyonkarahisar ilinde rutin yol bakım-onarım hizmetleri, evre koruma hizmetleri, kar mücadele giderleri, Ŗube ve Bakımevi onarımları ve yol boyu gelişimi alıŖmaları **134 Ŗube Ŗefliđi** Yol bakım ve trafik ekiplerince aksatılmadan sürdürölmektedir.



28 04 2016



T.C.
Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı
bağlı kuruluşudur.

Arif ÇOBANOĞLU
Bölge Müdürü

