KARAYOLLARI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KONYA

Afyon İli
2017 Yılı -4.Dönem
Koordinasyon Kurulu Toplantısı

T.C.
Ulaştırma Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı

17 OCAK 2018 - AFYON

YATIRIM İZLEME RAPORU

Toplam Proje Sayısı	**: 20**
Toplam Proje Tutarı	**: 2,34 Milyar TL**
Önceki Yılların Harcaması	**: 1,5 Milyar TL**
Yılı Ödeneği + Ek Ödenek	**: 137 Milyon TL**
Dönem Sonuna Kadar Yapılan Harcama	**: 127 Milyon TL**
Parasal Gerçekleşme	**: % 81**
Fiziksel Gerçekleme	**: % 87**

KARAYOLLARI 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

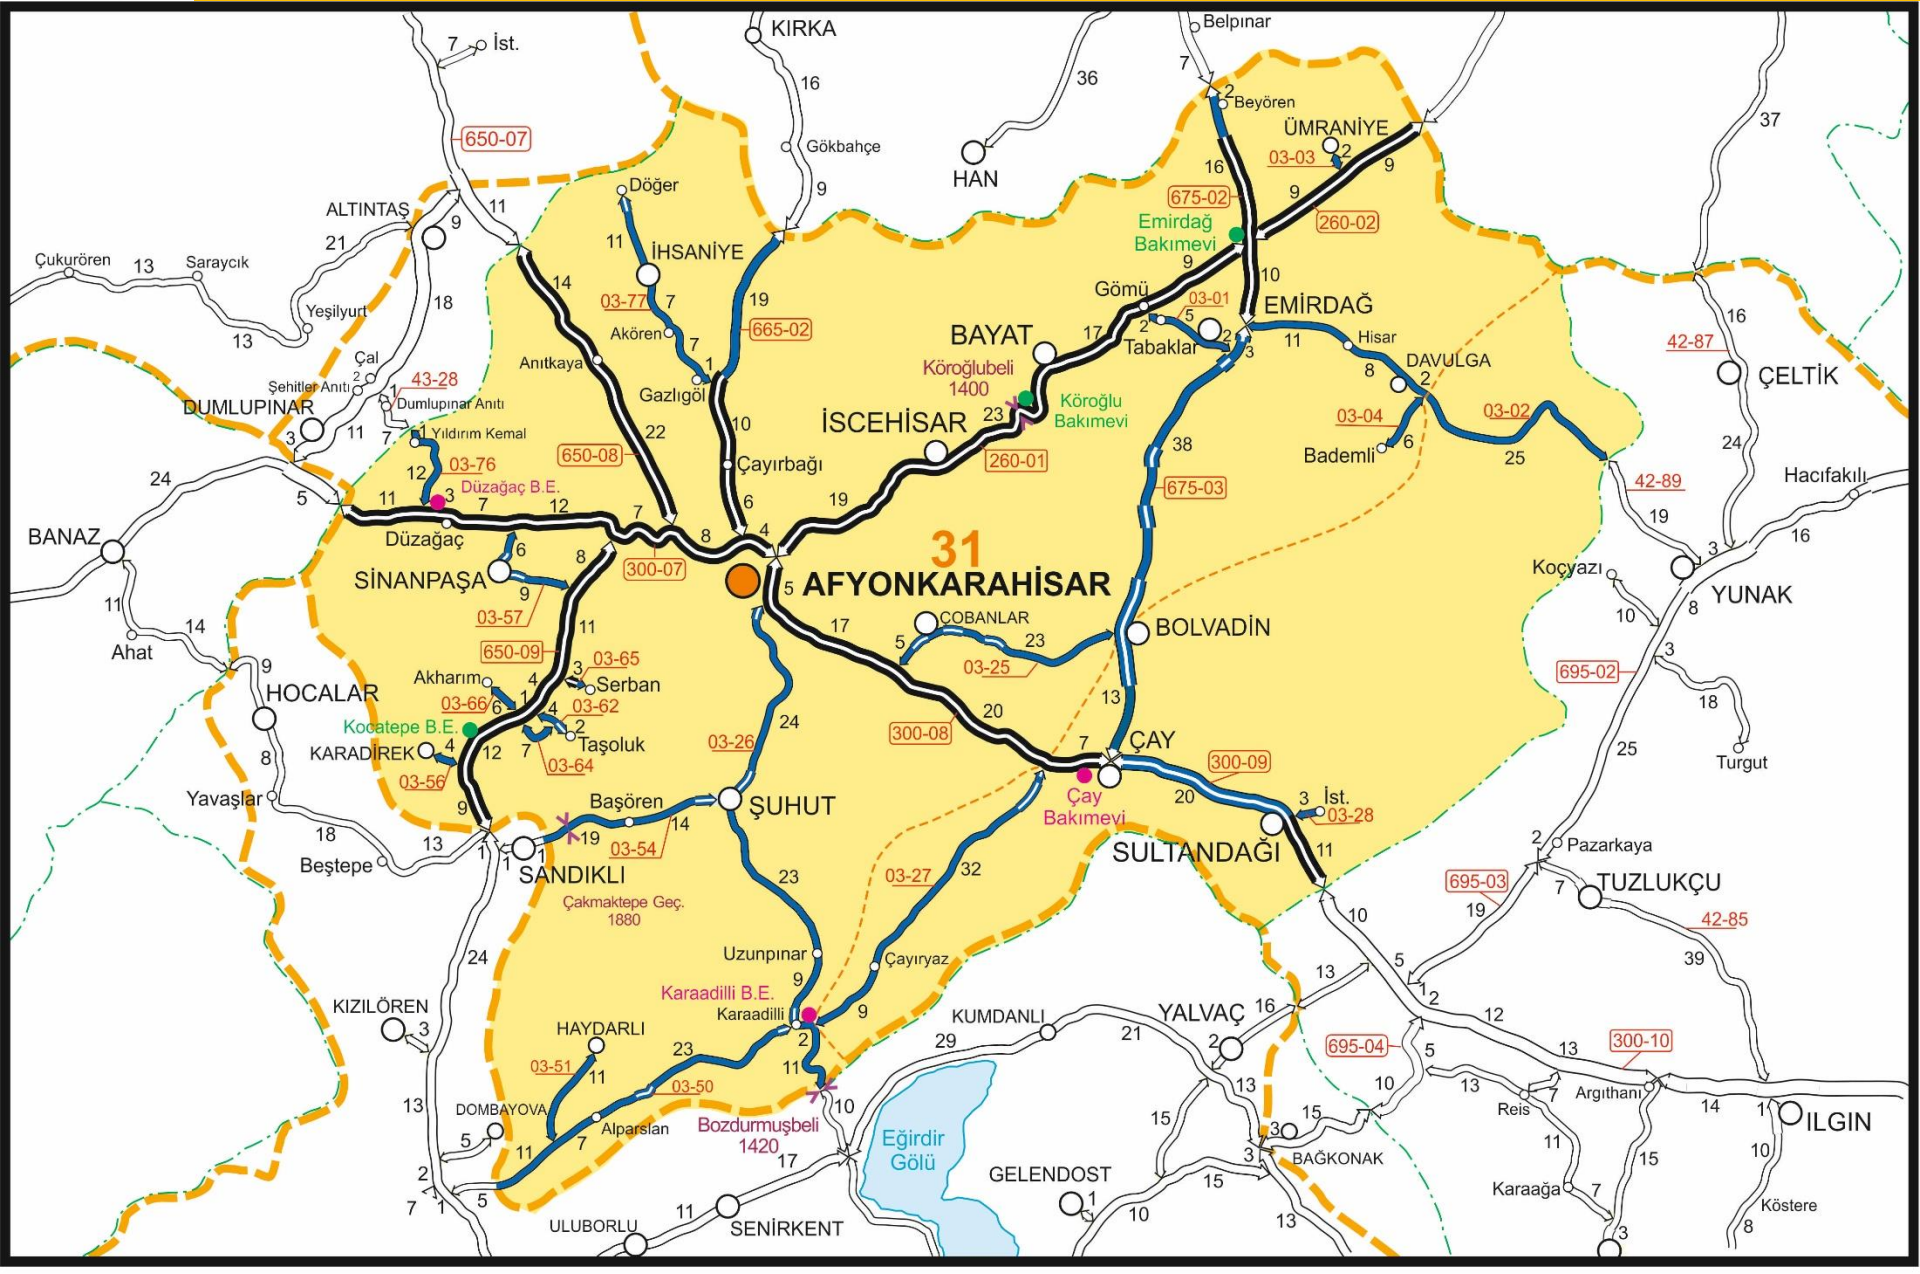

AFYON İLİ – YOL AĞI DURUMU

SATIH CİNSLERİNE GÖRE YOL AĞI (KM)				
YOLUN CİNSİ	ASFALT YOLLAR		ŞEBEKE UZUNLUĞU	BÖLÜNMÜŞ YOL
	ASFALT BETONU	SATHİ KAPLAMA		
Devlet Yolu	397	19	**416**	407
İl Yolu	26	343	**369**	25
Toplam	**423**	**362**	**785**	**432**

TOPLAM YOL AĞININ

423 Km ` si BSK **% 54**
362 Km ` si Sathi Kaplama **% 46**

% 100 Asfalt

Afyon İli sınırlarında 461 km Bölünmüş Yol yapımı öngörülmüş olup bugüne kadar 432 km bölünmüş yol (% 94) tamamlanmıştır.

2017 yılında;
Bölge Genelinde:813.668.000 TL
Afyon ilinde :127.418.000 TL
harcama yapılmıştır.

2017 YILINDA ÇALIŞILAN ÖNEMLİ PROJELER

- ✓ Afyon-Uşak yolu Tünelli Geçiş
- ✓ Emirdağ Ayr.-Afyon Yolu İscehisar ve Dörtyol Köprülü Kavşakları
- ✓ (Afyon-Eskişehir)Ayr-Mahmudiye-Çifteler Yolu
- ✓ Afyon-Gazlıgöl-Kırka Yolu Yapımı
- ✓ Çay-Bolvadin-Emirdağ Yolu Yapımı
- ✓ Afyon-Şuhut Yolu yapımı
- ✓ Afyonkarahisar-Akşehir Yolu
- ✓ Emirdağ-Davulga-Yunak

Afyon-Uşak yolu Karahisar Tüneli, Karahisar ve Erkmen Köprülü Kavşakları

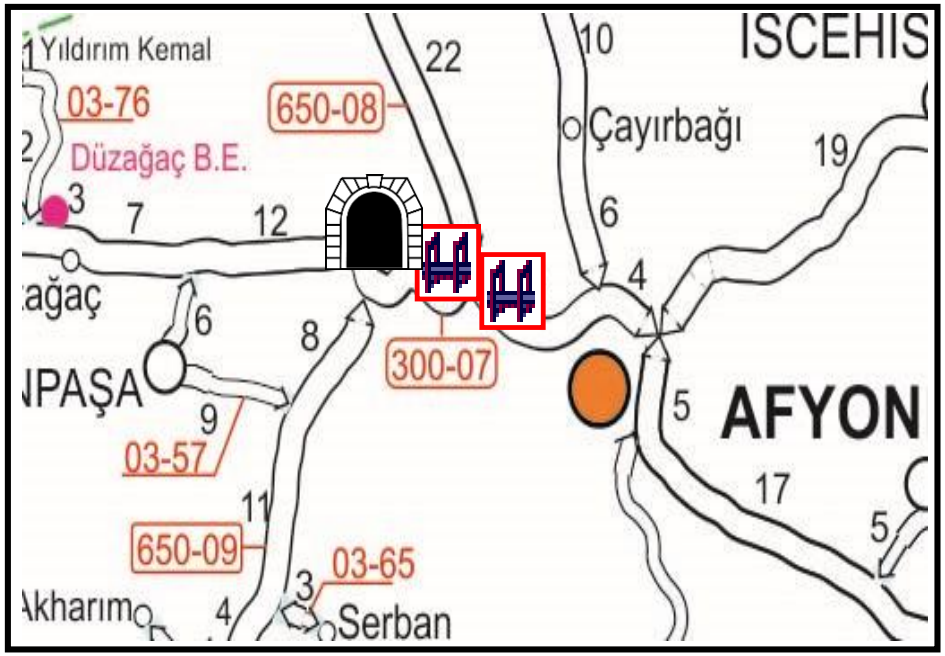

Bu iş kapsamında Karahisar Köprülü kavşağı çalışmaları tamamlanarak 17 Ocak 2017 tarihinde trafiğe açılmıştır.

Karahisar Tüneli çalışmalarına 2016 yılında başlanmış olup Ağustos 2017 itibari ile tamamlanarak trafiğe açılmıştır. Tünel çalışmaları kapsamında 2 km BSK kaplamalı Bölünmüş yolda tamamlanarak trafiğe açılmıştır.

Erkmen Köprülü Kavşağında çalışmalara başlanmış olup fiziki olarak yaklaşık %70 seviyelerinde gerçekleşme sağlanmıştır. Çalışmalara devam edilmektedir.

Emirdağ Ayr.-Afyon Yolu İscehisar ve Dörtyol Köprülü Kavşakları

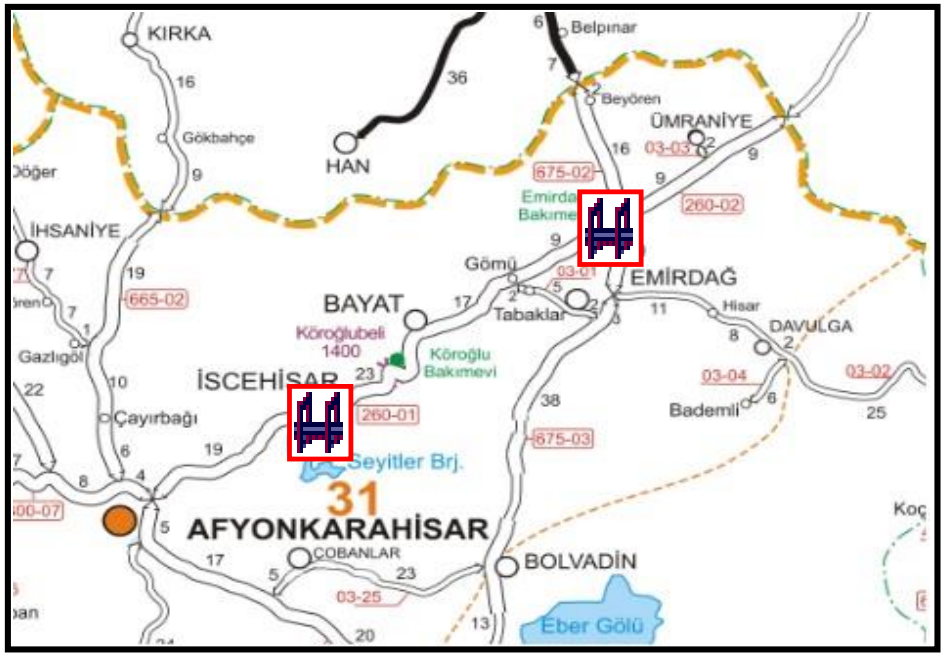

Dörtyol Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları 2016 yılında tamamlanarak trafiğe açılmıştır.

İscehisar Köprülü Kavşağında çalışmaları da 2017 yılında tamamlanarak trafiğe açılmıştır.

(Afyon-Eskişehir)Ayr-Mahmudiye-Çifteler Yolu

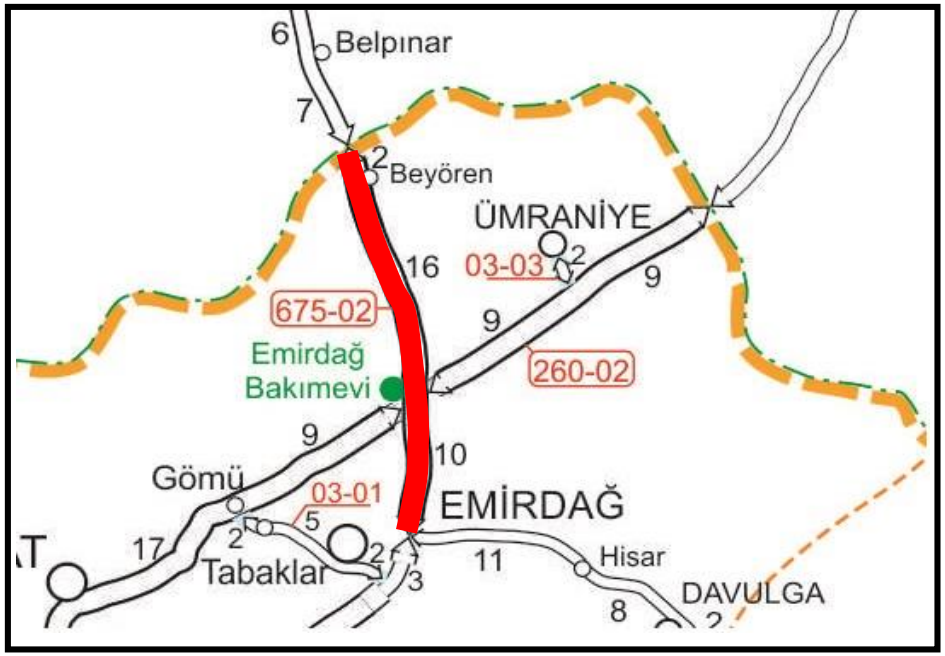

56 km uzunluğundaki yolun 27,5 km'si Afyon ili sınırlarında bulunmaktadır. 2016 yılı sonuna kadar Afyon ilinde 27,5 km'si BSK kaplamalı bölünmüş yol olarak tamamlanarak trafiğe açılmıştır.

Emirdağ-Çifteler yolunun 26 km'si BSK kaplamalı bölünmüş yol olarak tamamlanarak trafiğe açılmıştır.

Afyon-Gazlıgöl-Kırka Yolu Yapımı

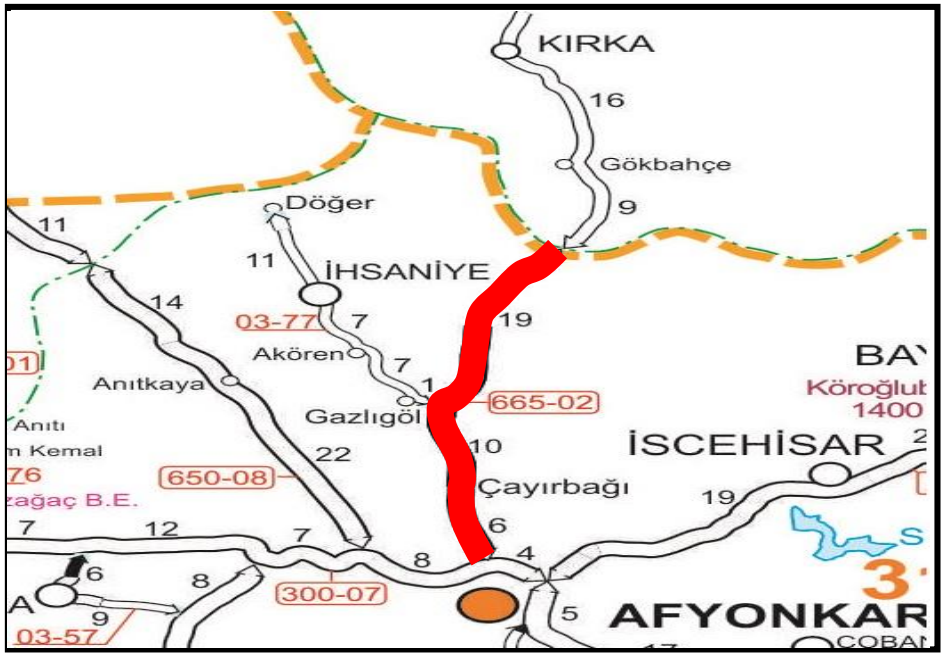

36 km uzunluğundaki yolun 2016 yılı sonuna kadar 29 km'si BSK kaplamalı bölünmüş yol olarak tamamlanarak trafiğe açılmıştır.

2017 yılında 5,3 km BSK kaplamalı bölünmüş yol yapımı tamamlanmıştır. Projenin 2018 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.

Çay-Bolvadin-Emirdağ Yolu Yapımı

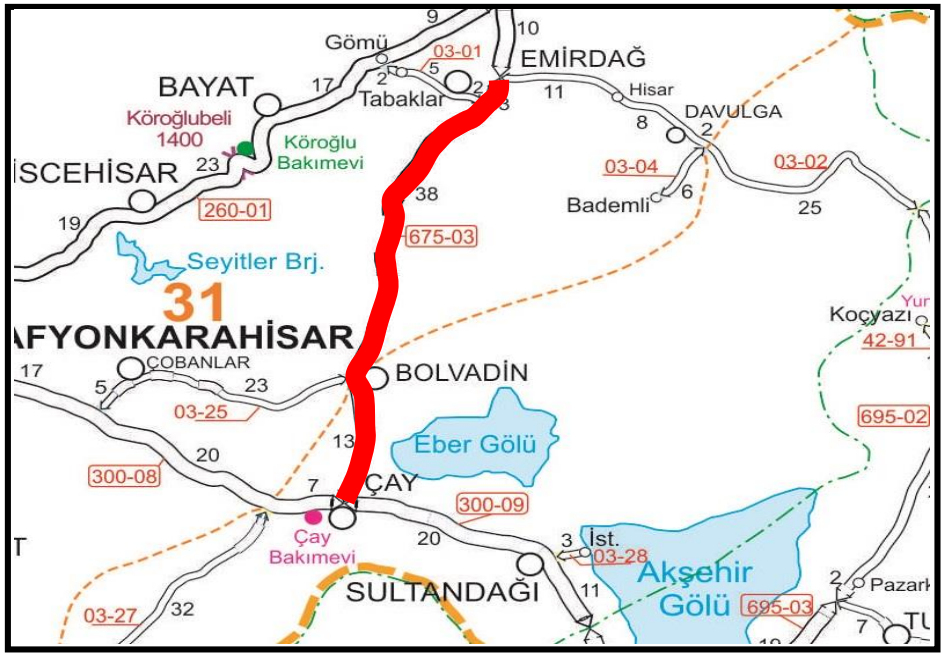

53 km uzunluğundaki yolun 34,5 km bölünmüş yol (21 km BSK-13,5 km SK) olarak tamamlanmıştır.

2017 yılında 10,8 km BSK kaplamalı bölünmüş yol, 3,9 km SK üzeri BSK kaplamalı yol tamamlanmıştır.

Projenin 2018 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir.

Emirdağ Çevre Yolu ve bağlantı yolları yapım işinde çalışmalara devam edilmektedir.

Afyon-Şuhut Yolu Yapımı

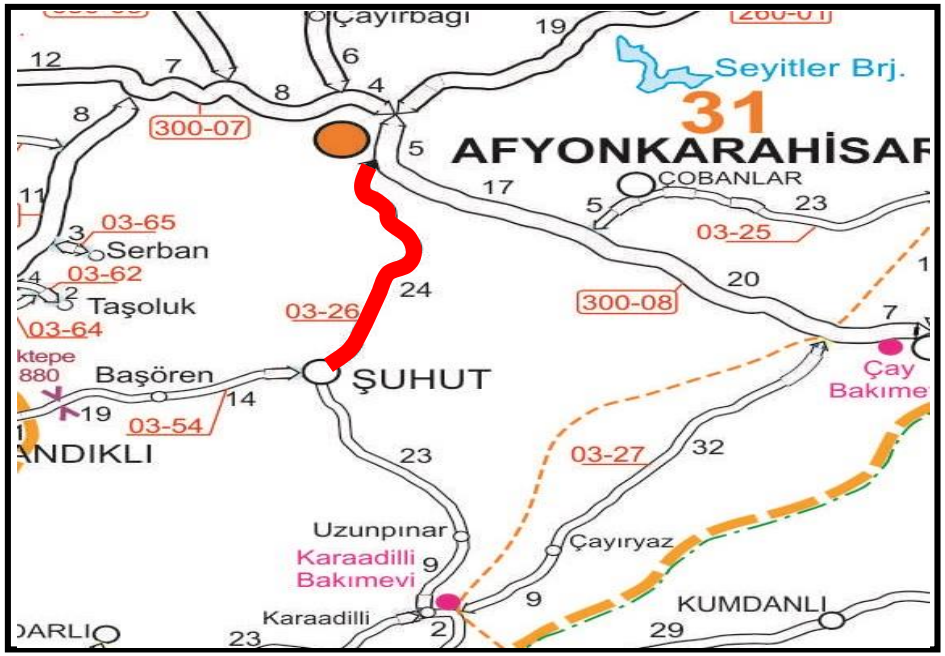

24 Km uzunluğundaki yolun 2016 yılı sonuna kadar 2 km'si BSK kaplamalı bölünmüş yol olarak tamamlanarak trafiğe açılmıştır.

2017 yılında 4,6 km BSK kaplamalı bölünmüş yol çalışması tamamlanmıştır.

Afyonkarahisar-Akşehir Yolu

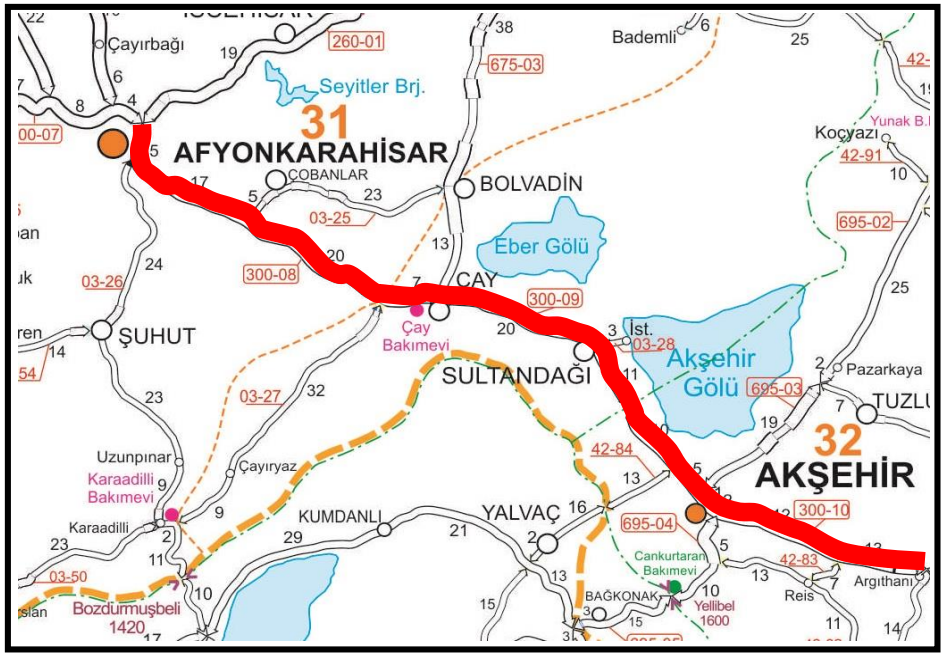

90 km uzunluğundaki yolun (75 km'si Afyon ili, 15 km'si Konya ilinde) 2016 yılı sonuna kadar 81,8 km'si (66,8 km'si Afyon ilinde) BSK kaplamalı tamamlanarak trafiğe açılmıştır.

2017 yılında 8,2 km bölünmüş yolda SK üzeri BSK kaplamalı bölünmüş yol çalışması tamamlanmış olup Afyon-Akşehir yolunun tamamı BSK kaplamalı bölünmüş yol olarak trafiğe açılmıştır.

Emirdağ-Davulga-Yunak

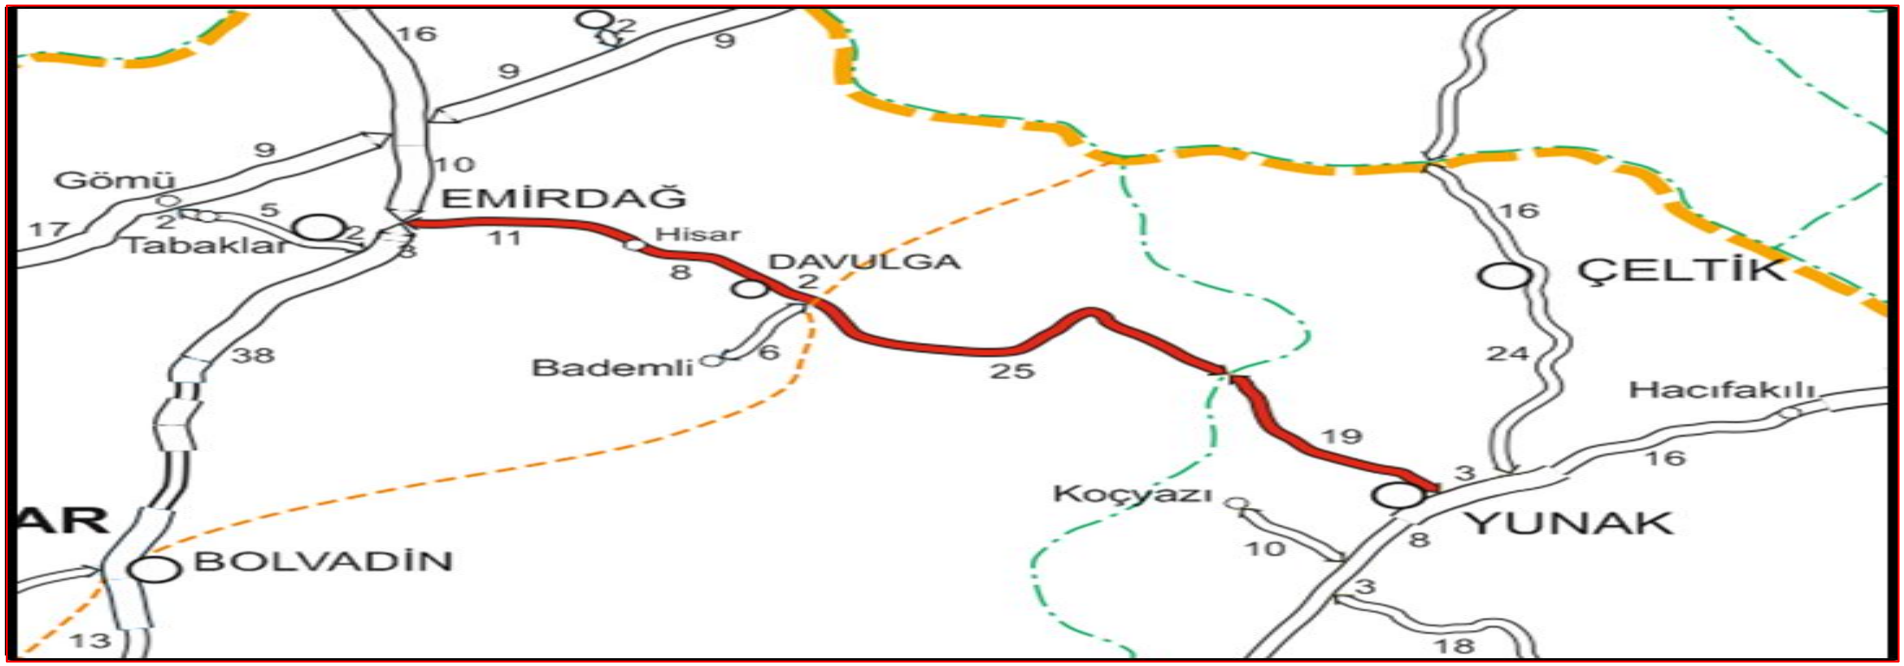

Emirdağ-Davulga-Yunak yolu (03-02 ve 42-89 K.K.No.lu) toplam 64 km uzunluğunda olup 2017 yılında Yatırım Programına alınmıştır.

Yolun proje çalışmaları tamamlanmış olup tamamı BSK kaplamalı olarak yapılmak üzere 29.01.2018 tarihinde ihale edilecektir.

SATHİ KAPLAMA, SANAT YAPILARI VE TRAFİK GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI

- 2017 Yılında 111 km sathi kaplama çalışması yapılmıştır.
- DDY Üst Geçit köprüsünde çalışmalara devam edilmektedir.
- Taşoluk Köprüsünde çalışmalar tamamlanmıştır
- 2017 yılında Afyon ilinde 81 km otokorkuluk, 4.108 adet levha, 771 km yatay işaretleme, 5 adet sinyalizasyon (Özdilek Kavşağı, Erenler Kavşağı, Gömü Kavşağı, Bayat Kavşağı, İscehisar), 2 adet üstgeçit (Atatürk Kültür Merkezi Önü, Gömü) yapılmıştır.

KARAYOLLARI 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Resim : Afyonkarahisar-Akşehir Yolu
